

BALANÇO DO ACORDO DE RESULTADOS 2019



**Secretaria das Cidades -
Scidades**



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Planejamento e Gestão



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Secretaria do Planejamento e Gestão

SECRETÁRIO

Ronaldo Lima Moreira Borges (respondendo)

SECRETÁRIO EXECUTIVO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Everton Cabral Maciel (respondendo)
Luciana Capistrano da Fonsêca Moura
Régis Meireles Benevides

COORDENAÇÃO TÉCNICA

Everton Cabral Maciel

ELABORAÇÃO

EQUIPE SEPLAG **Célula de Gestão para** **Resultados - Ceger**

Anna Carolline Botelho de Araújo
Everton Cabral Maciel
Max Sarney Almeida Silva
Rafael Paraíso Souto Maior Malta
Renata Cristina Duarte dos Santos
Samara da Silva Trajano

EQUIPE SCIDADES **E VINCULADAS**

Adriana Silva Gonçalves
Adriana Xavier de Santiago
Camila Elisa e Souza Ribeiro
Cleidiane Barros Cândido
Filipe Braid Carannante
Karla Dayane Rocha do Nascimento

Dezembro, 2020

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	4
2. ESTRUTURA DA SECRETARIA	5
3. DESEMPENHO GERAL	6
4. DESEMPENHO POR DESAFIO	8
4.1 Fortalecer a política de regularização fundiária urbana e contribuir para minimizar o déficit habitacional	8
4.2 Melhorar a qualidade das rodovias estaduais do Ceará com ênfase na manutenção preventiva e no desenvolvimento socioeconômico	16
4.3 Reduzir o número de áreas de risco em áreas de preservação ambiental em Fortaleza	25
4.4 Ampliar a cobertura da população do interior com destinação final adequada dos resíduos sólidos	29
4.5 Ampliar cobertura e atendimento de abastecimento de água em áreas rurais do Estado	35
4.6 Ampliar cobertura e atendimento de esgotamento sanitário em áreas urbanas do Estado	42
5. VISITA TÉCNICA	45
6. GLOSSÁRIO	46

APRESENTAÇÃO


Nesse Balanço, você encontrará os principais resultados e realizações da **Secretaria das Cidades (Scidades)** e seus **órgãos vinculados** no Acordo de Resultados assinado no ano de 2019.

O acesso a estas informações tem a finalidade de incentivar uma melhoria contínua da gestão e promover a transparência sobre os resultados das políticas públicas. Além disso, reconhece o trabalho desenvolvido pelos órgãos estaduais ao longo do ano, buscando apontar, por meio do resultado das análises, oportunidades de melhorias para o ano seguinte.

O **Acordo de Resultados** é um dos instrumentos que compõem o modelo de **Gestão para Resultados (GpR)**, instituído no Estado do Ceará pelo **Decreto Nº 32.216, de 08 de maio de 2017**. Neste Acordo são estabelecidas os resultados prioritários a serem alcançados pelos órgãos estaduais ao longo do ano, em alinhamento com o **Plano Plurianual (PPA)**, a **Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)** e a **Lei Orçamentária Anual (LOA)**.

Para ter acesso ao Acordo de Resultados da Secretaria das Cidades (Scidades) no ano de 2019, **clique aqui**. Para mais informações sobre os Acordos de Resultados e o modelo de Gestão para Resultados, consulte o **glossário** presente neste Balanço ou acesse nossa **página oficial**.

ESTRUTURA DA SECRETARIA



DESEMPENHO GERAL



Avaliação Geral do Acordo de Resultados

7,64

Nota da
Secretaria

12º

Posição no
Ranking * ?

7,65

Nota média das
Secretarias

Principais Destaques



Entrega de 1.760 **unidades habitacionais** no Residencial Luiz Gonzaga e 1.984 unidades no bairro Cidade Jardim, em Fortaleza;



Implantação do **sistema de abastecimento de água** na localidade de Balança, no município de Jati;



Implantação do **sistema de esgotamento sanitário** em Lagoa Seca, no município de Juazeiro do Norte;



Restauração de um trecho de 5,58 quilômetros da **rodovia CE-178**, entre Morrinhos e Santana do Acaraú

* Para visualização do *ranking* completo, [clique aqui](#).

DESEMPENHO GERAL

15

Indicadores Pactuados ?

6

Indicadores com metas alcançadas

38

Entregas Pactuadas ?

15


Entregas com metas alcançadas

Desempenho dos Indicadores




● Até 25,00% ● Entre 25,01% e 50,00%
● Entre 50,01% e 74,00% ● Acima de 75,00%

Desempenho das Entregas

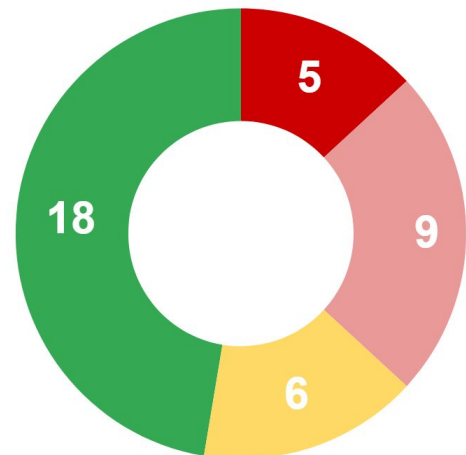

● Até 25,00% ● Entre 25,01% e 50,00%
● Entre 50,01% e 74,00% ● Acima de 75,00%

Análise Financeira (em R\$)

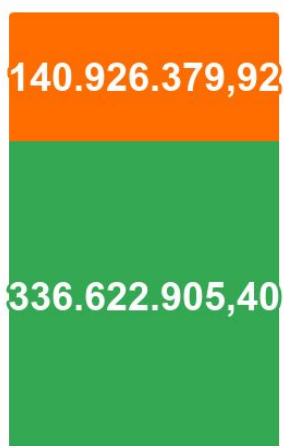

Programado

49.110.565,85

Limite

42.966.045,64
80.837.873,65

Empenhado


■ Recursos provenientes do Governo do Estado
■ Outras fontes de recursos ?

***Programado:** Recurso financeiro **previsto**
***Limite:** Recurso **liberado** pelo Governo do Estado
***Empenhado:** Recurso utilizado pela Secretaria


DESEMPENHO POR DESAFIO

DESAFIO PRIORITÁRIO ?

Fortalecer a política de regularização fundiária urbana e contribuir para minimizar o déficit habitacional com foco nas famílias em situação de vulnerabilidade social.



Desempenho dos Indicadores do Desafio

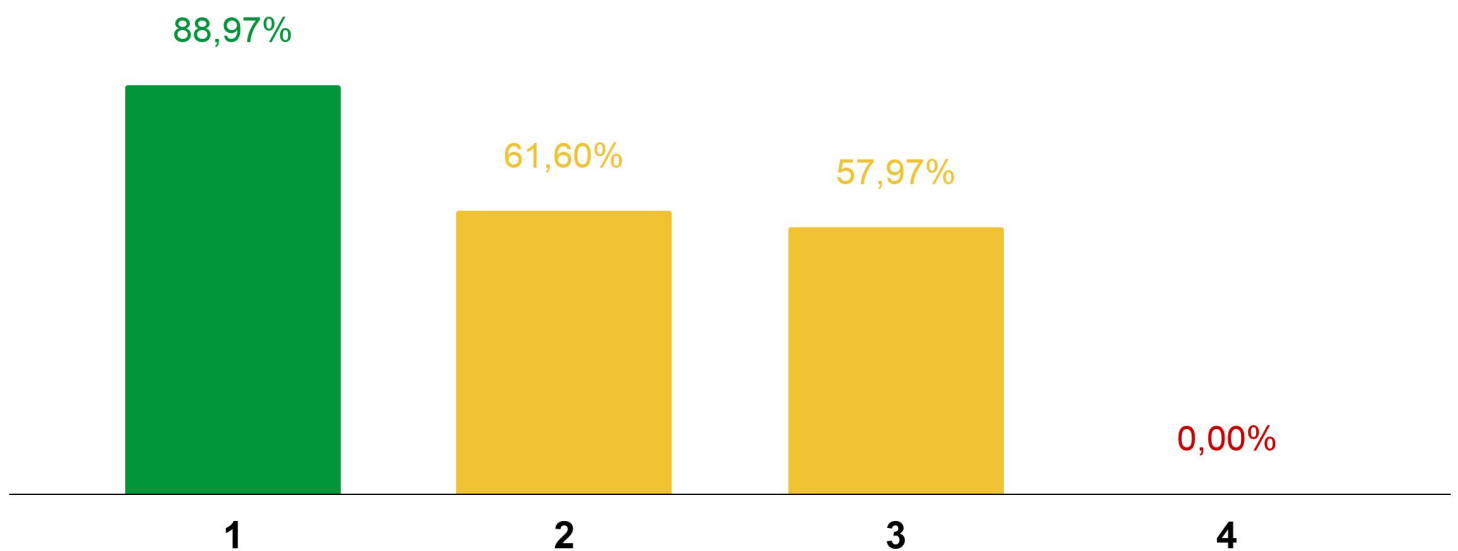

DESEMPENHO POR DESAFIO

INDICADOR 1 ?

Famílias beneficiadas com habitação de interesse social



O indicador representa o número de famílias em vulnerabilidade social que foram beneficiadas pelo Estado com unidades habitacionais por meio do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e das iniciativas dos programas de requalificação urbana.



A meta não foi alcançada por contingências na liberação de recursos por parte do Governo Federal nos empreendimentos Dendê e Alto da Paz II. As 210 unidades restantes do Residencial Dendê foram entregues em janeiro de 2020. O Residencial Alto da Paz está previsto para ser entregue em março de 2021.

Meta 2019 ?

4.541

famílias beneficiadas

Realizado 2019 ?

4.040

famílias beneficiadas

Percentual de
alcança da meta

88,97%



INDICADOR 2

Famílias beneficiadas com fogões sustentáveis



O indicador representa o número de famílias beneficiadas com **fogões sustentáveis**, na zona rural. Os fogões causam menos impacto ao meio ambiente e saúde, pois necessitam de menos lenha e produzem menos fumaça.



A meta não foi alcançada em 2019 por conta da demora nos processos de licitação, contratação da empresa e seleção das entidades a serem beneficiadas. Os fogões foram entregues em janeiro de 2020.

Meta 2019

3.000

famílias beneficiadas

Realizado 2019

1.848

famílias beneficiadas

Percentual de
alcança da meta

61,60%

DESEMPENHO POR DESAFIO

INDICADOR 3

Percentual de cobertura da política de fogões sustentáveis



O indicador informa o percentual de municípios beneficiados com fogões sustentáveis, na zona rural. Os fogões causam menos impacto ao meio ambiente e saúde, pois necessitam de menos lenha e produzem menos fumaça.



A meta era beneficiar 55 municípios, porém apenas 32 foram beneficiados. Isso ocorreu por conta da demora nos processos de licitação, contratação da empresa e seleção das entidades a serem beneficiadas. Os fogões foram entregues em janeiro de 2020.

Meta 2019

30,00%
dos municípios

Realizado 2019

17,39%
dos municípios

Percentual de
alcançe da meta

57,97%

INDICADOR 4

Famílias beneficiadas com título de propriedade



O indicador representa o número de famílias que receberam a posse do imóvel entregue pelo Estado por meio dos programas habitacionais ou construído por meio de mutirão (Papel da casa).



A meta não foi alcançada pois, apesar das etapas necessárias para fazer a entrega do título tivessem sido finalizadas, a emissão dos mesmos dependia da articulação entre a Prefeitura do Crato junto ao Cartório de Registro de Imóveis, o que não aconteceu a tempo.

Meta 2019

2.000
famílias beneficiadas

Realizado 2019


0
famílias beneficiadas

Percentual de
alcançe da meta

0,00%

DESEMPENHO POR DESAFIO

Desempenho das Entregas do Desafio

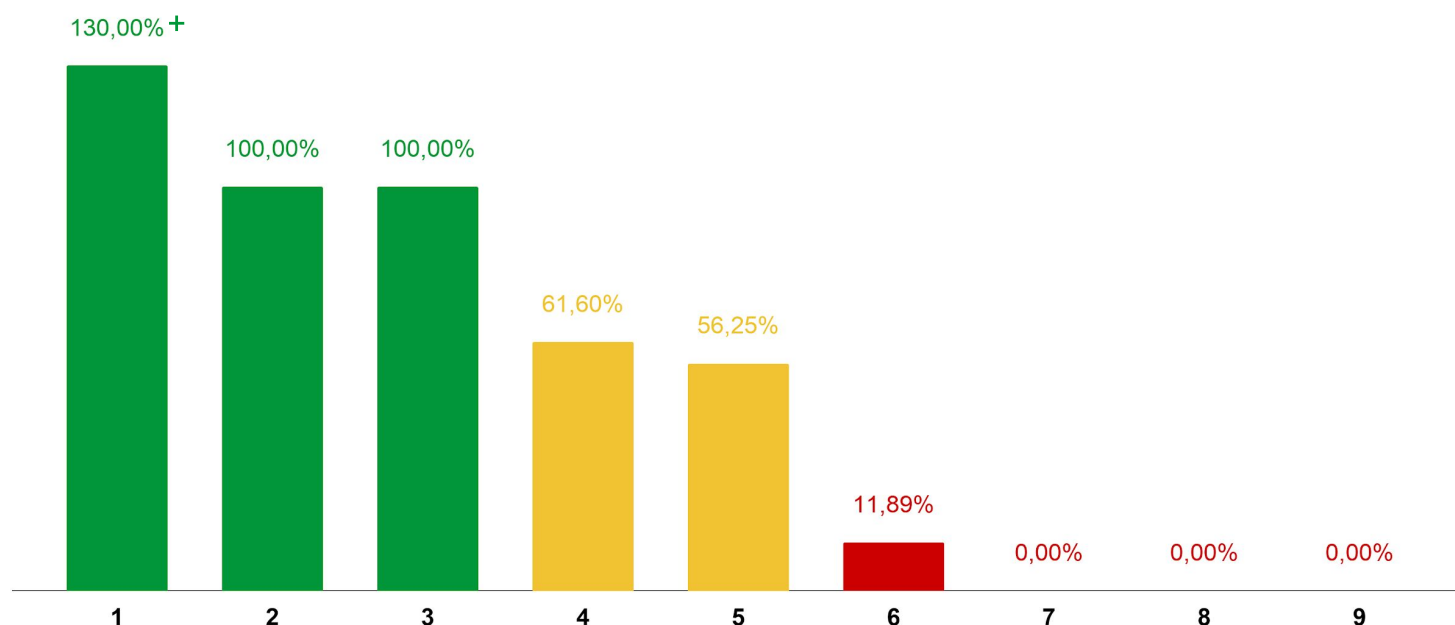

ENTREGA 1 ?

Unidade habitacional (Seminário/Crato) georreferenciada
Órgão responsável: Scidades



Georreferenciar consiste em determinar os limites da unidade habitacional por meio de coordenadas geográficas. Esta etapa é primordial para a emissão do título de propriedade do imóvel.



A meta foi superada devido a disponibilidade da equipe contratada para realizar o georreferenciamento do Cariri, pois havia uma demanda de, aproximadamente, 2.000 unidades.

Meta 2019

300
unidades
georreferenciadas

Realizado 2019

1.200
unidades
georreferenciadas

Percentual de
alcance da meta

400,00%

DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA 2

Unidade habitacional (Luiz Gonzaga) entregue
Órgão responsável: Scidades



Entrega de unidades habitacionais no **Residencial Luiz Gonzaga**, em Fortaleza.



A meta foi alcançada e as unidades habitacionais foram entregues em novembro de 2019.

Meta 2019

1.760
unidades entregues

Realizado 2019

1.760
unidades entregues

Percentual de
alcança da meta

100,00%



ENTREGA 3

Unidade habitacional (Cidade Jardim II) entregue
Órgão responsável: Scidades



Entrega de unidades habitacionais no Residencial Cidade Jardim II, em Fortaleza.



A meta foi alcançada e **1.248 unidades** foram entregues em março e, as últimas **736 unidades**, em setembro de 2019.

Meta 2019

1.984
unidades entregues

Realizado 2019

1.984
unidades entregues

Percentual de
alcança da meta

100,00%



DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA 4

Fogões sustentáveis instalados Órgão responsável: Scidades



A entrega se refere à instalação dos fogões sustentáveis para famílias na zona rural. Os fogões causam menos impacto ao meio ambiente e saúde, pois necessitam de menos lenha e produzem menos fumaça.



A meta não foi alcançada por conta da demora nos processos de licitação, contratação da empresa e seleção das entidades a serem beneficiadas. Os fogões foram entregues em janeiro de 2020.

Meta 2019

3.000
fogões instalados

Realizado 2019

1.848
fogões instalados

Percentual de
alcance da meta

61,60%

ENTREGA 5

Unidade habitacional (Dendê) entregue Órgão responsável: Scidades



Entrega de unidades habitacionais para as famílias remanejadas da área do **Projeto Dendê**, em Fortaleza.



A meta de 480 unidades habitacionais do Residencial Yolanda Queiroz não foi alcançada totalmente no ano de 2019, ficaram faltando 210 unidades que foram entregues em janeiro de 2020.

Meta 2019

480
unidades entregues

Realizado 2019

270
unidades entregues

Percentual de
alcance da meta

56,25%

DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA 6

Unidade habitacional (Maranguapinho) georreferenciada
Órgão responsável: Scidades



A entrega consiste em georreferenciar as unidades habitacionais do **Projeto Maranguapinho** para posterior emissão de título de propriedade.



A meta não foi alcançada. As principais dificuldades estão relacionadas a burocracia do próprio processo de regularização fundiária. Em dezembro de 2019, 400 unidades habitacionais foram georreferenciadas. Em setembro de 2020, foram entregues mais 200 unidades.

Meta 2019

3.365
unidades
georreferenciadas

Realizado 2019

400
unidades
georreferenciadas

Percentual de
alcançe da meta

11,89%

ENTREGA 7

Unidade habitacional (Alto da Paz) entregue
Órgão responsável: Scidades



Entrega de unidades habitacionais no Residencial Alto da Paz, em Fortaleza.



A meta não foi alcançada por contingência na liberação de recursos por parte do Governo Federal. Nova previsão para março de 2021.

Meta 2019

316
unidades entregues

Realizado 2019

0
unidades entregues

Percentual de
alcançe da meta

0,00%

DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA 8

Unidade habitacional (Pró Moradia) georreferenciada
Órgão responsável: Scidades



A entrega consiste em georreferenciar as unidades habitacionais do projeto Pró-Moradia para posterior emissão de título de propriedade.



A meta não foi alcançada. A Ordem de Serviço (documento que autoriza os responsáveis por obras/serviços públicos a iniciar os trabalhos) foi assinada em novembro. Porém o trabalho não foi iniciado pois o aditivo de prazo* não foi aprovado a tempo.

* aditivo de prazo: documento que aumenta o prazo de uma obra ou serviço a ser realizado.

Meta 2019

3.624
unidades
georreferenciadas

Realizado 2019

0
unidades
georreferenciadas

Percentual de
alcançe da meta

0,00%

ENTREGA 9

**Unidade habitacional (Pindorama / Gato Morto)
georreferenciada**
Órgão responsável: Scidades



A entrega consiste em georreferenciar as unidades habitacionais do conjunto habitacional Pindorama na Favela Gato Morto para posterior emissão de título de propriedade.



A meta não foi alcançada. A contratação da empresa aconteceu apenas em novembro de 2019. A conclusão do trabalho foi realizada em abril de 2020.

Meta 2019

500
unidades
georreferenciadas

Realizado 2019

0
unidades
georreferenciadas

Percentual de
alcançe da meta

0,00%


DESEMPENHO POR DESAFIO

DESAFIO PRIORITÁRIO ?

Melhorar a qualidade das rodovias estaduais do Ceará com ênfase na manutenção preventiva e no desenvolvimento socioeconômico.



Desempenho dos Indicadores do Desafio

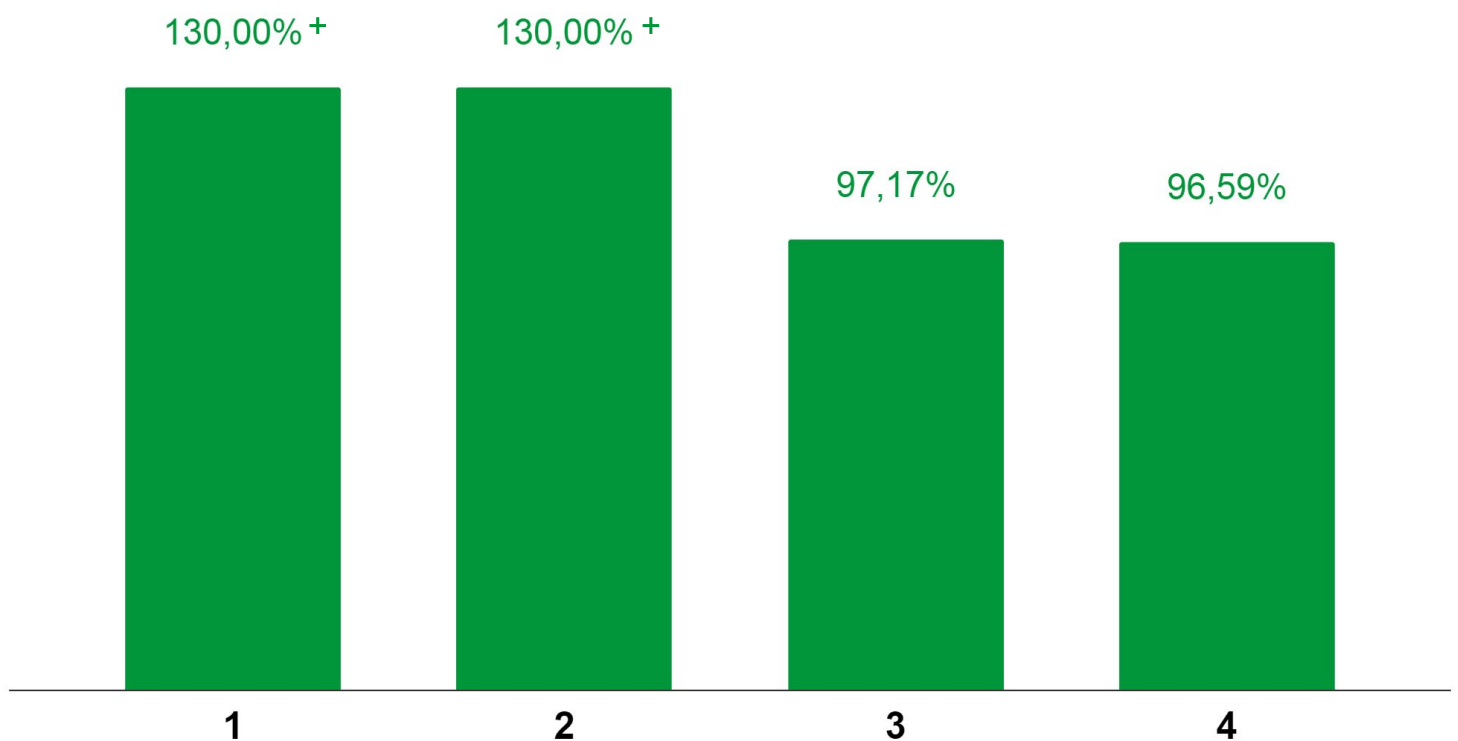

DESEMPENHO POR DESAFIO

INDICADOR 1

Índice de ações corretivas em obras públicas após a conclusão



O indicador informa o percentual de obras rodoviárias e edificações que precisaram passar por alguma ação corretiva após 6 meses de conclusão. Quanto menor o índice, melhor, pois representa que a execução dos serviços das obras das rodovias foram de qualidade.



A meta foi alcançada e nenhuma obra precisou passar por ação corretiva após 6 meses de conclusão. Ressalta-se que o indicador só passou a ser medido após a criação da SOP, que aconteceu em agosto de 2019. Dessa forma os registros só se iniciaram após esse mês.

Meta 2019 

10,00%

Realizado 2019 

0,00%

Percentual de
alcançe da meta

200,00%

INDICADOR 2

Índice de não conformidade da obra



O indicador representa o percentual de obras rodoviárias e de edificações que apresentaram não conformidades graves durante sua execução. Quanto menor o índice, melhor, pois representa que a execução dos serviços das obras estão sendo de qualidade



A meta foi alcançada e apenas 1,60% das obras apresentaram não conformidades graves.

Meta 2019

10,00%

Realizado 2019

1,60%

Percentual de
alcançe da meta

184,00%

*Não conformidades graves são falhas técnicas detectadas durante a execução da obra que prejudicam a qualidade e diminuem a vida útil da rodovia construída/restaurada.

DESEMPENHO POR DESAFIO

INDICADOR 3

Índice de Qualidade da Malha Rodoviária



O indicador informa o percentual de **rodovias cearenses** que possui boa qualidade. Isto é calculado com base em cinco parâmetros: qualidade do pavimento, conforto do usuário, segurança viária, geometria da via e número de acidentes fatais.



A meta não foi totalmente alcançada, porém registra-se que a SOP realiza continuamente investimento na malha rodoviária com o intuito de proporcionar ao usuário rodovias mais seguras e em boas condições de trafegabilidade.

Meta 2019

52,00%

Realizado 2019

50,53%

Percentual de
alcançe da meta

97,17%



INDICADOR 4

Percentual de rodovias estaduais com estado ótimo/bom na avaliação CNT



O indicador informa o percentual de rodovias estaduais com estado ótimo/bom. Esta avaliação é feita pela **Confederação Nacional de Transporte (CNT)** e leva em consideração três parâmetros: pavimento, sinalização e geometria da via.



Em relação à Pesquisa de 2019, o quadro geral das rodovias se manteve estável, com um aumento de 0,7% no percentual de rodovias com status “ótimo” ou “bom”. Destaca-se a avaliação da CE-040 que recebeu em toda sua extensão (126 km, fonte: CNT) avaliação “ótima” nos critérios de pavimento e geometria da via.

Meta 2019

29,30%

Realizado 2019

28,30%


Percentual de
alcançe da meta

96,59%



DESEMPENHO POR DESAFIO

Desempenho das Entregas do Desafio

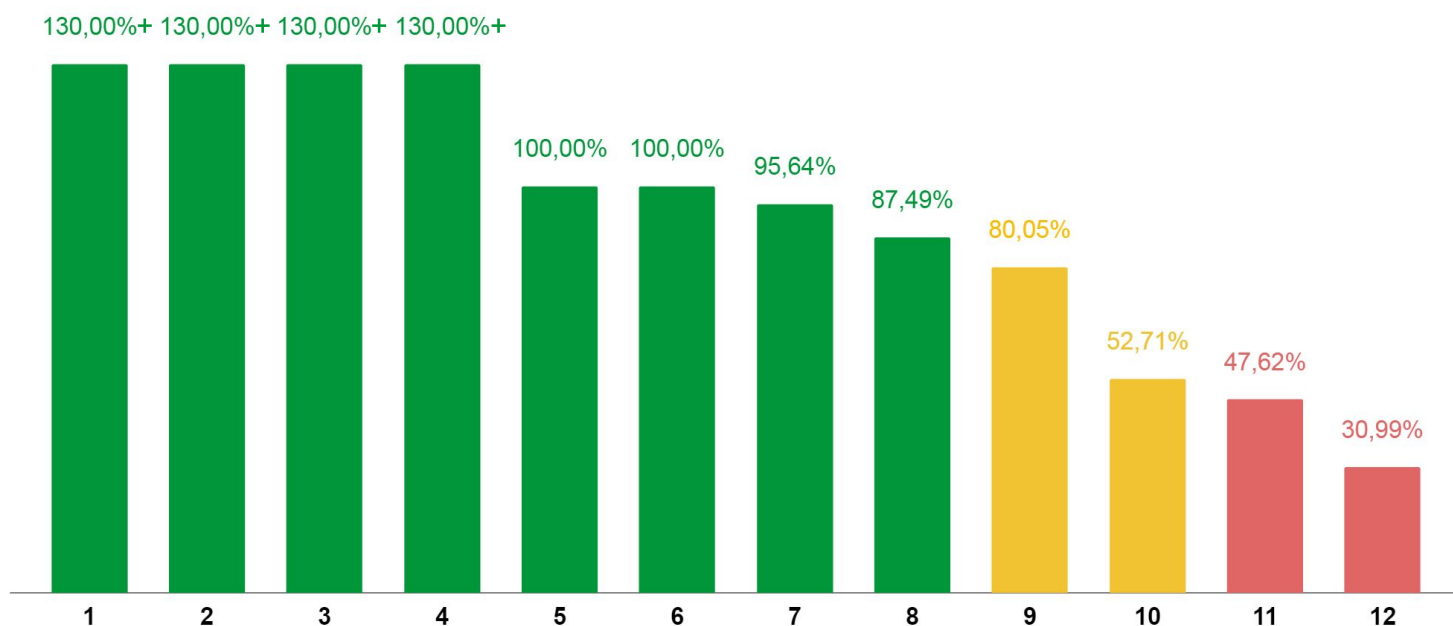

ENTREGA 1 ?

Contorno de Itapipoca implantado (extensão 9,05km)

Órgão responsável: SOP



A entrega consiste na **implantação do contorno de Itapipoca**. A extensão do contorno é de 9,05 km, sendo que a meta para o ano de 2019 era a implantação de 1,23 Km.



A previsão era concluir 1,23 km da rodovia, sendo executado 2,90 km. Por não ter encontrado nenhuma interferência grave na execução da obra, a empresa contratada obteve um andamento satisfatório, superando assim, a meta planejada.

Meta 2019

1,23
quilômetros

Realizado 2019

2,90
quilômetros

Percentual de
alcançe da meta

235,77%

DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA 4

CE-025 - Trecho: Rótula Cofeco - Entr. Av. Oceano Atlântico - duplicada (extensão 5,50km)
Órgão responsável: SOP



A entrega consiste na duplicação de um trecho da **rodovia CE-025** entre a rótula da Cofeco e Av. Oceano Atlântico.



A previsão era duplicar 1,97 km. Por não ter encontrado nenhuma interferência grave na execução da obra, a empresa contratada obteve um andamento satisfatório, superando assim, a meta planejada.

Meta 2019

1,97
quilômetros

Realizado 2019

2,53
quilômetros

Percentual de
alcançe da meta

148,22%

ENTREGA 5

CE-138 - Trecho: Entr. BR-226 (Pereiro) - Divisa CE/RN restaurada (extensão 19km)
Órgão responsável: SOP



A entrega consiste na restauração de um trecho da **rodovia CE-138**, entre a BR-226 no município de Pereiro e a Divisa do Ceará e Rio Grande do Norte.



A meta foi alcançada e a restauração de 12,02 km da rodovia foi concluída em novembro de 2019.

Meta 2019

12,02
quilômetros

Realizado 2019

12,02
quilômetros

Percentual de
alcançe da meta

100,00%



DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA 6

CE-178 - Trecho: Morrinhos - Santana do Acaraú restaurada (extensão 29,10km)

Órgão responsável: SOP



A entrega consiste na restauração de um trecho da **rodovia CE-178** entre Morrinhos e Santana do Acaraú. A extensão total do trecho é de 29,10 km, sendo programado para 2019 a execução de 5,58 km.



A meta foi alcançada e a restauração de 5,58km da rodovia foi concluída em junho de 2019.

Meta 2019

5,58
quilômetros

Realizado 2019

5,58
quilômetros

Percentual de
alcança da meta

100,00%



ENTREGA 7

CE-060 - Trecho: Pacatuba - Redenção - duplicada (extensão 37,44km)

Órgão responsável: SOP



A entrega consiste na duplicação de um trecho da **rodovia CE-060** que liga Pacatuba a Redenção. A extensão total do trecho é de 37,44 km, sendo programado para 2019 a execução de 25,84 km.



A meta era duplicar 25,84 km, mas foram concluídos 24,71km. Houve uma pequena queda na execução em dezembro devido aos feriados e férias coletivas e, por isso, a meta não foi alcançada.

Meta 2019

25,84
quilômetros

Realizado 2019

24,71
quilômetros

Percentual de
alcança da meta

95,64%



DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA 8

Conservação rotineira de rodovias estaduais realizada
Órgão responsável: SOP



A entrega representa a realização de restauração da pavimentação com adição de brita e recapeamento asfáltico nas **rodovias estaduais**.



A meta não foi totalmente alcançada devido à rescisão contratual da empresa que prestava serviço nos municípios de Itapipoca e Santa Quitéria.

Meta 2019

11.757,91
quilômetros

Realizado 2019

10.287,58
quilômetros

Percentual de
alcançe da meta

87,49%



ENTREGA 9

**CE-293 - Trecho: ENTR.CE-060 (Barbalha) - Missão Velha –
duplicada (extensão 21,44km)**
Órgão responsável: SOP



A entrega consiste na duplicação de um trecho da **rodovia CE-293**, entre Missão Velha e a CE-060 em Barbalha. A extensão total do trecho é de 21,44 km, mas para 2019, a meta programada era de 8,57km.



A meta era duplicar 8,57 km em 2019, mas foram concluídos 6,86 km. A meta não foi alcançada devido queda na execução em dezembro por conta dos feriados e férias coletivas.

Meta 2019

8,57
quilômetros

Realizado 2019

6,86
quilômetros

Percentual de
alcançe da meta

80,05%

DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA 10

CE-085 - Trecho: Itarema - Acaraú - duplicada (extensão 26,54 km)

Órgão responsável: SOP



A entrega consiste na duplicação de um trecho da **rodovia CE-085** entre Itarema e Acaraú. A extensão total do trecho é de 26,54 km, sendo que para 2019 a meta era 2,77 km.



A previsão para o ano era duplicar 2,77 km, mas foram concluídos 1,46km do trecho. A meta não foi alcançada devido ao atraso na emissão da licença ambiental. Apenas no último trimestre do ano, a obra retomou seu ritmo normal.

Meta 2019

2,77
quilômetros

Realizado 2019

1,46
quilômetros

Percentual de
alcançe da meta

52,71%

ENTREGA 11

CE-155 - Trecho: Porto do Pecém - Entr. BR-222 (Arco Metropolitano) - duplicada (extensão 20,10km)

Órgão responsável: SOP



A entrega consiste na duplicação de um trecho da **rodovia CE-155**, entre o Porto do Pecém e a BR-222 (Arco Metropolitano). A extensão total do trecho é de 20,10 km, sendo que para 2019 a meta era 2,10 km.



A meta do ano era duplicar 2,10 km. No entanto, só foi realizado 47,62% do trecho. A meta não foi alcançada devido o contrato com a empresa ter sido rescindido.

Meta 2019

2,10
quilômetros

Realizado 2019

1,00
quilômetro

Percentual de
alcançe da meta

47,62%

DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA 12

CE-263 - Jaguaruana - Entr. BR-304 implantada (extensão 35,14km)

Órgão responsável: SOP



A entrega consiste na implantação de um trecho da **rodovia CE-263** entre o município de Jaguaruana e a BR-304. A extensão total do trecho é de 35,14 km, sendo programado para 2019 a execução de 4,55 km.



A previsão para o ano era implantar 4,55 km de rodovia, mas foram concluídos 1,41 km. A meta não foi alcançada devido atraso na licença ambiental, que só foi emitida em dezembro.

Meta 2019

4,55
quilômetros

Realizado 2019

1,41
quilômetros

Percentual de
alcance da meta

30,99%

DESEMPENHO POR DESAFIO

DESAFIO PRIORITÁRIO ?

Reduzir o número de áreas de risco em áreas de preservação ambiental em Fortaleza



INDICADOR ?

Percentual das áreas de risco eliminadas (Rio Cocó, Maranguapinho e Dendê)



O indicador se refere a eliminação de 32 áreas de risco situadas na abrangência do **Projeto Rio Maranguapinho**, **Projeto Rio Cocó** e **Projeto Dendê**.



Até 2018, 84,37% das áreas de riscos mapeadas foram eliminadas. Das duas áreas previstas para 2019, Belém e Conjunto Ceará, do Projeto Rio Maranguapinho, nenhuma foi eliminada, pois as desapropriações não foram realizadas na sua totalidade.

Meta 2019 ?

90,37%
de áreas de risco
eliminadas

Realizado 2019 ?


0,00%
de áreas de risco
eliminadas

Percentual de
alcance da meta

0,00%

DESEMPENHO POR DESAFIO

Desempenho das Entregas do Desafio

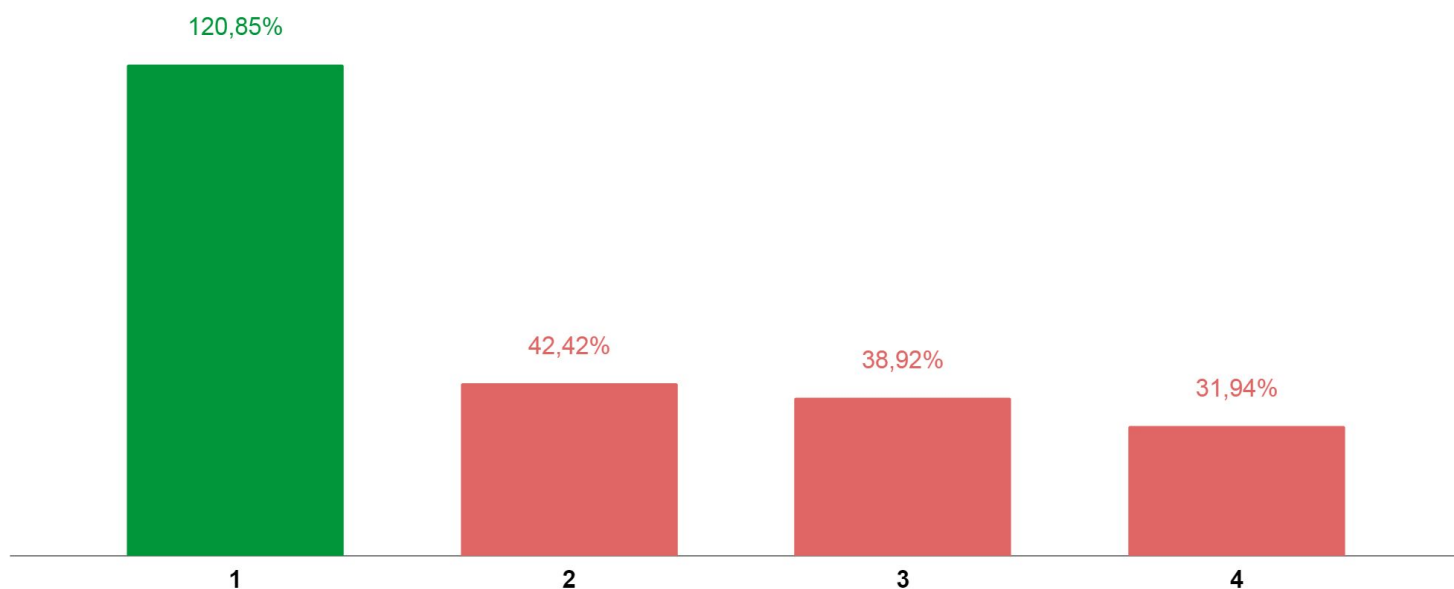

ENTREGA 1 ?

Dragagem do Rio Maranguapinho executada
Órgão responsável: Scidades



A entrega se refere à remoção de material do leito do rio Maranguapinho, a fim de mantê-lo limpo, evitando o transbordamento e o consequente alagamento das suas margens.



Até 2018, foi executada 31,35% da **dragagem do Rio Maranguapinho**. A meta era chegar em 64,30% em 2019. A meta foi alcançada e a empresa continuou trabalhando em ritmo acelerado.

Meta 2019

64,30%
de dragagem executada

Realizado 2019

71,17%
de dragagem executada

Percentual de alcance da meta

120,85%



DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA 2

Margens do Rio Cocó urbanizadas

Órgão responsável: Scidades



A entrega se refere a construção de via, área de lazer e esporte, ciclovia e passeios ao longo das margens do Rio Cocó.



Até 2018, 35,31% das **margens do Rio Cocó** foram urbanizadas. A previsão para 2019 era chegar a 50,16%. A meta não foi totalmente alcançada devido aos imóveis que estavam em processo de desapropriação, aguardando pagamento. A maior parte foi paga na última semana de novembro, não tendo tempo para a empresa concluir a obra.

Meta 2019

50,16%
das margens
urbanizadas

Realizado 2019

41,61%
das margens
urbanizadas

Percentual de
alcançe da meta

42,42%

ENTREGA 3

Margens do Rio Maranguapinho urbanizadas

Órgão responsável: Scidades



A entrega se refere a construção de via, área de lazer e esporte, ciclovia e passeios ao longo das **margens do Rio Maranguapinho**.



Até 2018, 50,17% das margens foram urbanizadas. A previsão para 2019 era chegar a 57,57%. A meta não foi totalmente alcançada devido às fortes chuvas da quadra invernal e a rescisão de contratos paralisando as obras. Estas foram reiniciadas em julho mas não houve tempo o suficiente para alcançar a meta.

Meta 2019

57,57%
das margens
urbanizadas

Realizado 2019

53,05%
das margens
urbanizadas

Percentual de
alcançe da meta

38,92%

DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA

Área na comunidade do Dendê urbanizada
Órgão responsável: Scidades



A entrega se refere à **urbanização na Comunidade Dendê**, compreendendo pavimentação e/ou alargamento de vias existentes, construção de novas vias e passeios, praças e galerias de drenagem.



Até 2018, 25% da área foi urbanizada. A previsão para 2019 era chegar a 58,06%. A meta não foi alcançada por conta da paralisação das obras de saneamento (rescisão de contrato). Continuaram apenas os serviços da via de ligação da comunidade e as desapropriações.

Meta 2019

58,06%
da área urbanizada

Realizado 2019

35,53%
da área urbanizada

Percentual de
alcance da meta

31,94%


DESEMPENHO POR DESAFIO

DESAFIO PRIORITÁRIO

Ampliar a cobertura da população do interior com destinação final adequada dos resíduos sólidos



Desempenho dos Indicadores do Desafio

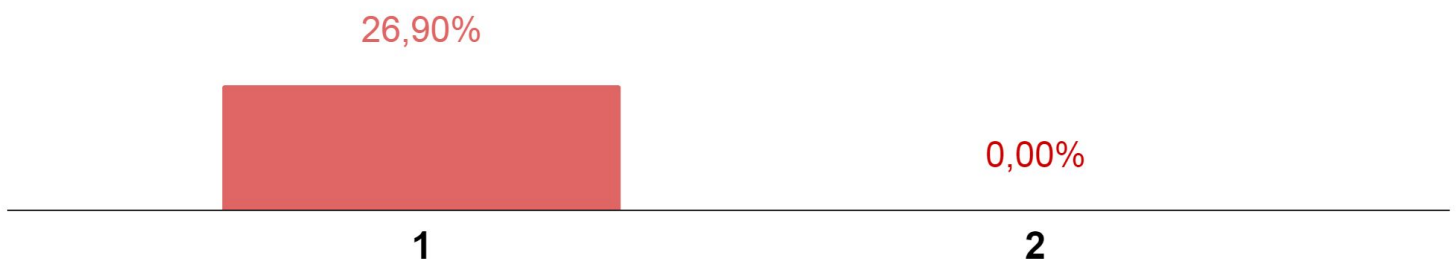

DESEMPENHO POR DESAFIO

INDICADOR 1 ?

Percentual de municípios do interior com deposição final em aterros sanitários licenciados



O indicador se refere ao percentual da população do interior (com exceção da Região Metropolitana de Fortaleza), que é atendida com a destinação adequada dos resíduos sólidos produzidos pela atividade humana.



Embora não houvesse previsão de aumento da meta em 2019, esperava-se a manutenção do percentual de 2018. A diminuição no indicador para 4,24% é resultado da descontinuidade do envio dos resíduos de Quixadá e Quixelô para o aterro privado de Senador Pompeu, bem como da perda da Licença de Operação (LO) do aterro de Sobral, que resultou na saída de Sobral, Meruoca e Santana do Acaraú dos municípios atendidos;

Meta 2019 ?

15,76%
municípios atendidos

Realizado 2019 ?

4,24%
municípios atendidos

Percentual de
alcançe da meta

26,90%

INDICADOR 2

Percentual de municípios do interior atendidos com centrais municipais de reciclagem



O indicador se refere ao percentual de municípios do interior que possuem instalações para triagem de materiais recicláveis secos, conhecidas como **Central Municipal de Reciclagem (CMR)**.



A meta não foi alcançada, pois apesar das três CMRs de Sobral terem sido entregues, a operação das mesmas não foram iniciadas em 2019.

Meta 2019

3,64%
municípios atendidos

Realizado 2019


0,00%
municípios atendidos

Percentual de
alcançe da meta

0,00%

DESEMPENHO POR DESAFIO

Desempenho das Entregas do Desafio

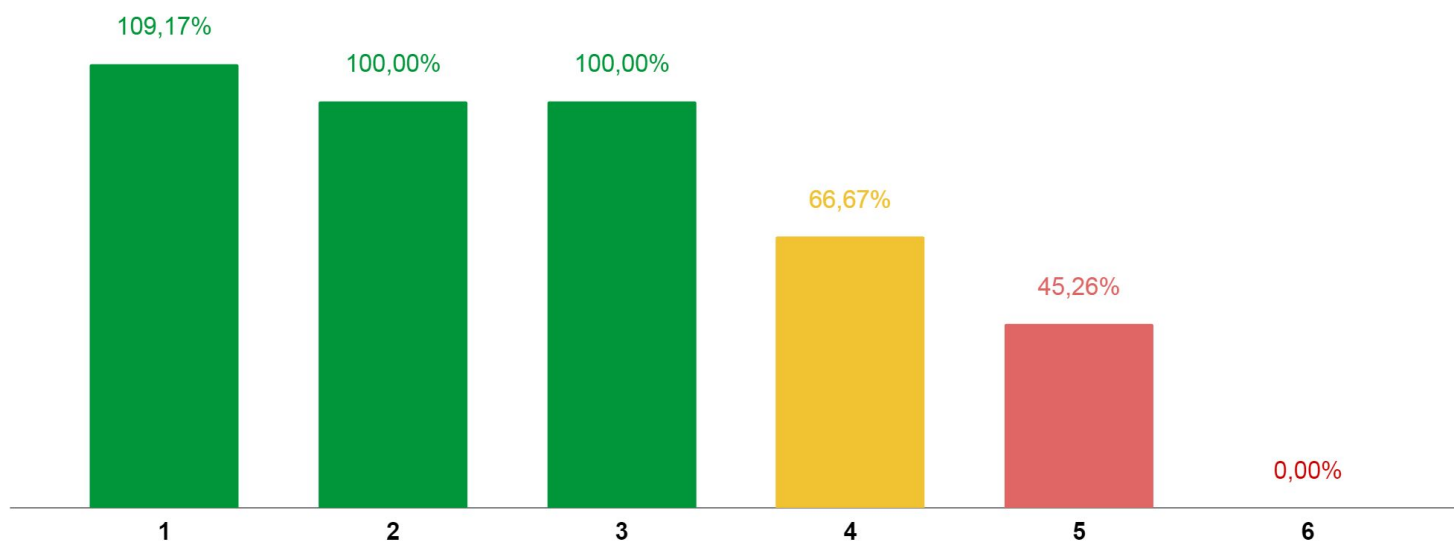

ENTREGA 1 ?

Catador de material reciclável capacitado

Órgão responsável: Scidades



A entrega consiste na **capacitação dos catadores** com a finalidade de promover melhoria da qualidade de vida, incentivando-os a produzirem de forma associada, fomentando a inclusão destes na cadeia produtiva da reciclagem de resíduos sólidos.



A meta foi alcançada e 1.441 catadores foram capacitados no ano de 2019.

Meta 2019

1.320
catadores
capacitados

Realizado 2019

1.441
catadores
capacitados

Percentual de
alcança da meta

109,17%



DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA 2

Central de Tratamento de Resíduos Regional Norte cedida
Órgão responsável: Scidades



A entrega se refere à cessão da Central de Tratamento de Resíduos (CTR) aos municípios. Esta etapa ocorre após a conclusão da construção da CTR para que esta possa começar a operar.



A meta foi alcançada e em setembro a **CTR Regional Norte foi cedida**, beneficiando 17 municípios.

Meta 2019

1

CTR cedida

Realizado 2019

1

CTR cedida

Percentual de
alcança da meta

100,00%



ENTREGA 3

Central Municipal de Reciclagem Tipo 03 – Cidades Polo – Vale do Acaraú – Sobral (Bairro Dom José, COHAB 2 e Alto da Expectativa) – construída
Órgão responsável: Scidades



A entrega se refere à construção de 3 Centrais Municipais de Reciclagem (CMR) no Vale do Acaraú, no município de Sobral.



Até 2018, foram executados 12,72% das obras das 3 CMRs. A meta foi alcançada e as três CMRs foram entregues.

Meta 2019

50,00%

das CMRs construídas

Realizado 2019

50,00%

das CMRs construídas

Percentual de
alcança da meta

100,00%



DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA 4

Diagnóstico socioeconômico dos catadores de materiais recicláveis elaborado

Órgão responsável: Scidades



A entrega se refere à elaboração de diagnósticos socioeconômicos dos **catadores de materiais recicláveis**.



Foram entregues seis diagnósticos em versão corrigida e os três restantes deverão ser entregues em 2021.

Meta 2019

9

diagnósticos elaborados

Realizado 2019

6

diagnósticos elaborados

Percentual de alcance da meta

66,67%

ENTREGA 5

Central Municipal de Reciclagem Tipo 03 – Cidades Polo – Vale do Jaguaribe – Limoeiro do Norte, Morada Nova e Russas – construída

Órgão responsável: Scidades



A entrega se refere à construção de 3 Centrais Municipais de Reciclagem (CMR), no Vale do Jaguaribe, nos municípios de Limoeiro do Norte, Morada Nova e Russas.



Até 2018, foram executados 13,37% das obras das 3 CMRs. A meta, em 2019, não foi alcançada pois a construtora paralisou as obras alegando falta de recebimento dos valores referentes aos serviços já executados. As três CMRs estão previstas para serem concluídas em 2020.

Meta 2019

50,00%

das CMRs construídas

Realizado 2019

29,96%

das CMRs construídas

Percentual de alcance da meta

45,26%

DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA 6

Plano regional de coleta seletiva entregue

Órgão responsável: Scidades



Refere-se à entrega do plano regional de coleta seletiva e dos equipamentos adequados (carros manuais, equipamentos de proteção individual - EPI e balanças eletrônicas).



A meta não foi alcançada. O plano foi concluído e a entrega dos produtos contratados aguardava autorização do fundo financiador, Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDID), para a cessão aos municípios.

Meta 2019

1

plano elaborado

Realizado 2019

0

plano elaborado

Percentual de
alcance da meta

0,00%


DESEMPENHO POR DESAFIO

DESAFIO PRIORITÁRIO

Ampliar cobertura e atendimento de abastecimento de água em áreas rurais do Estado



Desempenho dos Indicadores do Desafio

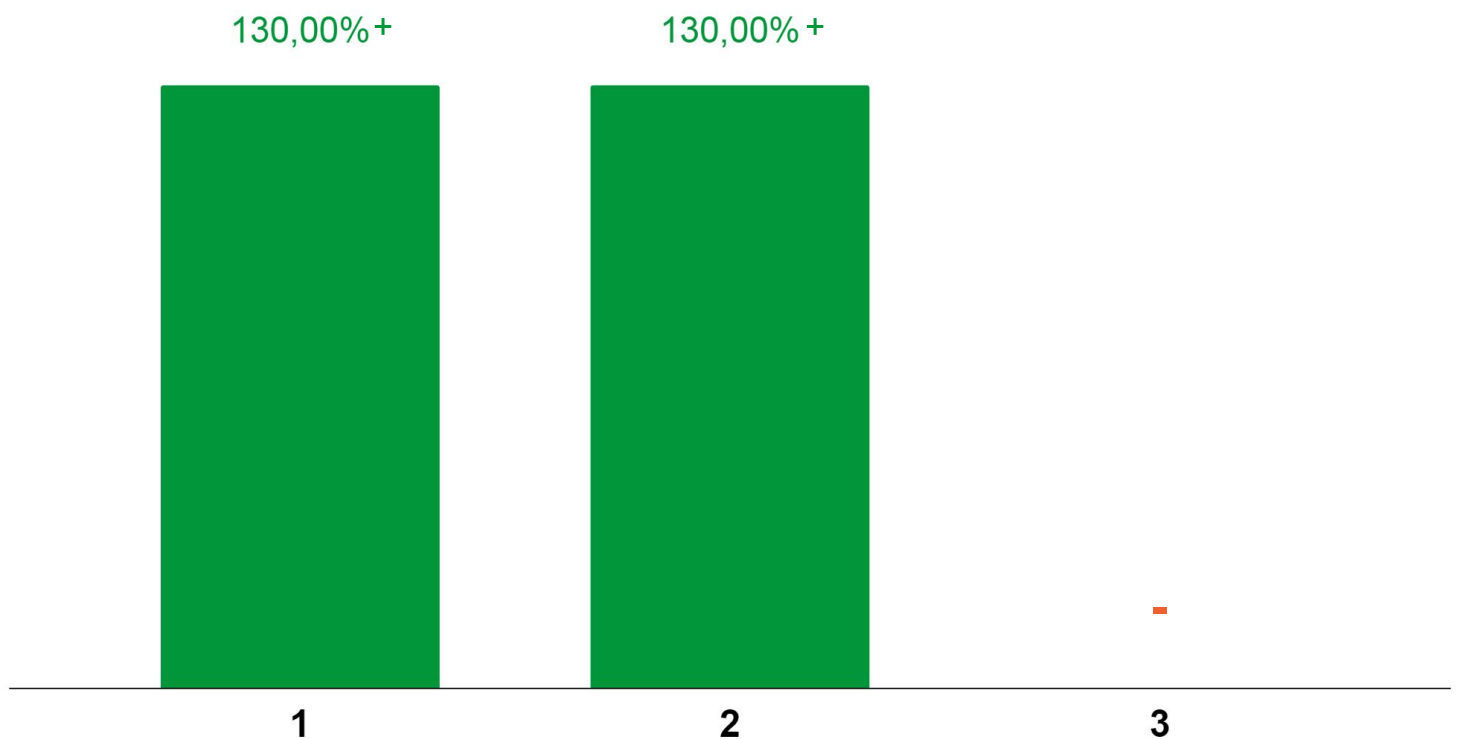

DESEMPENHO POR DESAFIO

INDICADOR 1 ?

Número de ligações totais das redes de abastecimento de água do SISAR



O indicador se refere ao número de ligações totais disponíveis pelas redes de abastecimento de água do **SISAR - Sistema Integrado de Saneamento Rural**. A ligação é a canalização entre a rede do distribuidor público e o hidrômetro (aparelho feito para medir corretamente o consumo de água, conhecido também como medidor e/ou relógio).



Até 2018, existiam 180.909 ligações. A previsão para 2019 era chegar a 187.135. Durante a definição da meta, foi considerado apenas a atuação da Scidades, porém este indicador também é afetado pela atuação da SDA (**Projeto São José**), das Prefeituras e do próprio Sisar. Devido a isso, o valor realizado foi bem superior à meta.

Meta 2019 ?

181.535
ligações totais

Realizado 2019 ?

187.135
ligações totais

Percentual de
alcance da meta

994,57%

INDICADOR 2

Número de ligações ativas das redes de abastecimento de água do SISAR



O indicador se refere ao número de ligações ativas pelas redes de abastecimento de água do SISAR. É considerada ligação ativa quando o usuário está de fato interligado à rede do distribuidor.



Até 2018, existiam 145.347 ligações ativas. A previsão para 2019 era chegar a 145.816. O valor realizado foi bem superior à meta pelo mesmo motivo do indicador anterior (indicador 1).

Meta 2019

145.816
ligações ativas

Realizado 2019

148.974
ligações ativas

Percentual de
alcance da meta

773,35%

DESEMPENHO POR DESAFIO

INDICADOR 3

Percentual da população rural atendida com Sistema de Abastecimento de Água



O indicador se refere ao percentual da população rural do Estado atendida por soluções individuais ou coletivas para o abastecimento de água.



Os dados de 2019 estão em processo de atualização, devendo ser finalizado apenas em 2021. No ano de 2018, segundo o Relatório de Desempenho Setorial, o percentual da população rural atendida com rede de abastecimento de água foi de 31,21%.

Meta 2019

32,05%
da população rural
atendida

Realizado 2019


-

Percentual de
alcance da meta

-

DESEMPENHO POR DESAFIO

Desempenho das Entregas do Desafio

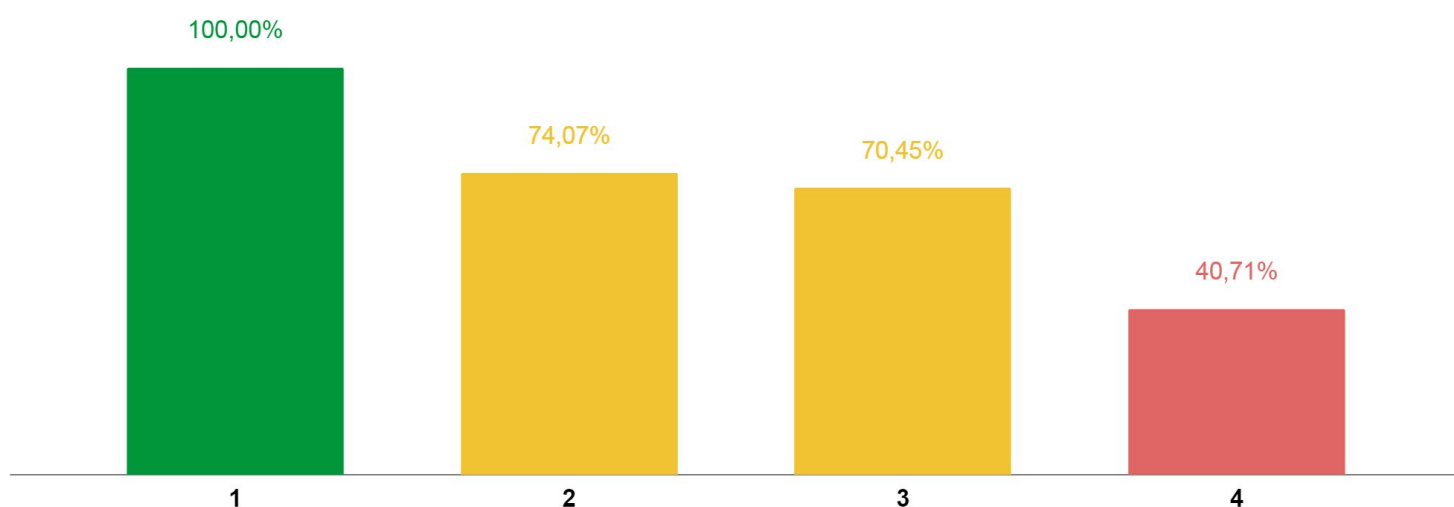

ENTREGA 1 ?

Sistema de Balança (Jati) implantado

Órgão responsável: Scidades



A entrega se refere à implantação de um **Sistema de Abastecimento de Água (Balança)**, no município de Jati. A obra pertence ao Programa de Integração do Rio São Francisco (PISF).



A meta foi alcançada e a obra foi concluída em outubro de 2019, possibilitando 184 ligações de água.

Meta 2019

100,00%
da obra

Realizado 2019

100,00%
da obra

Percentual de
alcança da meta

100,00%



DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA 2

Sistema de Complexo Beleza (Jati) implantado

Órgão responsável: Scidades



A entrega se refere à implantação de um Sistema de Abastecimento de Água (Beleza), no município de Jati. A obra pertence ao Programa de Integração do Rio São Francisco (PISF).



Até 2018, foi executado 64,44% da obra. A previsão para 2019 era concluir 100%. A meta não foi totalmente alcançada, porque a obra foi paralisada duas vezes. Além disso, houve uma incompatibilidade entre os equipamentos do sistema necessitando de reparos.

Meta 2019

100,00%
da obra

Realizado 2019

90,78%
da obra

Percentual de
alcança da meta

74,07%

ENTREGA 3

Sistema de Gentil (Penaforte) implantado

Órgão responsável: Scidades



A entrega se refere à implantação de um Sistema de Abastecimento de Água (Gentil), no município de Penaforte. A obra pertence ao Programa de Integração do Rio São Francisco (PISF).



Até 2018, foi executado 33,53% da obra. A previsão para 2019 era concluir 100%. A meta não foi totalmente alcançada porque não havia disponibilidade de água temporária enquanto as águas do Rio São Francisco não chegavam.

Meta 2019

100,00%
da obra

Realizado 2019

80,36%
da obra

Percentual de
alcança da meta

70,45%

DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA 4

Sistema de Barra de Santana (Jati) implantado

Órgão responsável: Scidades



A entrega se refere à implantação de um Sistema de Abastecimento de Água (Barra de Santana), no município de Jati. A obra pertence ao Programa de Integração do Rio São Francisco (PISF).



Até 2018, foi executado 83,05% da obra. A previsão para 2019 era concluir 100%. A meta não foi alcançada devido a paralisação da obra pela falta de água. Foi solicitado a escavação de poço para fornecer a água temporariamente, mas não houve liberação. O sistema ficou aguardando a chegada das águas do Rio São Francisco

Meta 2019

100,00%
da obra

Realizado 2019

89,95%
da obra

Percentual de
alcance da meta

40,71%

DESEMPENHO POR DESAFIO

DESAFIO PRIORITÁRIO ?

Ampliar cobertura e atendimento de esgotamento sanitário em áreas urbanas do Estado.



INDICADOR ?

Índice de cobertura de esgotamento sanitário nas localidades atendidas pela Cagece



O indicador refere-se ao percentual da população urbana que tem à sua disposição um **sistema de esgotamento sanitário**, nos municípios atendidos pela Cagece.



A meta prevista foi alcançada.

Meta 2019 ?

42,59%

Realizado 2019 ?

42,79%


Percentual de
alcançe da meta

100,47%



DESEMPENHO POR DESAFIO

Desempenho das Entregas do Desafio

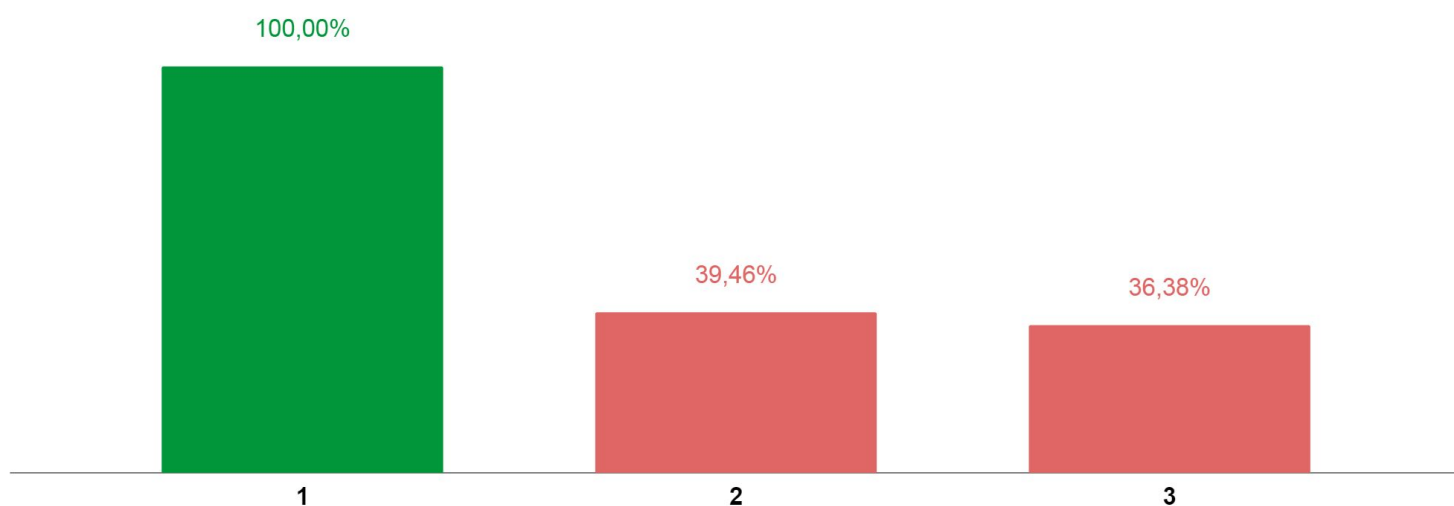

ENTREGA 1 ?

Sistema de Lagoa Seca (Juazeiro do Norte) implantado

Órgão responsável: Cagece



A entrega refere-se à implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Lagoa Seca, no município de Juazeiro do Norte.



A obra foi concluída em fevereiro de 2019.

Meta 2019

100,00%
da obra

Realizado 2019

100,00%
da obra

Percentual de
alcança da meta

100,00%



DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA 2

Sistema de Viçosa do Ceará implantado

Órgão responsável: Cagece



A entrega se refere à implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Viçosa do Ceará.



Até 2018, foi executado 83,35% da obra. A previsão para 2019 era concluir 100%. A meta não foi alcançada pois a obra foi paralisada em abril e só retomou no final de novembro. A conclusão física da obra aconteceu em agosto de 2020.

Meta 2019

100,00%
da obra

Realizado 2019

87,05%
da obra

Percentual de
alcance da meta

39,46%

ENTREGA 3

Sistema do Residencial Cidade Jardim implantado

Órgão responsável: Cagece



A entrega refere-se à implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Residencial Cidade Jardim, em Fortaleza



Até 2018, foi executado 55,85% da obra. A previsão para 2019 era concluir 100%. A meta não foi totalmente alcançada por conta de uma paralisação no final de julho. Isto ocorreu devido a readequação do projeto da obra. Apesar da Cagece ter respondido as pendências apontadas pela Caixa (órgão financiador), não houve o retorno da análise pela Caixa em 2019.

Meta 2019

100,00%
da obra

Realizado 2019

71,91%
da obra

Percentual de
alcance da meta

36,38%

VISITA TÉCNICA

Projeto Rio Maranguapinho

A Seplag, como intermediadora do Acordo firmado entre a Seinfra e o Governo do Estado, realiza visitas técnicas com o objetivo de conhecer os projetos prioritários e consequentemente auxiliar a Secretaria no âmbito das políticas públicas.

Em 2019, junto com a equipe da Scidades, a Seplag visitou as obras do **Projeto Rio Maranguapinho**. O Projeto tem como área de intervenção os municípios de **Fortaleza, Maranguape, Maracanaú e Caucaia**, com obras de dragagem e urbanização.

As margens foram divididas em 5 trechos (0, I, II, III e IV), margem esquerda e margem direita, além da construção de **uma barragem** e de **três pontes**, que já tinham sido concluídas e uma que estava em andamento.



No momento da visita, **três areninhas** estavam em construção, sendo prevista mais três ao longo dos trechos. Em parceria com prefeitura de Fortaleza, tinham sido entregues uma **torre de segurança** e **ecopontos**, mas ainda havia muitos depósitos irregulares.

Por fim, visitou-se o recém concluído (na época) prédio do **Batalhão de Polícia Ambiental**, responsável pela fiscalização da área;

GLOSSÁRIO

SOBRE O ACORDO DE RESULTADOS

Acordo de Resultados

Contrato firmado com as Secretarias do Estado do Ceará, contendo todos os projetos prioritários da Secretaria para o ano, além dos resultados alcançados.

Balanço do Acordo de Resultados

Documento em que se encontram os resultados dos projetos prioritários da Secretaria naquele ano, como definidos pelo seu Acordo de Resultados.

Resultados

São os efeitos positivos que o Governo do Estado busca trazer à sociedade por meio de suas ações.

Avaliação Geral do Acordo de Resultados

Avaliação realizada ao final do ano, a qual resulta em cinco notas distintas: nota dos indicadores, nota das entregas, nota financeira, nota do monitoramento e nota da pactuação. Ao final, faz-se uma média ponderada das cinco notas, produzindo a nota geral do Acordo de Resultados. A partir da comparação entre as notas gerais de todas as Secretarias, é elaborado o *Ranking Geral dos Acordos de Resultados*.

GLOSSÁRIO

SOBRE O ACORDO DE RESULTADOS

Plano Plurianual (PPA)

Instrumento de planejamento que estabelece, para cada região do Estado, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estadual durante um período de quatro anos. O PPA declara os compromissos do Governo do Estado com a sociedade e contribui para a execução das políticas públicas e o alcance dos seus resultados. É possível encontrar o **PPA 2016-2019** do Governo do Estado do Ceará [clikando aqui](#).

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

Define as metas e prioridades da administração pública estadual para cada ano, orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA, explicada abaixo), dispõe sobre a política de recursos humanos do Governo do Estado, a dívida pública estadual e quaisquer alterações aos tributos recolhidos junto à sociedade. É possível encontrar a **LDO 2019** do Governo do Estado do Ceará [clikando aqui](#).

Lei Orçamentária Anual (LOA)

Estima as receitas e fixa as despesas do Governo do Estado para cada ano, assegurando os gastos com o serviço público, com a manutenção e o funcionamento da administração pública, com o pagamento da dívida e recursos para programas e investimentos prioritários necessários ao desenvolvimento sustentável do Estado. É possível encontrar a **LOA 2019** do Governo do Estado do Ceará [clikando aqui](#).

GLOSSÁRIO

ESTRUTURA DO ACORDO

Desafio Prioritário

Reflete os principais resultados buscados pelas Secretarias, como definidos no Acordo de Resultados.

Indicador

Medida que permite observar alguma informação ou fenômeno presente na realidade. No Acordo de Resultados, permite que os resultados buscados pelas Secretarias sejam definidos, acompanhados e divulgados.

Entrega

Representam as ações realizadas pelos órgãos do Governo do Estado, na forma de bens, serviços e equipamentos entregues à sociedade.

LENDO O BALANÇO

Desempenho

Análise do conjunto de realizações da Secretaria. Pode se referir ao Acordo de Resultados como um todo (**Desempenho Geral**), a um desafio específico (Desempenho por Desafio) ou aos indicadores e entregas (Desempenho dos Indicadores/Entregas do Desafio).

GLOSSÁRIO

LENDO O BALANÇO

Realizado

Resultados alcançados (no caso dos indicadores) ou ações realizadas (no caso das entregas) pela Secretaria durante o ano de vigência do Acordo.

Meta

Previsão feita pela Secretaria de quais resultados espera alcançar (no caso dos indicadores) ou de quais ações pretende realizar (no caso das entregas), durante o ano de vigência do Acordo.

Órgão

responsável

Órgão do Governo do Estado que é responsável por realizar as ações necessárias para a execução das entregas. Cada entrega pode ter um ou mais órgãos responsáveis.

Ranking Geral dos Acordos de Resultados

Classificação ordenada de todos os Acordos de Resultados, a qual compara a nota geral de cada Secretaria com a nota geral das Secretarias restantes. Para ser possível comparar as Secretarias, utilizamos as notas dadas durante a **Avaliação Geral do Acordo de Resultados**.

GLOSSÁRIO

ANÁLISE FINANCEIRA

Fonte de Recurso

Mostra de onde vêm os recursos financeiros que podem ser gastos com uma ou mais entregas. Esses recursos podem vir do Governo do Estado ou de outras fontes como o Governo Federal.

Programado

Quantia total necessária para realizar uma ou mais entregas. O valor é uma previsão feita pelo Governo do Estado, antes de executar os projetos.

Limite

Quantia máxima liberada pelo Governo do Estado para que a Secretaria gaste com uma ou mais entregas prioritárias.

Empenhado

Quantia reservada pelo Governo do Estado, a qual é paga quando se entregam os bens ou se concluem os serviços necessários para a realização das entregas.



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
