



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

ACORDO DE RESULTADOS 2021

BALANÇO FINAL
DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
DADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO

SECRETARIA DAS CIDADES





CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

SECRETÁRIO

Ronaldo Lima Moreira Borges

SECRETÁRIO EXECUTIVO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto

COORDENADORIA ESPECIAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Régis Meireles Benevides

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA RESULTADOS

Maria Aparecida Gomes Rodrigues Façanha

ELABORAÇÃO

EQUIPE SEPLAG

Célula de Gestão para Resultados

João Gabriel Araújo Silva
Matheus Frota Braga
Rafael Paraiso Souto Maior Malta
Samara da Silva Trajano
Saruanna Dias de Carvalho

EQUIPE SCIDADES

Unidade Setorial de Planejamento

Lilian Nina Martins Romcy
Adriana Xavier de Santiago
Cleidiane Barros Cândido Vasconcelos
Jessyca Costa Barros
Andrelia de Freitas Lima
Barbara Oliveira Costa Fava
Alcides Maria Parente
Camila Augusta Passos Chaves
João Bosco de Castro
Filipe Braid Carannante

Agosto, 2022

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	4
2.	ÓRGÃOS VINCULADOS	5
3.	DESEMPENHO GERAL	6
4.	DESEMPENHO POR PROGRAMAS	
4.1	Programa 111 - Habitação e regularização Fundiária Urbana	7
4.2	Programa 113 - Habitação de interesse social na área rural	13
4.3	Programa 241 - Governança interfederativa das regiões	18
4.4	Programa 341 - Promoção da requalificação urbana	21
4.5	Programa 342 - Infraestrutura e logística	25
4.6	Programa 621 - Abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana	37
4.7	Programa 622 - Abastecimento de água, esgotamento sanitário no meio rural	52
4.8	Programa 722 - Revitalização de áreas urbanas degradadas	57
4.9	Programa 726 - Resíduos sólidos	63
5.	GLOSSÁRIO	67

APRESENTAÇÃO

Nesse Balanço, você encontrará os principais resultados e realizações da **Secretaria das Cidades (SCidades)** e seus órgãos vinculados no Acordo de Resultados assinado no ano de 2021.

O acesso a estas informações tem a finalidade de incentivar uma melhoria contínua da gestão e promover a transparência sobre os resultados das políticas públicas. Além disso, reconhece o trabalho desenvolvido pelos órgãos estaduais ao longo do ano, buscando apontar, por meio do resultado das análises, oportunidades de melhorias para o ano seguinte.

O Acordo de Resultados é um dos instrumentos que compõem o modelo de Gestão para Resultados (GpR), instituído no Estado do Ceará pelo [Decreto N° 32.216, de 08 de maio de 2017](#). No Acordo, são estabelecidos os resultados prioritários a serem alcançados pelos órgãos estaduais ao longo do ano, em alinhamento com o [Plano Plurianual \(PPA\)](#), a [Lei de Diretrizes Orçamentárias \(LDO\)](#) e a [Lei Orçamentária Anual \(LOA\)](#).

Para ter acesso ao Acordo de Resultados da Secretaria das Cidades (SCidades) no ano de 2021, [clique aqui](#). Para mais informações sobre os Acordos de Resultados e o modelo de Gestão para Resultados, consulte o [glossário](#) presente neste Balanço ou acesse nossa [página oficial](#).

ÓRGÃOS VINCULADOS

SCidades

SECRETARIA DAS CIDADES

Cagece

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO
DO CEARÁ

SOP

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS
PÚBLICAS

DESEMPENHO GERAL

SECRETARIA DAS CIDADES

E VINCULADAS

AVALIAÇÃO GERAL

7,08

Nota da
Secretaria

15^o

Posição no
Ranking *

8,49

Nota média
das Secretarias

PRINCIPAIS RESULTADOS



186.994 de ligações ativas nas redes de abastecimento de água do SISAR;



Índice de cobertura de abastecimento de água de 98,5% nas localidades atendidas pela Cagece;



90,63% das Áreas de risco eliminadas;



14.055 famílias beneficiadas com melhorias habitacionais na área rural (Fogões Sustentáveis).

* Para visualização do *Ranking* completo, [clique aqui](#).

SECRETARIA DAS CIDADES

PROGRAMA 111

HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

OBJETIVO

Proporcionar moradia digna à população, com segurança jurídica, para o enfrentamento do déficit habitacional urbano.




INDICADOR

Acumulado de imóveis com cadastro georreferenciadoPOLARIDADE **QUANTO MAIOR, MELHOR**

UNIDADE DE MEDIDA %

ATÉ 2020 **14,28%**META **63,23%**REALIZADO **33,00%**META ALCANÇADA **38,24% ***

EVOLUÇÃO DO INDICADOR

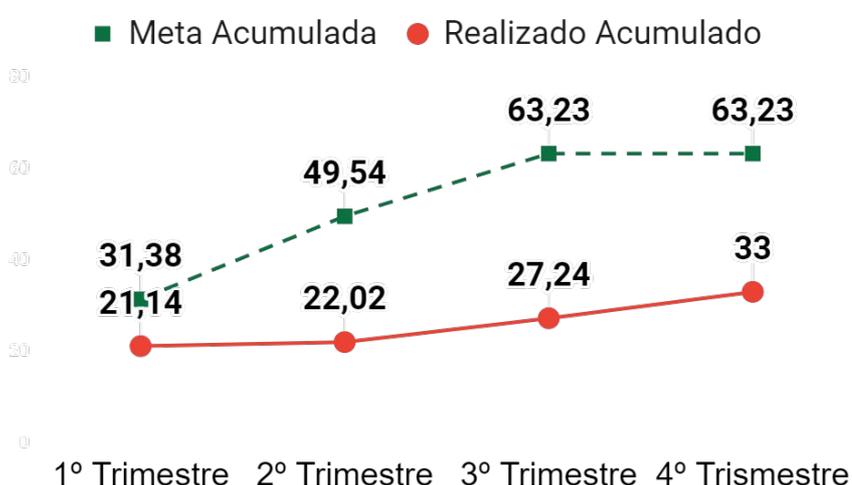

ANÁLISE DO DESEMPENHO

De janeiro a dezembro foram realizados o georreferenciamento de 3.628 imóveis. Sendo assim, o percentual acumulado de imóveis com cadastro georreferenciado chegou a 33% em 2021, considerando que o realizado até 2020 (14,28%).

As principais dificuldades do período foi o atraso da autorização do voo de drone para realização do georreferenciamento e a indefinição de novas áreas a serem regularizadas.

* Percentual considera apenas o realizado no ano de 2021.

INDICADOR

Evolução do número de famílias beneficiadas com habitação de interesse social na área urbana

POLARIDADE QUANTO MAIOR, MELHOR

UNIDADE DE MEDIDA N°


ATÉ 2020 27.171 famílias META 27.904 famílias REALIZADO 27.190 famílias

META ALCANÇADA 2,59% *

DEFINIÇÃO

Expressa o número acumulado de famílias em vulnerabilidade social que foram beneficiadas pelo Estado com unidades habitacionais através do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), das iniciativas dos programas de requalificação urbana, com reassentamento as famílias das áreas de risco,

EVOLUÇÃO DO INDICADOR

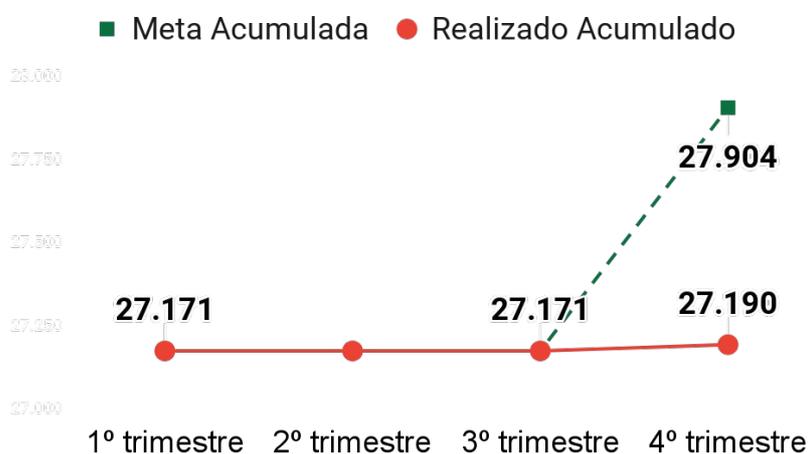

ANÁLISE DO DESEMPENHO

No período em análise foram entregues 19 unidades habitacionais por meio de convênio com o município de Massapê. Sendo assim, o indicador chegou a 27.190 famílias beneficiadas com unidade habitacional.


ENTREGA

Unidade habitacional implantada

UNIDADE DE MEDIDA Nº

META 733 habitações REALIZADO 19 habitações**META ALCANÇADA 2,59%**

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

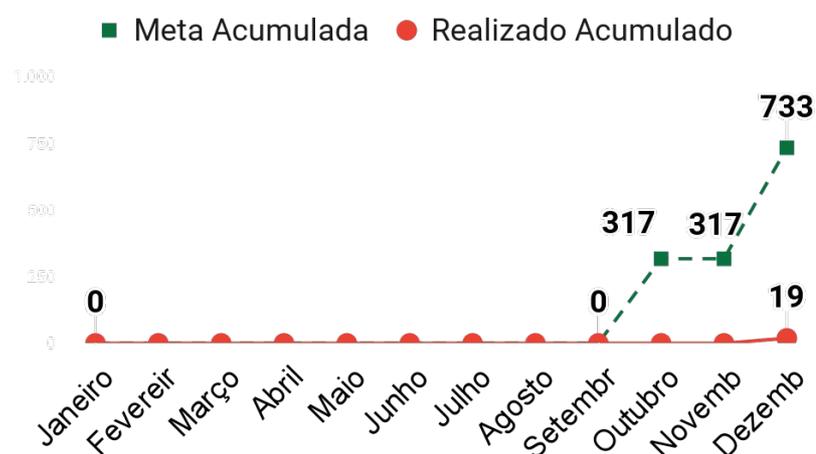

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Foram entregues 19 unidades habitacionais por meio de convênio com o município de Massapê. O residencial Alto da Paz II está com obras concluídas e demora na legalização por dificuldades junto ao Cartório de Imóveis, o que alterou a previsão de entrega para Setembro/ 2022. Os módulos III, IV e V do Residencial Cidade Jardim I, tiveram a retomada contratada em 2021.

PACTUADO

R\$ 84.593.699,55

EMPENHADO

R\$ 0,00

► Data de consulta: 20/12/2021

ENTREGA


Título entregue

UNIDADE DE MEDIDA N°

META 3.000 títulos REALIZADO 0 títulos

META ALCANÇADA 0,00%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA



ANÁLISE DO DESEMPENHO

Em 2021 as entregas dos Títulos não foi realizada pois dependiam de Acordos de Cooperação Técnica com a Prefeituras, Estado e Cartórios, onde nesses foi realizados os Cadastros multifinalitários. Houve reuniões com a prefeitura e os Cartórios para resolver essa questão, mas sem resolutividade para o ano de 2021.

PACTUADO

R\$ 1.269.622,04

► Data de consulta: 20/12/2021

EMPENHADO

R\$ 176.223,57

ENTREGA


Cadastro de imóvel georreferenciado

UNIDADE DE MEDIDA N°

META 9.489 cadastros REALIZADO 3.628 cadastros

META ALCANÇADA 38,23%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

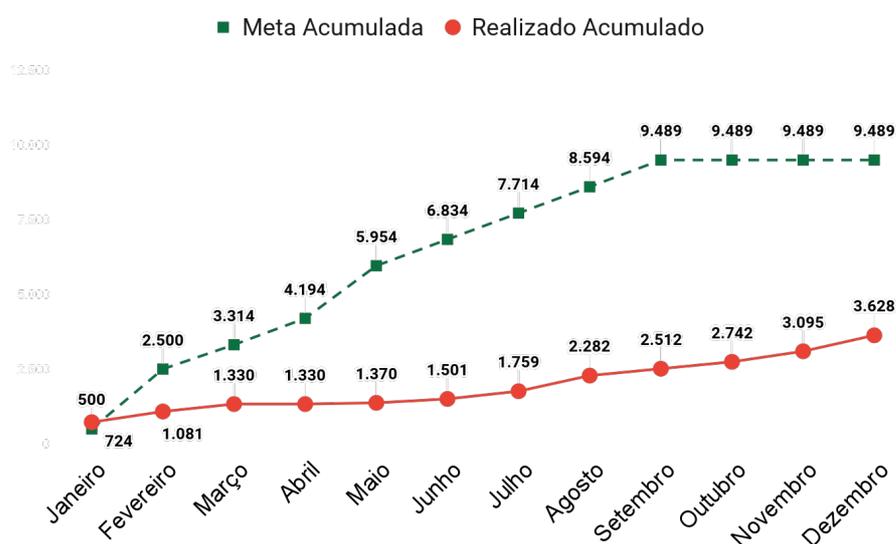

ANÁLISE DO DESEMPENHO

De janeiro a dezembro foram realizados o georreferenciamentos de 3.628 imóveis sendo 1.074 nos Bairros Gisélia Pinheiro e Mirandão e 1.725 na localidade Alto da Penha no município Crato; 702 imóveis pelo Projeto Rio Maranguapinho (178 no residencial Aldemir Martins, 107 imóveis no Blanchard Girão e 417 no residencial Miguel Arraes). Além desses, foram realizados o georreferenciamento de 127 imóveis nos residenciais Manoel Dias Branco e Joana D'Arc pelo Projeto Farol Novo, em Fortaleza.

PACTUADO

R\$ 0,00

EMPENHADO

R\$ 0,00

► Data de consulta: 20/12/2021

SECRETARIA DAS CIDADES

PROGRAMA 113

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL

OBJETIVO

Proporcionar moradia digna à população para o enfrentamento do déficit habitacional rural.



INDICADOR

Evolução do número de famílias beneficiadas com unidades habitacionais na área rural

POLARIDADE QUANTO MAIOR, MELHOR


UNIDADE DE MEDIDA n°

ATÉ 2020 969 habitações

META 1.169 habitações REALIZADO 969 habitações

META ALCANÇADA 0,00% *

EVOLUÇÃO DO INDICADOR

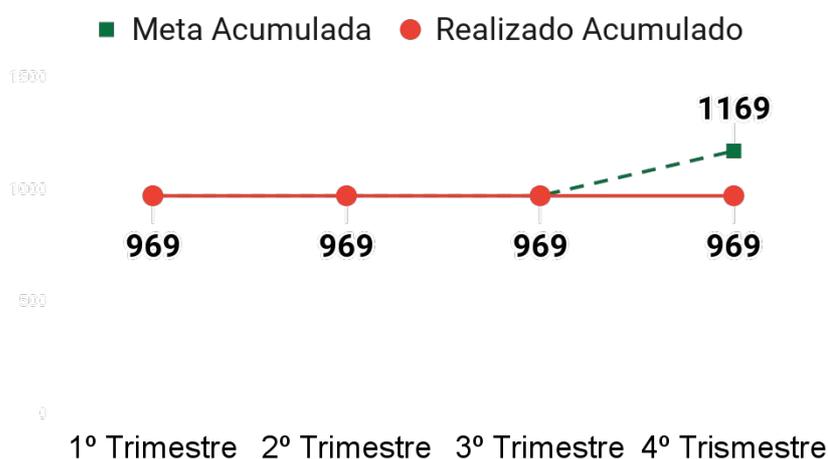

DEFINIÇÃO

Expressa o número acumulado de famílias em vulnerabilidade social que foram beneficiadas pelo Estado com unidades habitacionais através do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR).

ANÁLISE DO DESEMPENHO

No período em análise não foi entregue nenhuma unidade habitacional no meio rural e devido à pandemia e à indefinição da nova política de habitação do Governo Federal não deve haver entrega no ano. A secretaria se inscreveu ainda em um programa da Funasa - Fundação Nacional de Saúde, para substituição de 1000 casas de taipa em 10 municípios, mas não houve em 2021 andamento no processo.

* Percentual considera apenas o realizado no ano de 2021.

INDICADOR

Evolução do número de famílias beneficiadas com melhorias habitacionais na área rural

POLARIDADE **QUANTO MAIOR, MELHOR**UNIDADE DE MEDIDA **nº**ATÉ 2020 **11.465 famílias**META **14.055 famílias** REALIZADO **14.055 famílias**META ALCANÇADA **100,00% ***

EVOLUÇÃO DO INDICADOR



DEFINIÇÃO

o número acumulado de famílias em vulnerabilidade social que foram beneficiadas pelo Estado com unidades habitacionais através do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR).

ANÁLISE DO DESEMPENHO

No período em questão foram entregues 2.590 fogões totalizando 14.055 famílias beneficiadas. As dificuldades enfrentadas no ano foram em decorrência da pandemia que atrasou as atividades e também houve demora na aprovação de recursos para a atividade.

ENTREGA


Unidade habitacional implantada

UNIDADE DE MEDIDA Nº

META 200 habitações REALIZADO 0 habitações

META ALCANÇADA 0,00%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA



ANÁLISE DO DESEMPENHO

O programa a ser utilizado na política encontrava-se em fase de definição. Além disso, o Governo Federal não lançou a modalidade no Programa Casa Verde e Amarela que substitui o PNHR. A secretaria fez a inscrição em uma seleção da FUNASA - Fundação Nacional de Saúde, no mês de maio de 2020, um projeto para a construção de 1.000 casas populares, distribuídas em 10 municípios do estado, para substituição de casas de taipa. O resultado da seleção não foi divulgado em 2021.

ENTREGA


Fogão sustentável instalado

UNIDADE DE MEDIDA N°

META 2.590 habitações REALIZADO 2.590 habitações

META ALCANÇADA 100,00%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

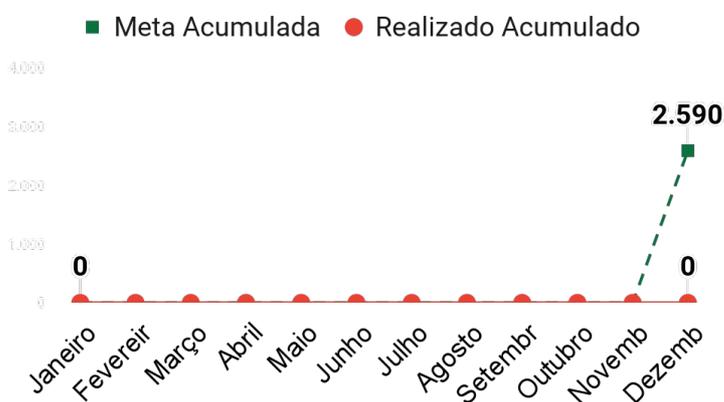

ANÁLISE DO DESEMPENHO

No mês de dezembro foram entregues 2.590 fogões totalizando 14.055 famílias beneficiadas. As dificuldades enfrentadas no ano foram em decorrência da pandemia que atrasou as atividades e também houve demora na aprovação de recursos para a atividade. Foram em 13 regiões de planejamento contempladas com os fogões sustentáveis, não tendo entrega apenas no sertão de Inhamuns.

SECRETARIA DAS CIDADES

PROGRAMA 241

GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES

OBJETIVO

Ampliar a capacidade da gestão dos municípios do Estado do Ceará em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum.



INDICADOR

Regiões Metropolitanas com Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) elaborado

POLARIDADE QUANTO MAIOR, MELHOR


UNIDADE DE MEDIDA %

ATÉ 2020 33,33%

META 66,67%

REALIZADO 33,33%

EVOLUÇÃO DO INDICADOR

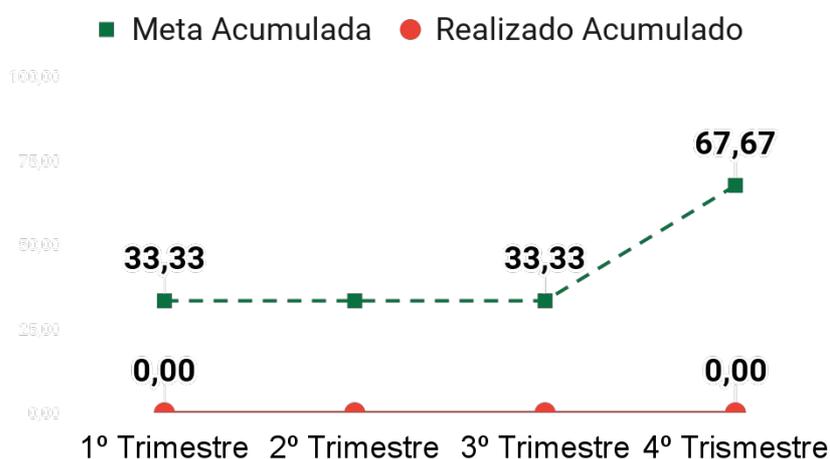

DEFINIÇÃO

Expressa o número de Regiões Metropolitanas que possuem o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) elaborado em relação ao total de Regiões Metropolitanas cearenses. Apenas a Região Metropolitana de Sobral apresentou PDUI elaborado no ano de 2018.

META ALCANÇADA 0,00% *

ANÁLISE DO DESEMPENHO

A meta para 2021 era alcançar 66,67% entregando o PDUI da Região do Cariri, com previsão de entrega em 2022.

Em outubro teve início as reuniões após a contratação de uma consultoria para dar continuidade ao projeto que estava paralisado. Já foram previstos seminários temáticos, audiências públicas, reuniões com as Instâncias Colegiadas e aprovação do plano de trabalho e macrozoneamento.

ENTREGA


Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da Região do Cariri elaborado

UNIDADE DE MEDIDA N°

META 1 Plano REALIZADO 0 Plano

META ALCANÇADA 0,00%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

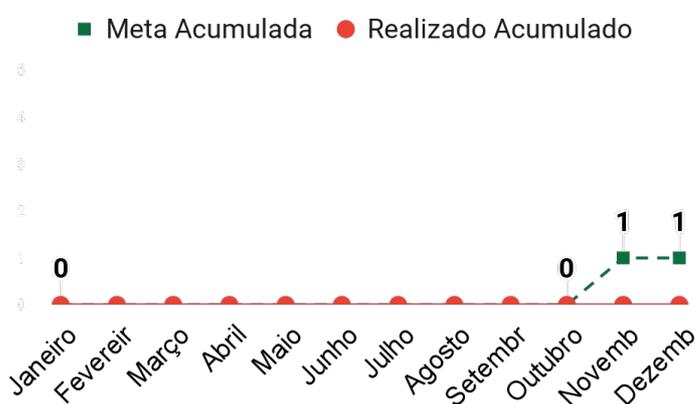

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Como a consultoria foi contratada apenas em outubro, requer um tempo para analisar o que foi produzido, uma vez que houveram várias alterações nas equipes que o produziram, inclusive mudanças nas indicações das instâncias

A consultoria fez a revisão dos documentos , com a Instância Colegiada Deliberativa da região Metropolitana do Cariri, regulamentada por Portaria 085/2022 , publicada no Diário Oficial de 19 de maio de 2022.

SECRETARIA DAS CIDADES

PROGRAMA 341

PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA

OBJETIVO

Requalificar espaços públicos para a melhoria da convivência social, desenvolvimento econômico e melhoria dos serviços públicos, com foco em áreas de maior vulnerabilidade.



INDICADOR


Área urbana requalificadaPOLARIDADE **QUANTO MAIOR, MELHOR**UNIDADE DE MEDIDA **m²**

DEFINIÇÃO

Expressa o somatório de áreas urbanas requalificadas através do programa Promoção da Requalificação Urbana.

META 872.180,00 m² REALIZADO 776.178,58 m² META ALCANÇADA 88,99%*

EVOLUÇÃO DO INDICADOR

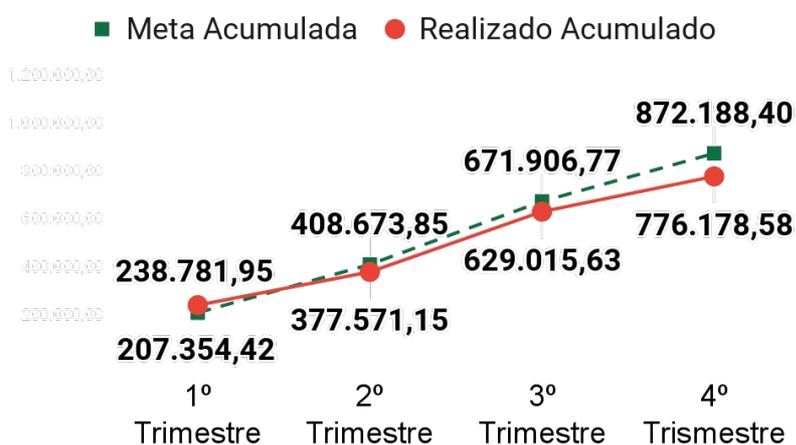

ANÁLISE DO DESEMPENHO

No período de janeiro a dezembro foi registrada a entrega de 776.178,58 metros quadrados, correspondendo a 88,99% da meta. Sendo 760.810,58 metros quadrados entregues pela Scidades, superando a meta pactuada e 15.368,00 metros quadrados pela Seinfra, 8,28% da meta. As principais dificuldades para o alcance da meta periódica estão relacionadas à situação de inadimplências de alguns municípios convenientes que impedem o repasse por consequência do término das obras. Em relação Seinfra, à Obra de internalização da rede elétrica do Sítio Histórico de Sobral, mais testes tiveram de ser realizados no centro satélite e foi necessário a contratação de uma empresa especializada para a realização das provas


ENTREGA

Espaço urbano requalificado

UNIDADE DE MEDIDA m²META 233.650,00 m² REALIZADO 106.877,21 m²

META ALCANÇADA 45,74%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

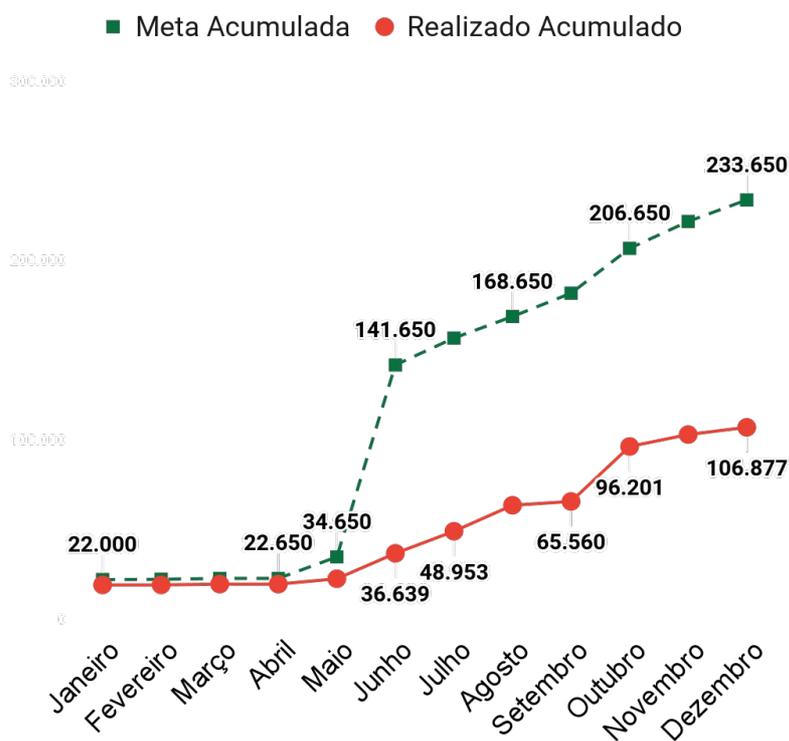

ANÁLISE DO DESEMPENHO

A entrega se refere às obras de requalificação de espaços públicos como praças, mercados, galpões, abrigos, entre outros por meio de convênios com as Prefeituras ou Contratos. Em relação à obra de Urbanização da Lagoa do Pontal no município de Quixeré - Vale do Jaguaribe - a parte de urbanização já se encontra concluída e inaugurada, estando pendente apenas a execução da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE. Percentual de execução do contrato é de 94,22%.

As principais dificuldades com relação aos convênios são prefeituras inadimplentes, o que tem dificultado os repasses de recursos financeiros para conclusão dos projetos.

PACTUADO

R\$ 6.674.781,84

EMPENHADO

R\$ 2.584.932,64

► Data de consulta: 20/12/2021


ENTREGA

Via pavimentada

UNIDADE DE MEDIDA m²META 453.000,00 m² REALIZADO 653.933,37 m²

META ALCANÇADA 144,36%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

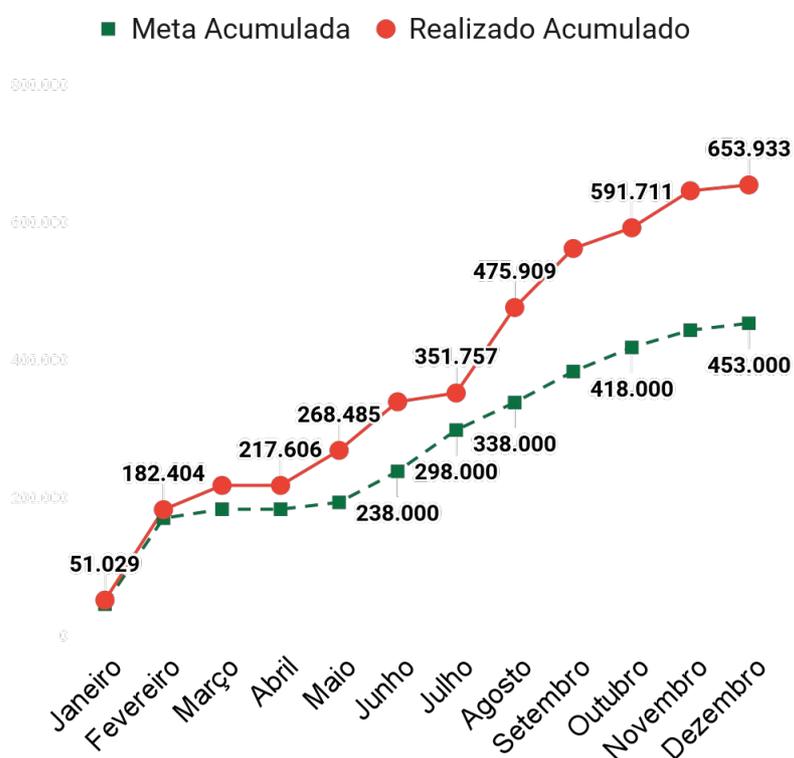

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Em 2021 a meta foi superada em 44,36%, mesmo com algumas prefeituras se encontrando em situação de inadimplência, os valores liberados para as que estavam em situação regular foram suficientes para alcançar a meta prevista e até superar.

PACTUADO

R\$ 197.193,08

EMPENHADO

R\$ 0,00

► Data de consulta: 20/12/2021

SECRETARIA DAS CIDADES

PROGRAMA 342

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

OBJETIVO

Assegurar infraestrutura e logística adequada e diversificada para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará



INDICADOR

Não conformidade de obras rodoviárias

POLARIDADE QUANTO MENOR, MELHOR

UNIDADE DE MEDIDA %


META 10% de não conformidades REALIZADO 4,78% de não conformidade

META ALCANÇADA 152,20% *

DEFINIÇÃO

Expressa a relação entre o número de obras rodoviárias fiscalizadas pela SOP que apresentaram não conformidades graves durante a execução e o número total de obras avaliadas no período de análise.

EVOLUÇÃO DO INDICADOR

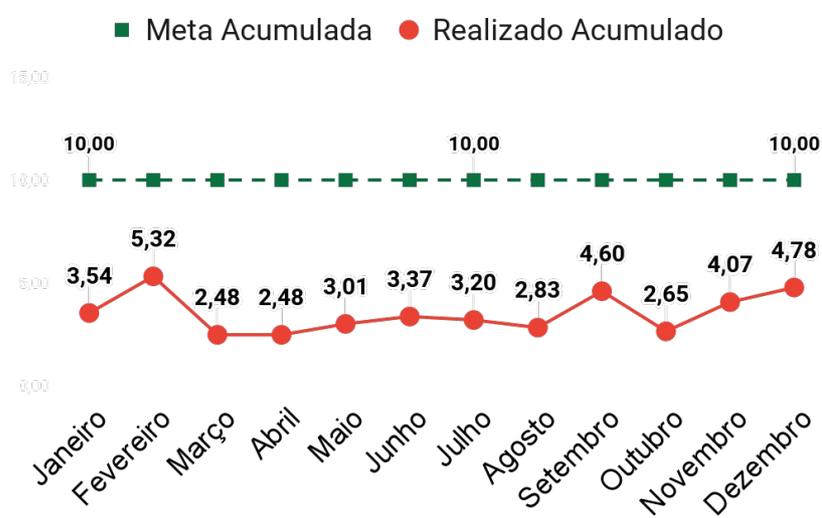

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Possibilita ao Órgão acompanhar a qualidade na execução dos serviços das obras rodoviárias e sua evolução, garantindo a contínua melhora da qualidade nas rodovias. O indicador tem polaridade negativa, ou seja, quanto menor, melhor.

Logo, o valor superou a meta estabelecida. Com isso, apenas 4,78% das obras apresentaram algum tipo de não conformidade com o projeto.


* Percentual considera apenas o realizado no ano de 2021.

ENTREGA

Obras de recuperação funcional nas rodovias estaduais realizadas

UNIDADE DE MEDIDA **km**META **400,00 km** REALIZADO **739,15 km**META ALCANÇADA **184,79%**

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

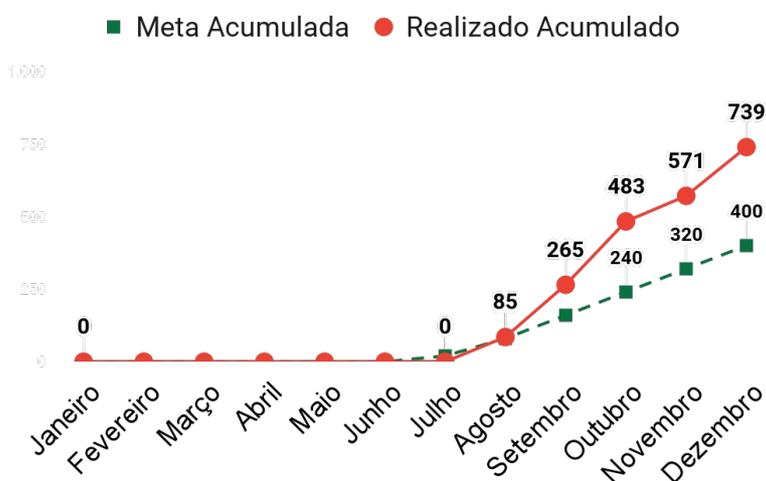

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Em 2021 foram recuperados 739,15 km de rodovias estaduais, superando a meta para o ano em 84,79%.

PACTUADO

R\$ 57.301.765,65

EMPENHADO

R\$ 37.269.698,62

► Data de consulta: 20/12/2021

ENTREGA

Conservação rotineira das rodovias estaduais realizada


UNIDADE DE MEDIDA km

META 12.037,56 km

REALIZADO 9.554,31 km

META ALCANÇADA 79,37%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

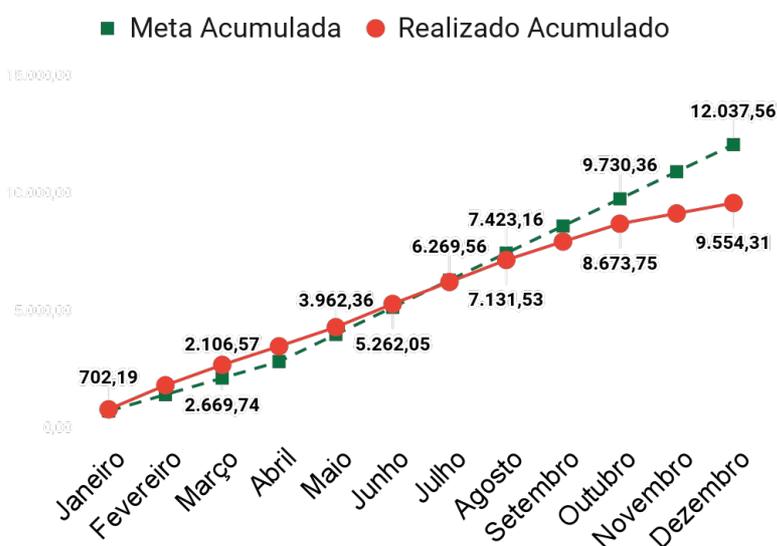

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Em 2021 foram conservados 9.554,31 km de rodovias estaduais, 20,63% abaixo da meta estipulada para o ano, e com uma média mensal de 796,16 km. Um dos motivos para o não alcance da meta é investimento em obras rodoviários e o lançamento do Programa de Recuperação Funcional em julho de 2021, com programação para restaurar aproximadamente 2000 km de rodovias, melhoram a qualidade da malha e consequentemente diminuem os serviços de conserva (tapa buraco e remendos).

PACTUADO

R\$ 177.972.376,46

EMPENHADO

R\$ 155.598.341,19


► Data de consulta: 20/12/2021

ENTREGA

CE-380 - Entr. BR-116 (Barro) - Cuncas - Divisa CE/PB - restaurada (extensão: 15,00 km)

UNIDADE DE MEDIDA **km**META **6,76 km** REALIZADO **5,85 km**META ALCANÇADA **86,54%**

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

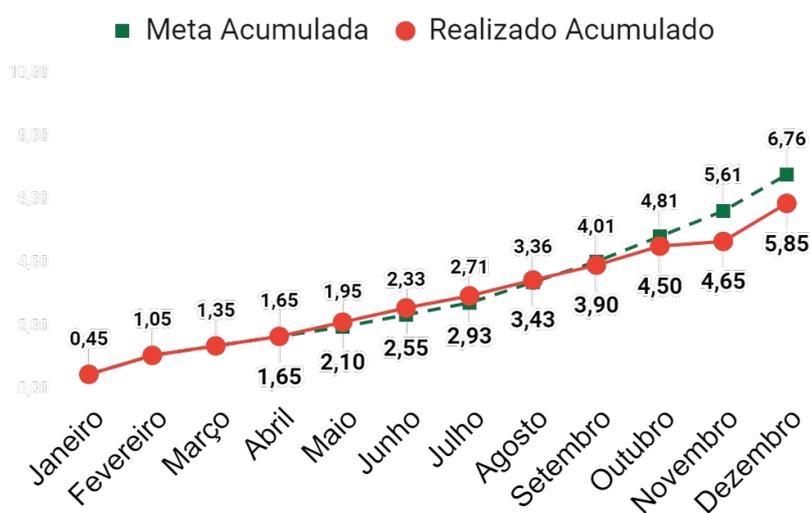

ANÁLISE DO DESEMPENHO

O atraso que ocorreu durante o ano foi considerado normal, tomando como base que as metas mensais foram estimadas ainda no início da obra. O trecho ainda finalizou o ano atingindo uma execução próxima de 87% da meta programada.

PACTUADO

R\$ 8.915.744,48

EMPENHADO

R\$ 3.722.826,72

► Data de consulta: **20/12/2021**

ENTREGA


Entrega: CE-155 - Trecho: Porto do Pecém - Entr. BR-222 (Arco Metropolitano) - duplicada (extensão 20,10 km)

UNIDADE DE MEDIDA km

META 4,08 km REALIZADO 6,44 km*

META ALCANÇADA 157,84%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

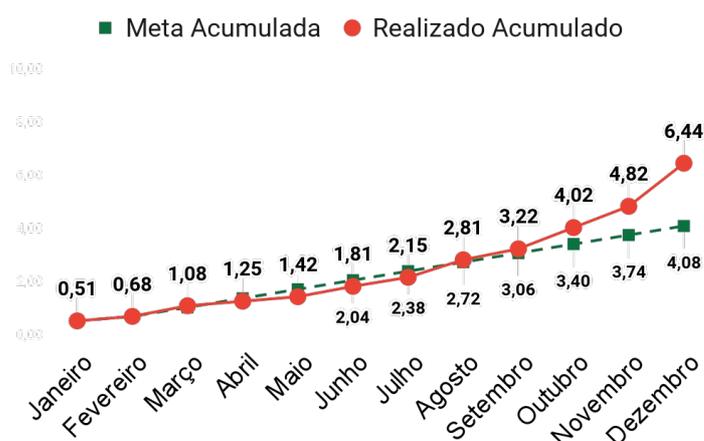

ANÁLISE DO DESEMPENHO

***A meta prevista foi ultrapassada** pelo fato que na época de elaboração das mesmas a obra se encontrava em atualização de seu projeto, com o intuito de mitigar interferência ainda existentes na rodovia, não existindo previsão de conclusão desses ajustes. Foi considerado então, uma meta conservadora pelo histórico da rodovia.

PACTUADO

R\$ 84.826.113,42

EMPENHADO

R\$ 44.887.901,53


► Data de consulta: 20/12/2021

ENTREGA

CE-085 - Trecho: Itarema - Acaraú - duplicada (Extensão 26,54 km)

UNIDADE DE MEDIDA **km**META **8,71 km** REALIZADO **8,68 km**META ALCANÇADA **99,66%**

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

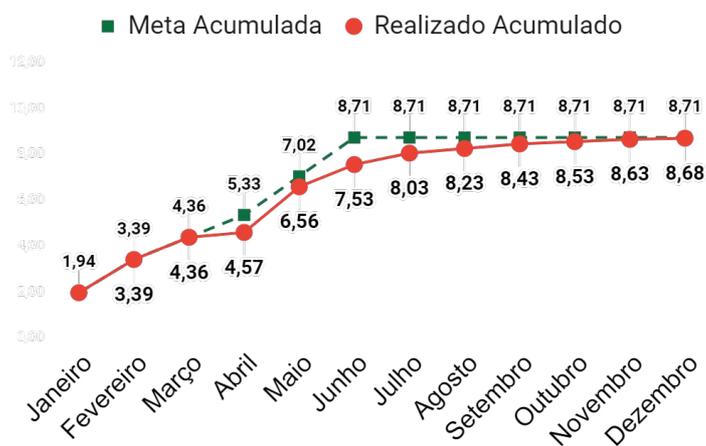

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Novo Aditivo de Prazo para inclusão de serviços. Nova data de conclusão: Outubro/22.

O MAPP 719 foi criado para pagamento das desapropriações necessárias para a realização do trecho. Não foi executado nada até o momento pois os laudos técnicos de desapropriação estão sendo atualizados. A execução da obra e dos serviços referentes a ela são condicionados ao MAPP 559 - Restauração da Rodovia CE-085, Trecho: Entr. CE-556 (Itarema) - Entr. BR-403 (Acaraú) (24,29 km) (DER 1418).

PACTUADO

R\$ 84.826.113,42

EMPENHADO

R\$ 44.887.901,53


► Data de consulta: **20/12/2021**

ENTREGA

CE-263 - Jaguaruana - Entr. BR-304 - implantada (Extensão 35,14 km)

UNIDADE DE MEDIDA **km**META **9,13 km** REALIZADO **9,13 km**META ALCANÇADA **100,00%**

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

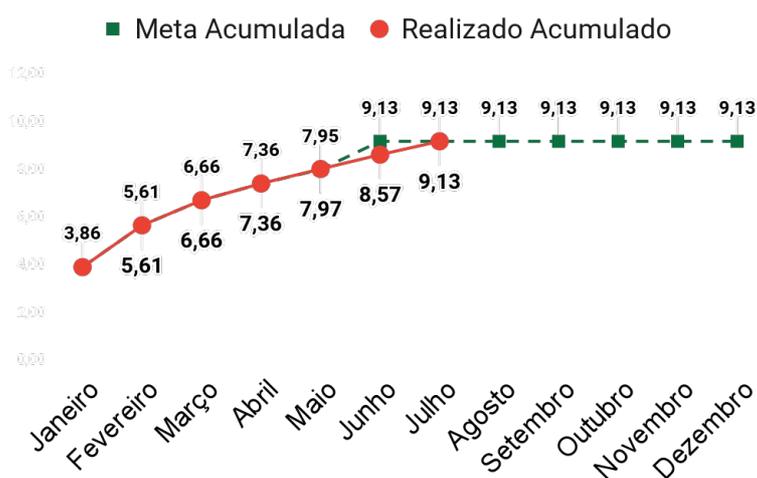

ANÁLISE DO DESEMPENHO

A execução da obra aconteceu em ritmo normal, ficando bem abaixo do que havia sido planejado apenas no mês de junho. Impactando assim prazo, na qual a mesma foi concluída um mês após o planejado.

PACTUADO

R\$ 9.625.084,14

EMPENHADO


R\$ 9.363.863,34

▶ Data de consulta: **20/12/2021**

ENTREGA

**CE-293 - Entr. BR-116 - Missão velha - duplicada
(extensão: 27,40 km)**UNIDADE DE MEDIDA **km****META 3,82 km REALIZADO 0,82 km****META ALCANÇADA 21,47%**

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

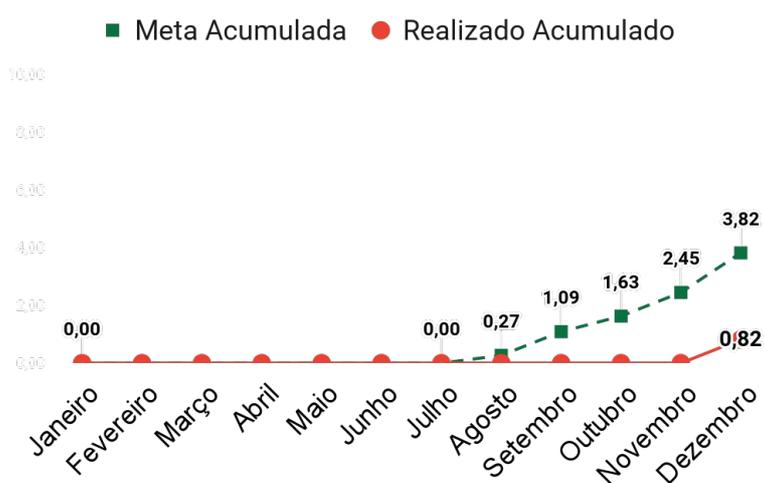

ANÁLISE DO DESEMPENHO


Obra não concluída pois aguardou-se a Ordem de Serviço até o mês Dezembro, para só assim retornar a execução.

ENTREGA

CE-240 - Entr. CE-085 (Parra) - Itapipoca - pavimentada (extensão: 29,30 km)

UNIDADE DE MEDIDA **km**META **4,73 km** REALIZADO **4,66 km**META ALCANÇADA **98,52%**

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

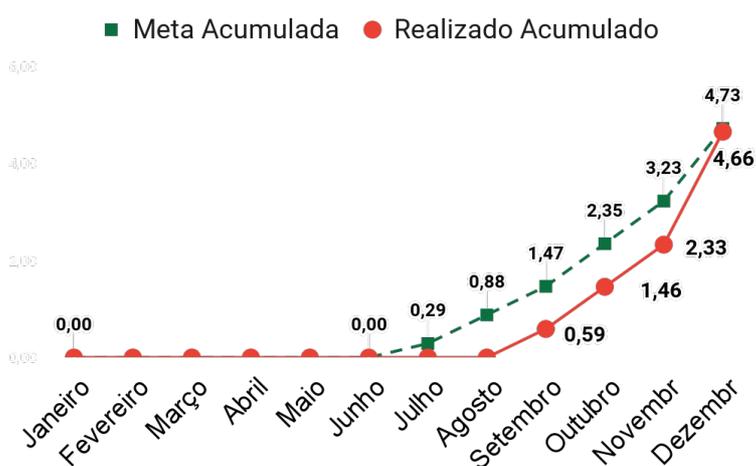

ANÁLISE DO DESEMPENHO


Em 2021 a obra sofreu com atrasos por conta do processo licitatório e a emissão da ordem de serviço, que fez com a mesma só iniciasse a execução em setembro, ao invés do planejado que era julho.

ENTREGA

Av. do Contorno - Trecho V: Entr. CE - 060 - Av Castelo Branco - Juazeiro do Norte - duplicada (extensão 6,88 km)

UNIDADE DE MEDIDA **km**META **1,47 km** REALIZADO **0,83 km**META ALCANÇADA **56,46%**

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

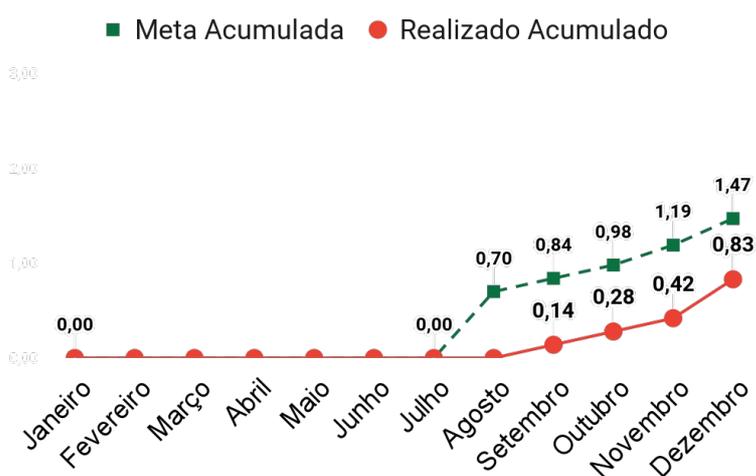


ANÁLISE DO DESEMPENHO

O atraso é atribuído ao fato que na época da elaboração das metas tal trecho ainda encontrava-se em projeto, sendo estimada uma data para a realização da licitação das obras. Tal licitação só veio a ocorrer um pouco depois da data estimada inicial, atrasando o começo da obra.

ENTREGA

Contorno de Itapipoca implantado (Extensão 9,05 km)UNIDADE DE MEDIDA **km****META 1,05 km REALIZADO 1,05 km****META ALCANÇADA 100,00%**

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

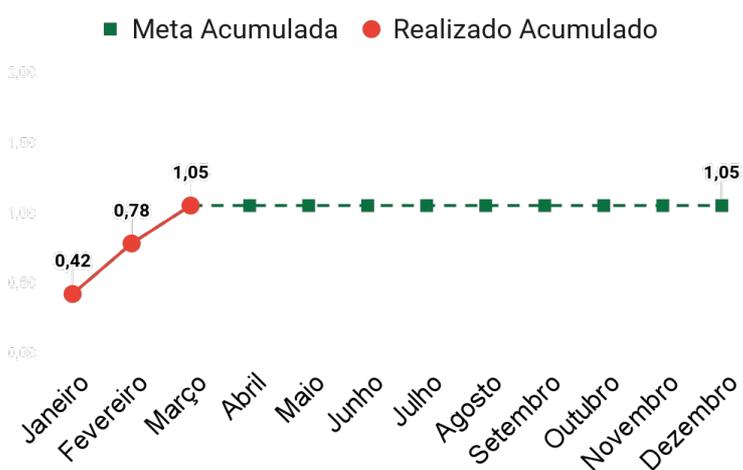

ANÁLISE DO DESEMPENHO

A obra foi concluída conforme previsto.

PACTUADO

R\$ 2.017.000,23

EMPENHADO

R\$ 44.145,61

► Data de consulta: 20/12/2021

SECRETARIA DAS CIDADES

PROGRAMA 621

ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA

OBJETIVO

Ampliar o acesso da população cearense aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem em condições adequadas.



INDICADOR

Índice de cobertura de abastecimento de água nas localidades atendidas pela Cagece

POLARIDADE **QUANTO MAIOR, MELHOR**

UNIDADE DE MEDIDA %


ATÉ 2020 **98,44 %**META **98,45%** REALIZADO **98,50%**

DEFINIÇÃO

Expressa em percentual, o total da população urbana residente nas localidades atendidas pela Cagece, com sistema de abastecimento de água à disposição, nas situações de ligação ativa, cortada, suspensa, suprimida, sem ligação e na situação de rede ativa e factível. Dessa forma, expressa a infraestrutura existente e seu crescimento revela os investimentos em medidas estruturais.

META ALCANÇADA **600,00%***

EVOLUÇÃO DO INDICADOR

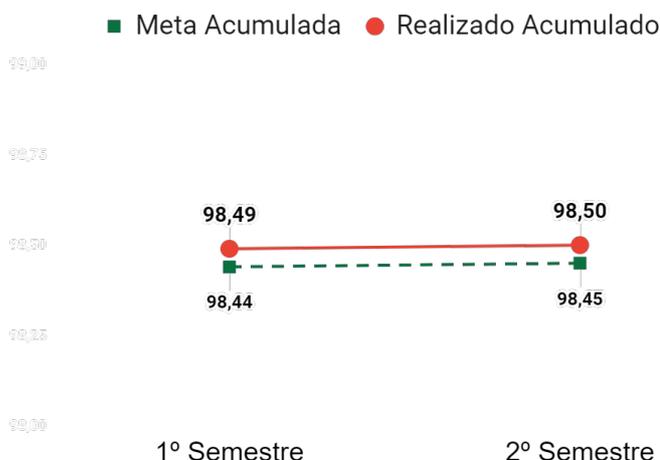

ANÁLISE DO DESEMPENHO

O alcance da meta se deve a conclusão das obras de SAA Aeroporto, Triângulo e São José em Juazeiro do Norte, SAA Parajuru em Beberibe, SAA Quixadá, SAA Jaibaras em Sobral, além do trabalho de ampliação realizado pelas Unidades de Negócio.

* Percentual considera apenas o realizado no ano de 2021.

INDICADOR

Índice de cobertura de esgotamento sanitário nas localidades atendidas pela Cagece

POLARIDADE **QUANTO MAIOR, MELHOR**

UNIDADE DE MEDIDA %


ATÉ 2020 **44,69 %**META **45,04%** REALIZADO **44,62%**

DEFINIÇÃO

Expressa em percentual, o total da população urbana residente nas localidades atendidas pela Cagece, com sistema de esgotamento sanitário à disposição, nas situações de ligação ativa, tamponada, suspensa, ligada sem interligação, sem ligação, sem condição de interligar e na situação de rede ativa e factível. Dessa forma, expressa a infraestrutura existente e seu crescimento revela os investimentos em medidas estruturais

META ALCANÇADA **-20,00%***

EVOLUÇÃO DO INDICADOR

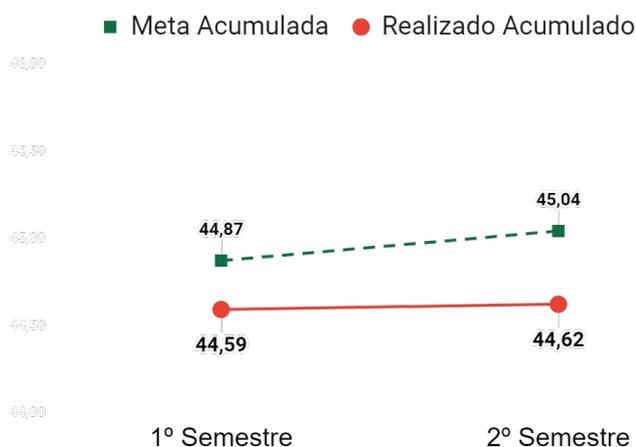

ANÁLISE DO DESEMPENHO

O não alcance da meta se deu pelas ligações previstas para a obra do SES Massapê que, apesar de concluída, ainda não entraram no sistema e a paralisação da obra do SES Palmeira Comprida (Tiangúá). Além do cadastramento de clientes sem acesso aos serviços de coleta de esgoto, refletindo na necessidade de um maior esforço da companhia em expandir os sistemas.

* Percentual considera apenas o realizado no ano de 2021.

ENTREGA


Sistema de abastecimento de água do Aeroporto, Triângulo e São José (Juazeiro do Norte) ampliado

UNIDADE DE MEDIDA N°

META 1 sistema REALIZADO 1 sistema

META ALCANÇADA 100,00%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

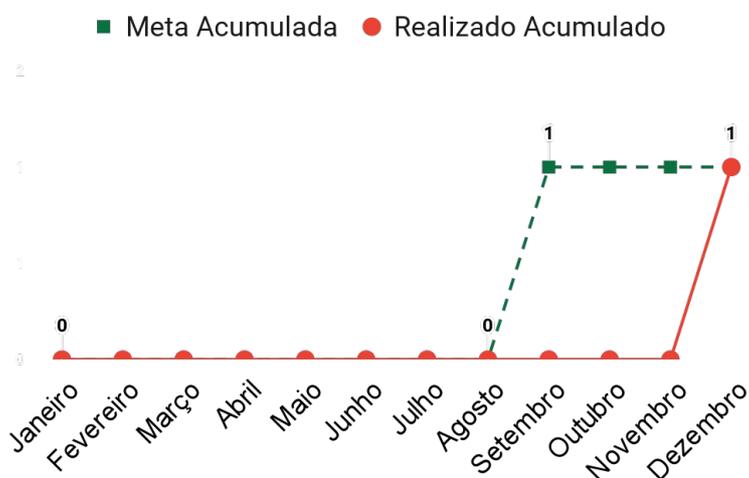

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Obra concluída fisicamente, inaugurada em 11/12/2021 e TRO(Termo de Recebimento Operacional) emitido em 21/12/21. O sistema está beneficiando 51.652 habitantes conforme população de final de plano do projeto.

PACTUADO

R\$ 7.360.509,79

EMPENHADO

R\$ 4.073.234,41

► Data de consulta: 20/12/2021

ENTREGA


Sistema de abastecimento de água de Parajuru (Beberibe) ampliado

UNIDADE DE MEDIDA N°

META 1 sistema REALIZADO 1 sistema

META ALCANÇADA 100,00%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

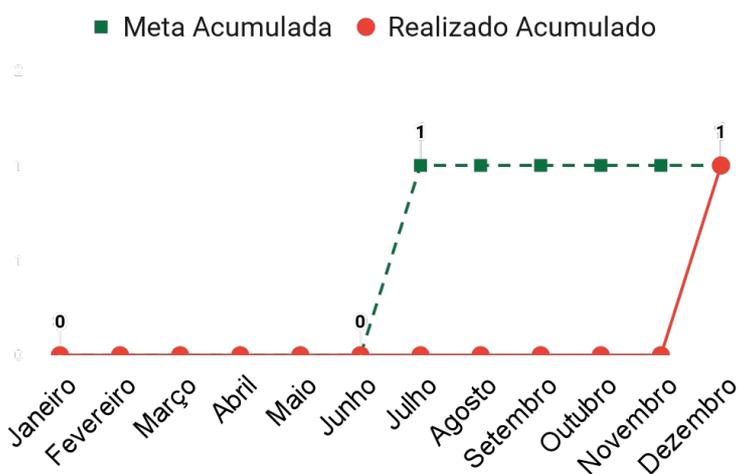

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Obra concluída fisicamente no mês de Dezembro, beneficiando 6.406 pessoas conforme população de final de plano do projeto. Termo de recebimento operacional de Parajuru assinado em 21/12/2021.

PACTUADO

R\$ 1.710.423,16

EMPENHADO

R\$ 1.710.423,16

► Data de consulta: 20/12/2021

ENTREGA

Sistema de abastecimento de água de Umirim, Oiticica e Caxitoré ampliado


UNIDADE DE MEDIDA N°

META 1 sistema

REALIZADO 0 sistema

META ALCANÇADA 0,00%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

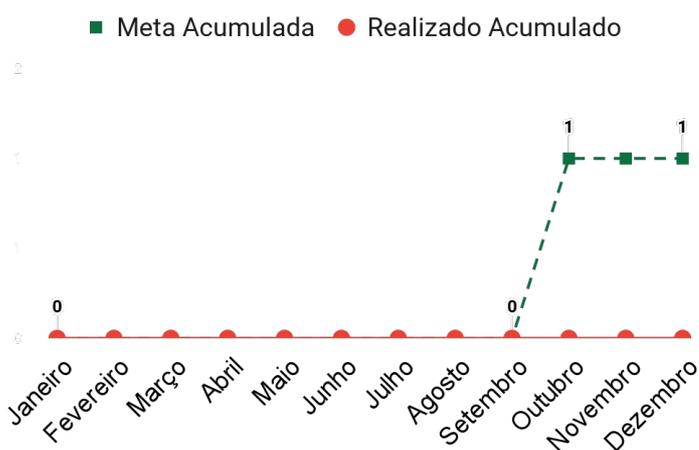

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Obra com percentual de execução financeira acumulado de 69,93%. No mês de dezembro foram executados parte das metas Captação Flutuante, Estação de Tratamento de Água, Adutora de Água Tratada 1, Reservatório Elevado de 75 m³ e Reservatório Elevado de 200 m³, através da 27ª medição. Os motivos que levaram ao atraso da entrega da obra:

1. Há um trecho da adutora composto de pedra não previsto;
2. Aguardou-se o envio de peças do Sudeste de um rompedor hidráulico;
3. Descontinuidade no fornecimento dos materiais após a pandemia.

PACTUADO

R\$ 1.710.423,16

EMPENHADO

R\$ 0,00

► Data de consulta: 20/12/2021

ENTREGA


Sistema de abastecimento de água de Quixadá ampliado

UNIDADE DE MEDIDA N°

META 1 sistema REALIZADO 1 sistema

META ALCANÇADA 100,00%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

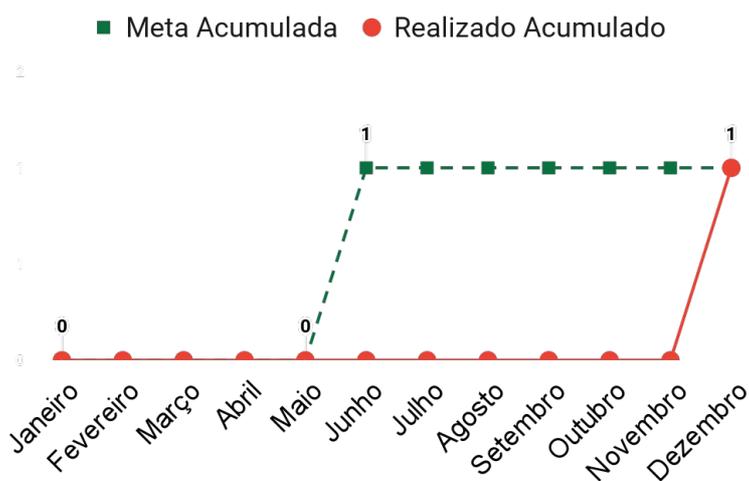

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Obra concluída fisicamente no mês de Dezembro, beneficiando 98.350 pessoas conforme população de final de plano do projeto. Termo de Recebimento Operacional assinado em 22/12/2021

PACTUADO

R\$ 5.511.100,56

EMPENHADO

R\$ 0,00

► Data de consulta: 20/12/2021

ENTREGA


Sistema de abastecimento de água de Jaibaras (Sobral) ampliado

UNIDADE DE MEDIDA N°

META 1 sistema REALIZADO 1 sistema

META ALCANÇADA 100,00%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

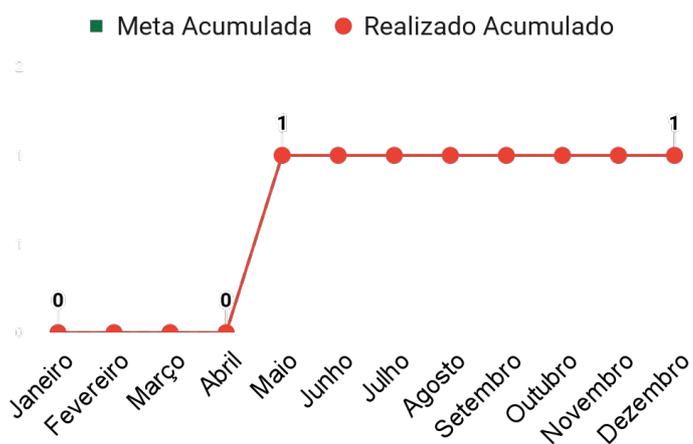

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Obra com execução física concluída, beneficiando 11.864 pessoas conforme população de final de plano do projeto.

Data do Termo de Recebimento de Obra: 27/05/2021;

Data do Termo de Recebimento Definitivo: 10/06/2021.

PACTUADO

R\$ 6.938.320,04

EMPENHADO

R\$ 1.361.296,92

► Data de consulta: 20/12/2021

ENTREGA

Sistema de abastecimento de água da sede de Tauá ampliado


UNIDADE DE MEDIDA N°

META 1 sistema

REALIZADO 0 sistema

META ALCANÇADA 0,00%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

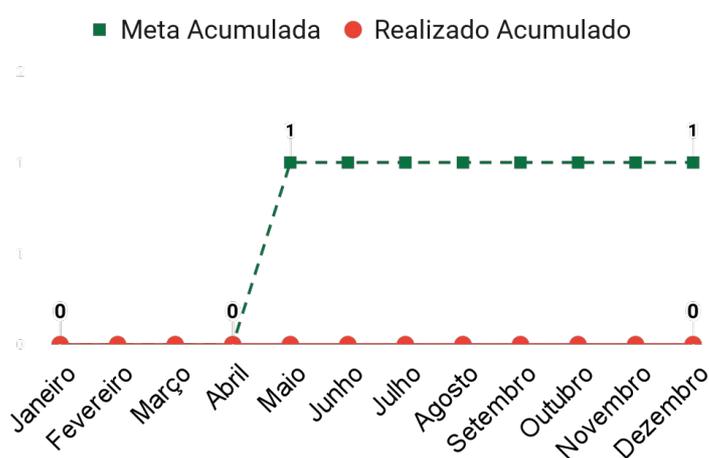

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Obra com percentual de execução financeira acumulado de 88,43%. Foi apresentada no período (dezembro) a 35ª medição, já com o valor contratual alterado devido a aprovação de aditivo de valor, o que altera o percentual de execução financeira acumulado.

Os motivos que levaram ao atraso da entrega da obra:

- 1) Necessidade de aditivo de prazo;
- 2) Desabastecimento de materiais e equipamentos que corroboram para o atraso na conclusão dos serviços;

PACTUADO

R\$ 7.166.732,41

EMPENHADO

R\$ 2.233.640,42

► Data de consulta: 20/12/2021

ENTREGA

Sistema de abastecimento de água de Russas ampliado


UNIDADE DE MEDIDA N°

META 1 sistema

REALIZADO 0 sistema

META ALCANÇADA 0,00%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

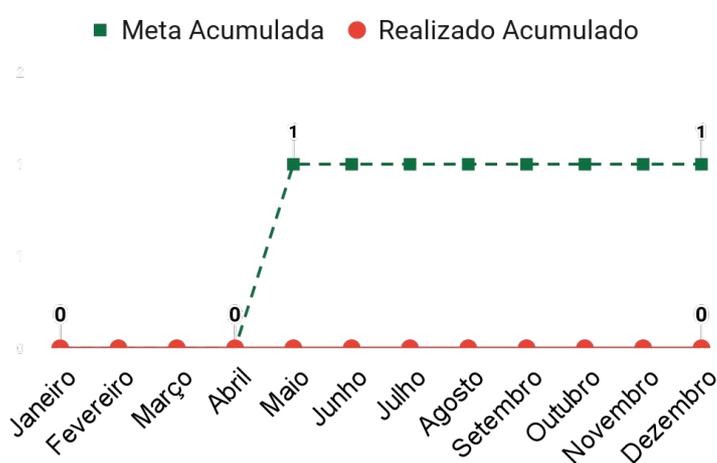

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Obra com percentual de execução financeira acumulado de 90,42%. A pendência é de emissão da medição final, mas é necessário aguardar a conclusão da licitação e execução do contrato das Travessias, para que o SAA de Russas tenha completa funcionalidade. Os motivos para não conclusão da meta em 2021:

1) Demora no processo licitatório de Russas Travessias pelo MND. Na terceira a contratação, já que as 2 anteriores licitações fracassaram, a empresa desistiu de assinar o contrato. Para agilizar a contratação da obra de Russas Travessias pelo MND a Cagece já atualizou o orçamento e está sendo realizada uma nova dispensa de licitação.

PACTUADO

R\$ 7.099.010,25

EMPENHADO

R\$ 1.391.245,60

► Data de consulta: 20/12/2021

ENTREGA


Sistema de abastecimento de água da Região Metropolitana de Fortaleza (Taquarão e adutoras) ampliado

UNIDADE DE MEDIDA N°

META 1 sistema REALIZADO 1 sistema

META ALCANÇADA 100,00%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

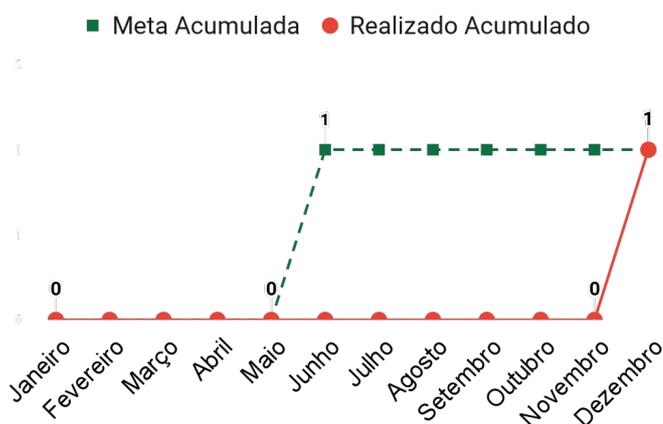

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Obra inaugurada em 31/12/2021. População beneficiada de 1.727.000 habitantes, conforme população de final de plano do projeto. Obra com percentual de execução financeira acumulado de 94,64%, última medição apresentada foi a 60ª medição no mês de Novembro. No período foram executados os serviços estação elevatória de água tratada, tubulações externas, reservatório apoiado ($v=40.000m^3$), instalações elétricas, SPDA e aterramento, automação e controle, instalação elétrica estação elevatória, interligação com o reservatório do Ancuri, entre outros serviços.

PACTUADO

R\$ 27.357.743,74

EMPENHADO

R\$ 4.922.855,03

► Data de consulta: 20/12/2021

ENTREGA


Sistema de esgotamento sanitário do Conj. Habitacional São Cristóvão (Fortaleza) ampliado

UNIDADE DE MEDIDA N°

META 1 sistema REALIZADO 1 sistema

META ALCANÇADA 100,00%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

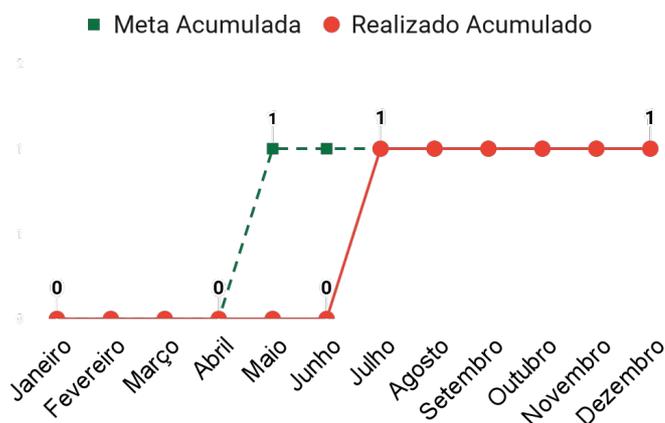

ANÁLISE DO DESEMPENHO

A obra está concluída fisicamente e financeiramente, TRO assinado, contrato encerrado e TRD assinado.

Obra com execução física concluída, beneficiando 27.153 pessoas conforme população de final de plano do projeto.

PROGRAMADO

R\$ 4.655.902,13

EMPENHADO

R\$ 1.320.413,14

► Data de consulta: 20/12/2021

ENTREGA


Sistema de esgotamento sanitário de Palmeira Comprida(Tianguá) ampliado

UNIDADE DE MEDIDA Nº

META 1 sistema REALIZADO 0 sistema

META ALCANÇADA 0,00%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

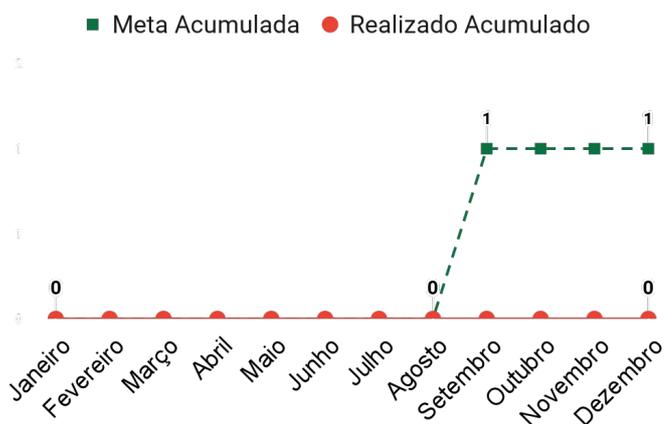

ANÁLISE DO DESEMPENHO

A obra foi reiniciada em 01/12/2021. Obra com percentual de execução financeira acumulado de 92,98%.

O atraso e conseqüentemente a não entrega da obra se deu pois foi necessário um aditivo de prazo em virtude de a empresa estar aguardando o fornecimento do desarenador. Entretanto, em 2022, a Obra teve sua execução física concluída. Com o Termo de Recebimento Operacional (TRO) emitido em 08/03/2022 e Inauguração da Obra no dia 13/05/2022.

PACTUADO

R\$ 5.050.979,77

EMPENHADO

R\$ 4.020.383,63

► Data de consulta: 20/12/2021

ENTREGA


Sistema de esgotamento sanitário de Massapé implantado

UNIDADE DE MEDIDA N°

META 1 sistema REALIZADO 1 sistema

META ALCANÇADA 100,00%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

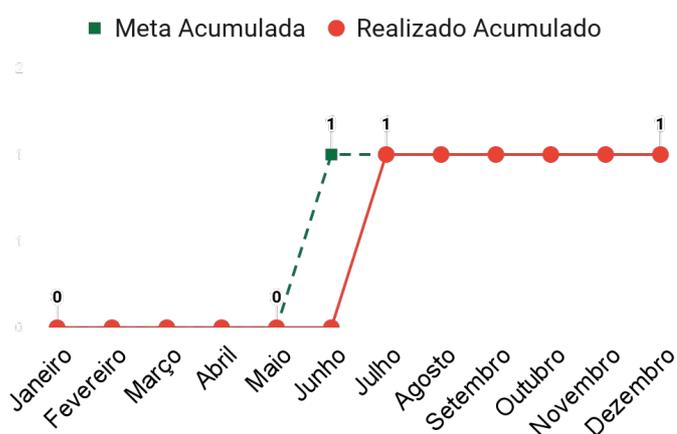

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Obra com execução física concluída, beneficiando 13.009 pessoas conforme população de final de plano do projeto.

PACTUADO

R\$ 1.363.366,87

EMPENHADO

R\$ 80.448,04

► Data de consulta: 20/12/2021

SECRETARIA DAS CIDADES

PROGRAMA 622

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL

OBJETIVO

Ampliar o acesso da população rural cearense aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.



INDICADOR

Ligações ativas das redes de abastecimento de água do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR)

POLARIDADE **QUANTO MAIOR, MELHOR**UNIDADE DE MEDIDA **Nº**ATÉ 2020 **176.870 ligações ativas**META **185.000 ligações ativas**META ALCANÇADA **124,53%***

DEFINIÇÃO

Expressa o número de ligações ativas de um sistema de abastecimento de água após a sua entrega, considerando somente as redes geridas pelo Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR).

O indicador é alterado conforme iniciativas da SCidades por meio dos Programas Águas do Sertão (PAS) e do Programa de Integração do São Francisco (PISF), da SDA e do próprio Instituto SISAR.

REALIZADO 186.994 ligações ativas

EVOLUÇÃO DO INDICADOR



ANÁLISE DO DESEMPENHO

A meta prevista para o ano de 2021 é alcançar 185.000 ligações ativas. Em 2021 foram ativadas mais 10.124 ligações, totalizando um número de 186.994 ligações, superando em 1% o previsto para o ano.

* Percentual considera apenas o realizado no ano de 2021.


ENTREGA

Sistema de abastecimento de água de Beleza (Jati) implantado

UNIDADE DE MEDIDA %

ATÉ 2020 **97,96%**META **100,00%**REALIZADO **97,96%**META ALCANÇADA **0,00%***

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

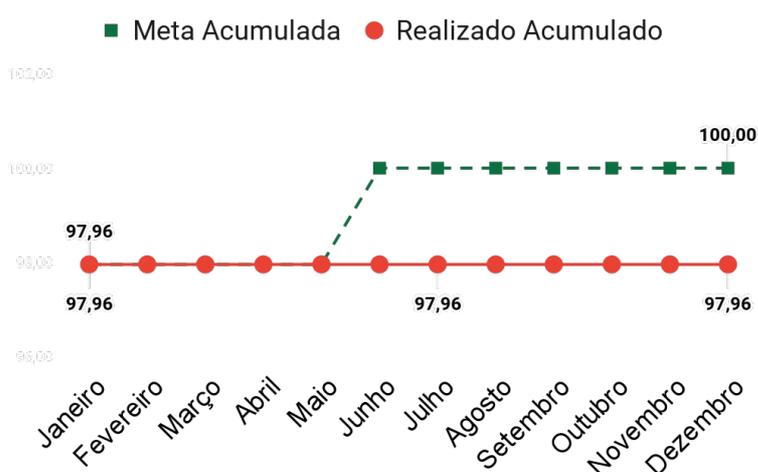

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Falta a Ampliação da rede de energia elétrica até a casa de comando da captação e da ETA até o Reservatório Elevado (REL) e ligação de energia. Falta a elaboração do orçamento por parte da ENEL, pagamento pelo PIE e posteriormente agendamento da ordem de serviço.

Obra paralisada

PACTUADO

R\$ 71.575.559,56

EMPENHADO

R\$ 6.336.727,16

► Data de consulta: **20/12/2021**

* Percentual considera apenas o realizado no ano de 2021.

ENTREGA

Sistema de abastecimento de água de Barra de Santana (Jati) implantado

UNIDADE DE MEDIDA %


ATÉ 2020 96,85%

META 100,00%

REALIZADO 100,00%

META ALCANÇADA 100,00%*

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

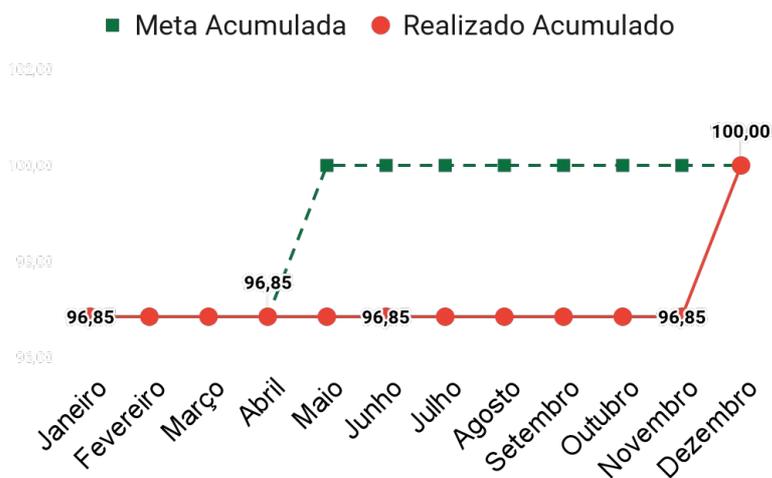

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Obra concluída no dia 27/12/2021.

PACTUADO

R\$ 71.575.559,56

EMPENHADO

R\$ 6.336.727,16

► Data de consulta: 20/12/2021

* Percentual considera apenas o realizado no ano de 2021.


ENTREGA

Sistema de abastecimento de água de Gentil (Penaforte) implantado

UNIDADE DE MEDIDA %

ATÉ 2020 **88,91%**META **100,00%**REALIZADO **95,42%**META ALCANÇADA **58,70%***

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

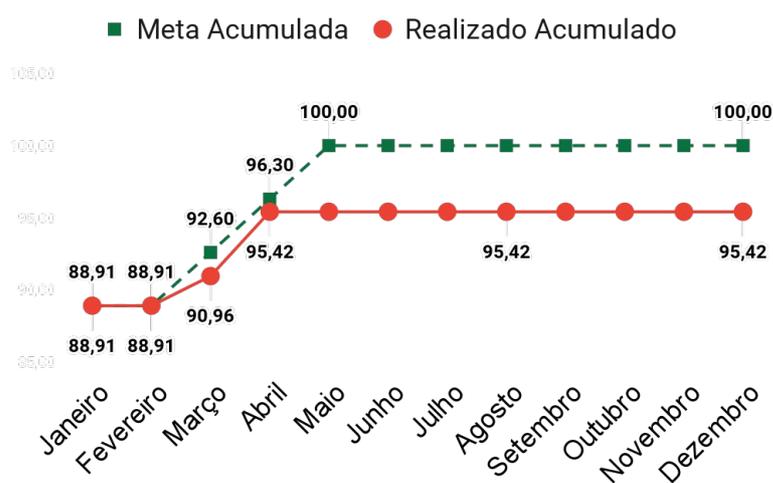

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Falta a Ampliação da rede de energia elétrica de distribuição MT 13,8 KV até a ETA/Casa de Comando e posteriormente a ligação de energia para testagem do sistema.

Obra paralisada

PACTUADO

R\$ 71.575.559,56

EMPENHADO

R\$ 6.336.727,16

► Data de consulta: **20/12/2021**

* Percentual considera apenas o realizado no ano de 2021.


ENTREGA

Sistema de abastecimento de água de Cipó (Mauriti) implantado

UNIDADE DE MEDIDA %

ATÉ 2020 **25,88%**META **100,00%**REALIZADO **94,52%**META ALCANÇADA **92,61%***

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

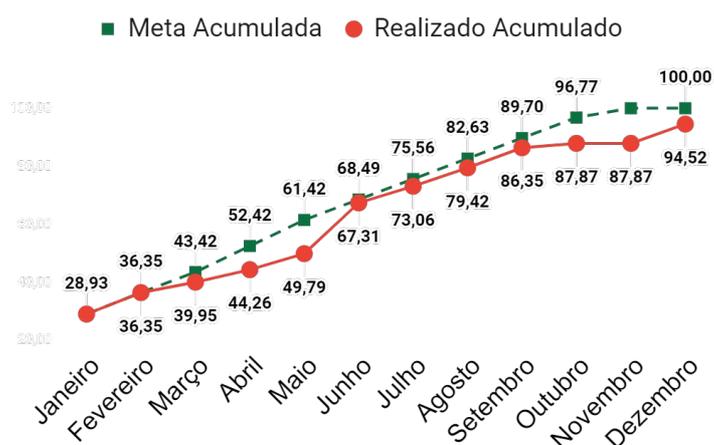

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Foi realizado o aditivo mas a obra encontra-se paralisada novamente por fatores externos. O manancial de captação do sistema de abastecimento, canal da integração, foi drenado para que se realizassem manutenções em seu curso. A entrega da obra deve ser adiada, uma vez que o maior vulto de serviços a serem prestados pela contratada, são diretamente dependentes da captação do sistema.

PACTUADO

R\$ 71.575.559,56

EMPENHADO

R\$ 6.336.727,16

► Data de consulta: **20/12/2021**

* Percentual considera apenas o realizado no ano de 2021.

ENTREGA

Sistema de abastecimento de água de Malhada (Mauriti) implantado


UNIDADE DE MEDIDA %

META 100,00%

REALIZADO 18,22%

META ALCANÇADA 18,22%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

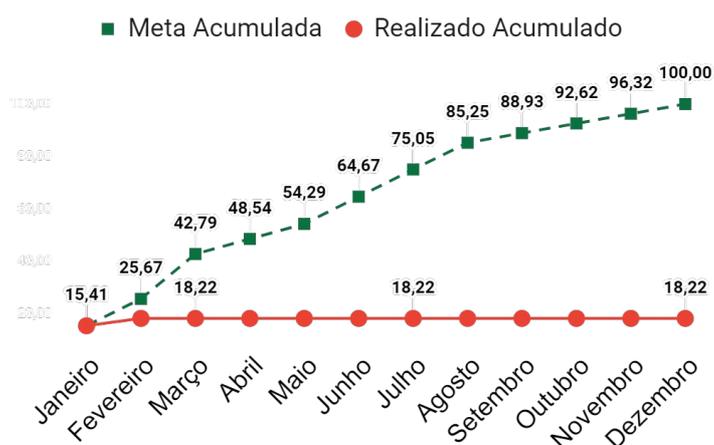

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Falta aprovação de uso de material similar (tubulações de PVC Biorientado).

Falta ampliação de rede trifásica para a área de reservação (REL e casa de química).

PACTUADO

R\$ 71.575.559,56

EMPENHADO

R\$ 6.336.727,16

► Data de consulta: 20/12/2021

SECRETARIA DAS CIDADES

PROGRAMA 722

REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS

OBJETIVO

Melhorar as condições socioambientais da população nas áreas urbanas degradadas.




INDICADOR

Áreas de risco eliminadasPOLARIDADE **QUANTO MAIOR, MELHOR**

UNIDADE DE MEDIDA %

ATÉ 2020 **87,50%**META **90,63%**REALIZADO **90,63%**META ALCANÇADA **100,00%***

EVOLUÇÃO DO INDICADOR

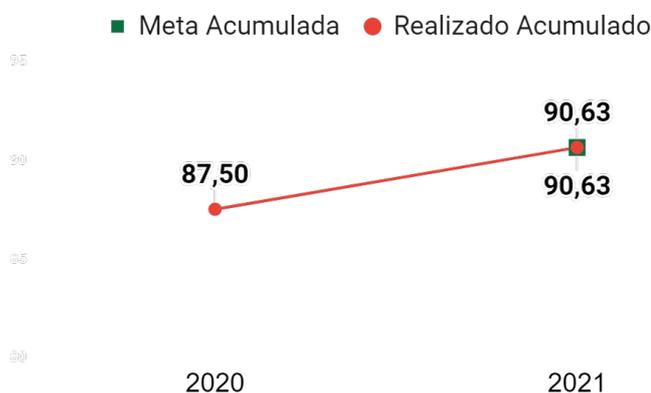

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Para 2021, ficou definido que só seria eliminada a área Belém, devido às paralisações decorrentes da pandemia e as dificuldades de desapropriação junto às famílias. A área de risco Belém foi eliminada em Agosto/21. O percentual atingiu 90,63%, restando 3 áreas a serem eliminadas: Conjunto Ceará (Maranguapinho) e Parque Santa Maria e Ocupação 24 de Setembro (Cocó) para 2022.

ENTREGA


Trecho II do Rio Maranguapinho - Margem direita urbanizada

(Av. Senador Fernandes Távora à Av. Osório de Paiva)

UNIDADE DE MEDIDA %

ATÉ 2020 **90,69%**META **100,00%**REALIZADO **99,68%**META ALCANÇADA **96,56%***

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

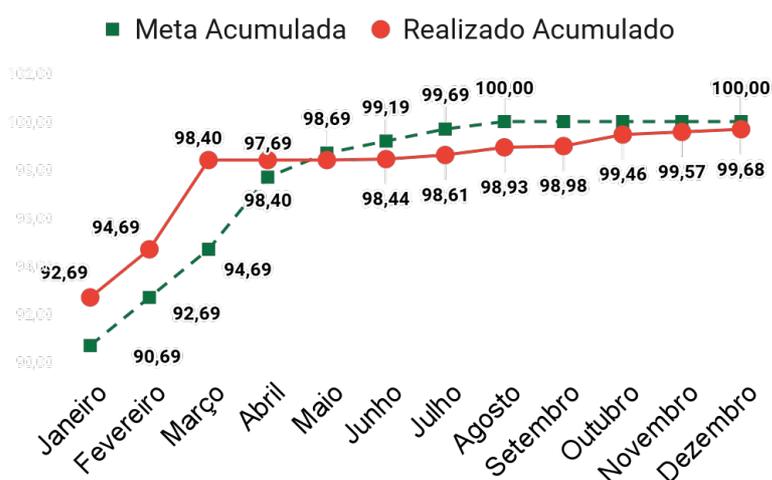

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Obra em execução, porém não foi concluída em Dez/21 como previsto, pois houve implantação de Areninhas em parceria com a Casa Civil, em áreas de praça, o que gerou necessidade de revisão dos projetos dessas praças, ocasionando alteração na planilha da obra, resultando em aditivo o que findou atrasando a execução da obra como um todo.

PACTUADO

R\$ 34.023.479,06

EMPENHADO

R\$ 22.304.555,69

▶ Data de consulta: **20/12/2021**

* Percentual considera apenas o realizado no ano de 2021.


ENTREGA

Trecho III B do Rio Maranguapinho urbanizado (Av. Jardim Fluminense ao 4º anel viário)

UNIDADE DE MEDIDA %

ATÉ 2020 **75,19%**META **100,00%**REALIZADO **97,76%**META ALCANÇADA **90,97%***

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

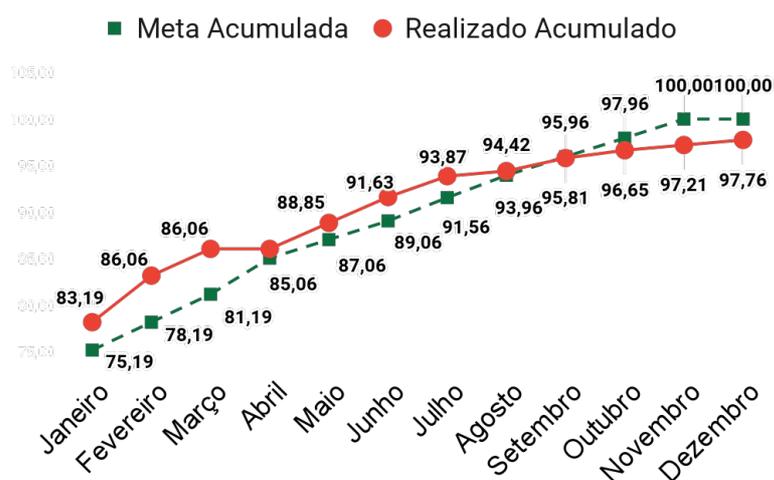

ANÁLISE DO DESEMPENHO

A obra não foi concluída em dez/21 como previsto, pois ocorreu interferência em alguns trechos, de obra de saneamento da Prefeitura, que está atrasada na execução.

PACTUADO

R\$ 34.023.479,06

EMPENHADO

R\$ 22.304.555,69

► Data de consulta: **20/12/2021**

* Percentual considera apenas o realizado no ano de 2021.


ENTREGA

Trecho II do Rio Cocó - Margem direita urbanizada (Av. Costa e Silva à Av. Paulino Rocha)

UNIDADE DE MEDIDA %

ATÉ 2020 **71,14%**META **100,00%**REALIZADO **71,14%****META ALCANÇADA **0,00%***

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

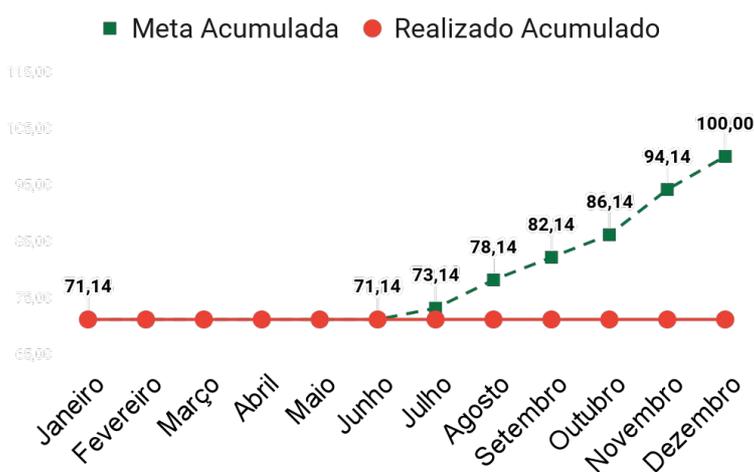

ANÁLISE DO DESEMPENHO

A SOP encaminhou para licitação juntamente com a urbanização do Rio Maranguapinho, restante do Trecho III A , e a licitação ocorreu dia 12/10/21. Ainda sem resultado final, por esse motivo a obra encontra-se paralisada. Status: PGE – Aguardando publicação no DOE aviso de resultado do julgamento da fase de habilitação desde 11.01.2022.

****** Não foi realizado nada no ano de 2021, sendo esse valor referente até 2020.

PACTUADO

R\$ 104.092.384,75

EMPENHADO

R\$ 18.824.568,43

► Data de consulta: **20/12/2021**

* Percentual considera apenas o realizado no ano de 2021.

SECRETARIA DAS CIDADES

PROGRAMA 726

RESÍDUOS SÓLIDOS

OBJETIVO

Reduzir os impactos negativos da geração e da disposição inadequada de resíduos sólidos no meio ambiente e sobre a saúde humana.



INDICADOR

Municípios com Centrais Municipais de Reciclagem (CMR)

POLARIDADE QUANTO MAIOR, MELHOR

UNIDADE DE MEDIDA %

ATÉ 2020 2,17%

META 14,13%

REALIZADO 4,34%

META ALCANÇADA 18,14%*

EVOLUÇÃO DO INDICADOR



DEFINIÇÃO

Expressa o percentual de municípios do Estado do Ceará que possui infraestrutura para a triagem, beneficiamento e tratamento preliminar de resíduos potencialmente reutilizáveis conhecidas como Central Municipal de Reciclagem (CMR) ou Central Municipal de Resíduos (CMR), no âmbito das ações em desenvolvimento pelas Secretarias estaduais de Meio Ambiente e das Cidades.

ANÁLISE DO DESEMPENHO

A Secretaria das Cidades concluiu 4 CMR no mês de dezembro nos municípios de Cariré, Forquilha, Massapê e Senador Sá. As demais CMR previstas deverão ser entregues no primeiro semestre de 2022. O principal problema na execução foi a demora do processo licitatório.

ENTREGA

Central Municipal de Reciclagem Tipo 03 - Vale do Acaraú – implantada


UNIDADE DE MEDIDA N°

META 6 CRM's

REALIZADO 4 CRM's

META ALCANÇADA 66,67%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

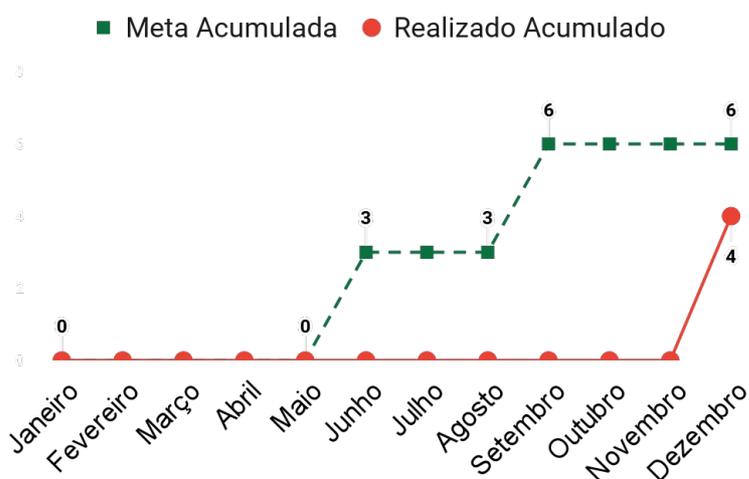

ANÁLISE DO DESEMPENHO

No mês de DEZEMBRO de 2021, foram entregues as CMR's de Cariré, Forquilha, Massapê e Senador Sá. Os 4 contratos para construção das Centrais Municipais de Reciclagem do Vale do Acaraú encontram-se em execução e até o final do mês de dezembro/2021 encontrava-se com os seguintes percentuais de avanço: Contrato 07/2021: 74,89%; Contrato 08/2021: 46,89%; Contrato 09/2021: 63,04%; e Contrato 010/2021: 69,50%.

PACTUADO

R\$ 3.434.210,24

EMPENHADO

R\$ 2.023.152,50

► Data de consulta: 20/12/2021

ENTREGA

Central Municipal de Reciclagem Tipo 03 - Vale do Jaguaribe - implantada


UNIDADE DE MEDIDA N°

META 8 CRMs

REALIZADO 0 CRMs

META ALCANÇADA 0,00%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

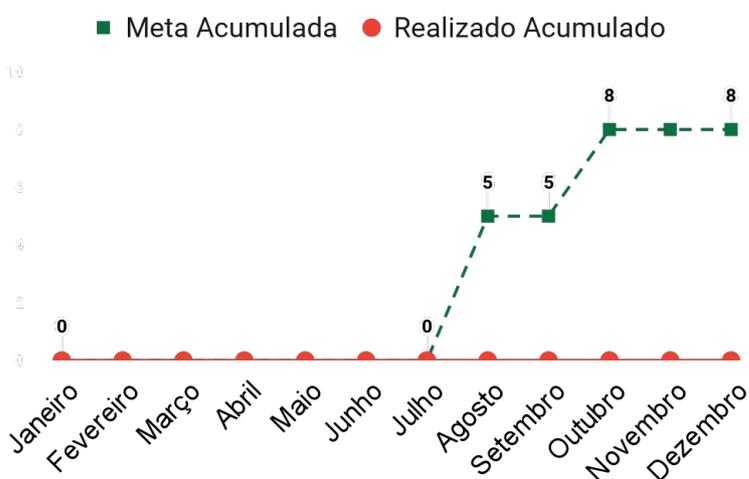

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Não foi entregue nenhuma CMR no Vale Jaguaribe em 2021. Por meio do Contrato no 021/2019 estão sendo executadas as obras de Implantação de 08 (oito) Centrais Municipais de Reciclagem - CMRs do Tipo 03 nos municípios de Alto Santo, Ererê, Iracema, Palhano, Potiretama, Quixeré, São João do Jaguaribe, e Tabuleiro do Norte. Até Dezembro de 2021, encontra-se em fase de finalização das obras das 5 CMRs que estão sendo construídas: Ererê, Iracema, Potiretama, Quixeré e São João do Jaguaribe.

PACTUADO

R\$ 4.238.132,57

EMPENHADO

R\$ 1.676.567,27

► Data de consulta: 20/12/2021

GLOSSÁRIO

SOBRE O ACORDO DE RESULTADOS

ACORDO DE RESULTADOS

Contrato firmado com as Secretarias do Estado do Ceará, contendo todos os projetos prioritários da Secretaria para o ano, além dos resultados alcançados.

BALANÇO DO ACORDO DE RESULTADOS

Documento em que se encontram os resultados dos projetos prioritários da Secretaria naquele ano, como definidos pelo seu Acordo de Resultados.

RESULTADOS

São os efeitos positivos que o Governo do Estado busca trazer à sociedade por meio de suas ações.

AValiação GERAL DO ACORDO DE RESULTADOS

Avaliação realizada ao final do ano, a qual resulta em cinco notas distintas: nota dos indicadores, nota das entregas, nota financeira, nota do monitoramento e nota da pactuação. Ao final, faz-se uma média ponderada das cinco notas, produzindo a nota geral do Acordo de Resultados. A partir da comparação entre as notas gerais de todas as Secretarias, é elaborado o [Ranking Geral dos Acordos de Resultados](#).

GLOSSÁRIO

SOBRE O ACORDO DE RESULTADOS

PLANO PLURIANUAL (PPA)

Instrumento de planejamento que estabelece, para cada região do Estado, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estadual durante um período de quatro anos. O PPA declara os compromissos do Governo do Estado com a sociedade e contribui para a execução das políticas públicas e o alcance dos seus resultados. É possível encontrar o **PPA 2020-2023** do Governo do Estado do Ceará [clikando aqui](#).

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

Define as **metas** e prioridades da administração pública estadual para cada ano, orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA, explicada abaixo), dispõe sobre a política de recursos humanos do Governo do Estado, a dívida pública estadual e quaisquer alterações aos tributos recolhidos junto à sociedade. É possível encontrar a **LDO 2021** do Governo do Estado do Ceará [clikando aqui](#).

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)

Estima as receitas e fixa as despesas do Governo do Estado para cada ano, assegurando os gastos com o serviço público, com a manutenção e o funcionamento da administração pública, com o pagamento da dívida e recursos para programas e investimentos prioritários necessários ao desenvolvimento sustentável do Estado. É possível encontrar a **LOA 2021** do Governo do Estado do Ceará [clikando aqui](#).

GLOSSÁRIO

ESTRUTURA DO ACORDO

PROGRAMA

Os Programas Governamentais fazem parte da estrutura do Plano Plurianual (PPA), organizando as ações governamentais em torno dos problemas que buscam solucionar, das demandas que pretendem atender e/ou das oportunidades que buscam criar ou aproveitar, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade cearense.

OBJETIVO

O objetivo do Programa declara o resultado que o Governo do Estado procura alcançar com a execução das políticas públicas nele reunidas.

INDICADOR

Medida que permite observar alguma informação ou fenômeno presente na realidade. No Acordo de Resultados, permite que os resultados buscados pelas Secretarias sejam definidos, acompanhados e divulgados.

ENTREGA

Representam os bens, serviços e equipamentos entregues à sociedade, por meio das ações executadas pelos órgãos do Governo do Estado.

GLOSSÁRIO

LENDO O BALANÇO

DESEMPENHO

Análise do conjunto de realizações da Secretaria. Pode se referir ao Acordo de Resultados como um todo (**Desempenho Geral**), a um Programa específico (**Desempenho por Programa**) ou aos indicadores e entregas (Desempenho dos Indicadores/Entregas do Programa).

POLARIDADE

Característica exclusiva do indicador, que sinaliza se um aumento no dado observado representa um fenômeno real desejável (“Quanto maior, melhor”) ou indesejável (“Quanto menor, melhor”).

UNIDADE DE MEDIDA

Define como estão sendo contados os resultados dos indicadores e a execução das entregas, caracterizando e complementando os dados números apresentados.

EXEMPLOS DE UNIDADE DE MEDIDA

Número Absoluto	nº
Por cento / Percentual	%
Quilômetro(s)	km
Metro(s) quadrado(s)	m ²

GLOSSÁRIO

LENDO O BALANÇO

ATÉ 2020

Valor realizado até o final do ano anterior (neste balanço, 2020), ao qual se soma o valor realizado no ano presente (neste balanço, 2021). Sinaliza a continuidade do resultado de um indicador ou da execução de uma entrega, que se iniciaram em anos anteriores e podem continuar ainda durante os próximos anos.

META

Previsão feita pela Secretaria de quais resultados espera alcançar (no caso dos indicadores) ou de quais ações pretende realizar (no caso das entregas), durante o ano de vigência do Acordo.

REALIZADO

Resultados alcançados (no caso dos indicadores) ou ações realizadas (no caso das entregas) pela Secretaria durante o ano de vigência do Acordo.

%

META

Cálculo em que confere o quanto da meta pactuada pelos órgãos estaduais foi alcançada no ano. No caso dos indicadores, a polaridade define como é feito o cálculo:

QUANTO MAIOR, MELHOR

$$\frac{(\text{REALIZADO} - \text{ANOS ANTERIORES})}{(\text{META} - \text{ANOS ANTERIORES})} \times 100$$

QUANTO MENOR, MELHOR

$$1 - \left(\frac{(\text{REALIZADO} - \text{ANOS ANTERIORES})}{(\text{META} - \text{ANOS ANTERIORES})} \right) \times 100$$

GLOSSÁRIO

ANÁLISE FINANCEIRA

PACTUADO

Previsão feita pelo Governo do Estado para a execução dos projetos prioritários presentes nos Acordos de Resultados, constante no Anexo II, “Recursos Financeiros”. As partes que assinam o Acordo se comprometem a disponibilizar as quantias previstas (ou quantias superiores) para o alcance das metas pactuadas.

EMPENHADO

Quantia reservada pelo Governo do Estado para o pagamento de bens e serviços necessários para a realização das entregas. O pagamento dos valores empenhados é efetivado quando se entregam os bens ou se concluem os serviços contratados.



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO
