



Implantação das novas rotinas de acompanhamento e monitoramento de projetos



Contextualização

- Diagnóstico da situação da rede de planejamento;
- Proposta de estruturação da rede de planejamento;
- Definição da metodologia de monitoramento;
- Definição da metodologia de gerenciamento dos projetos – consultoria FGV.




Acompanhamento e Monitoramento

- O **acompanhamento** é o **registro das informações** referentes à evolução do projeto de forma a servir como base de dados para o monitoramento.
- O **monitoramento**, por sua vez, é um processo de identificação de fragilidades e dificuldades na execução de um projeto, corrigindo o seu rumo, no intuito de que se realize, visando sempre a obtenção de resultados efetivos.




Monitoramento dos Projetos

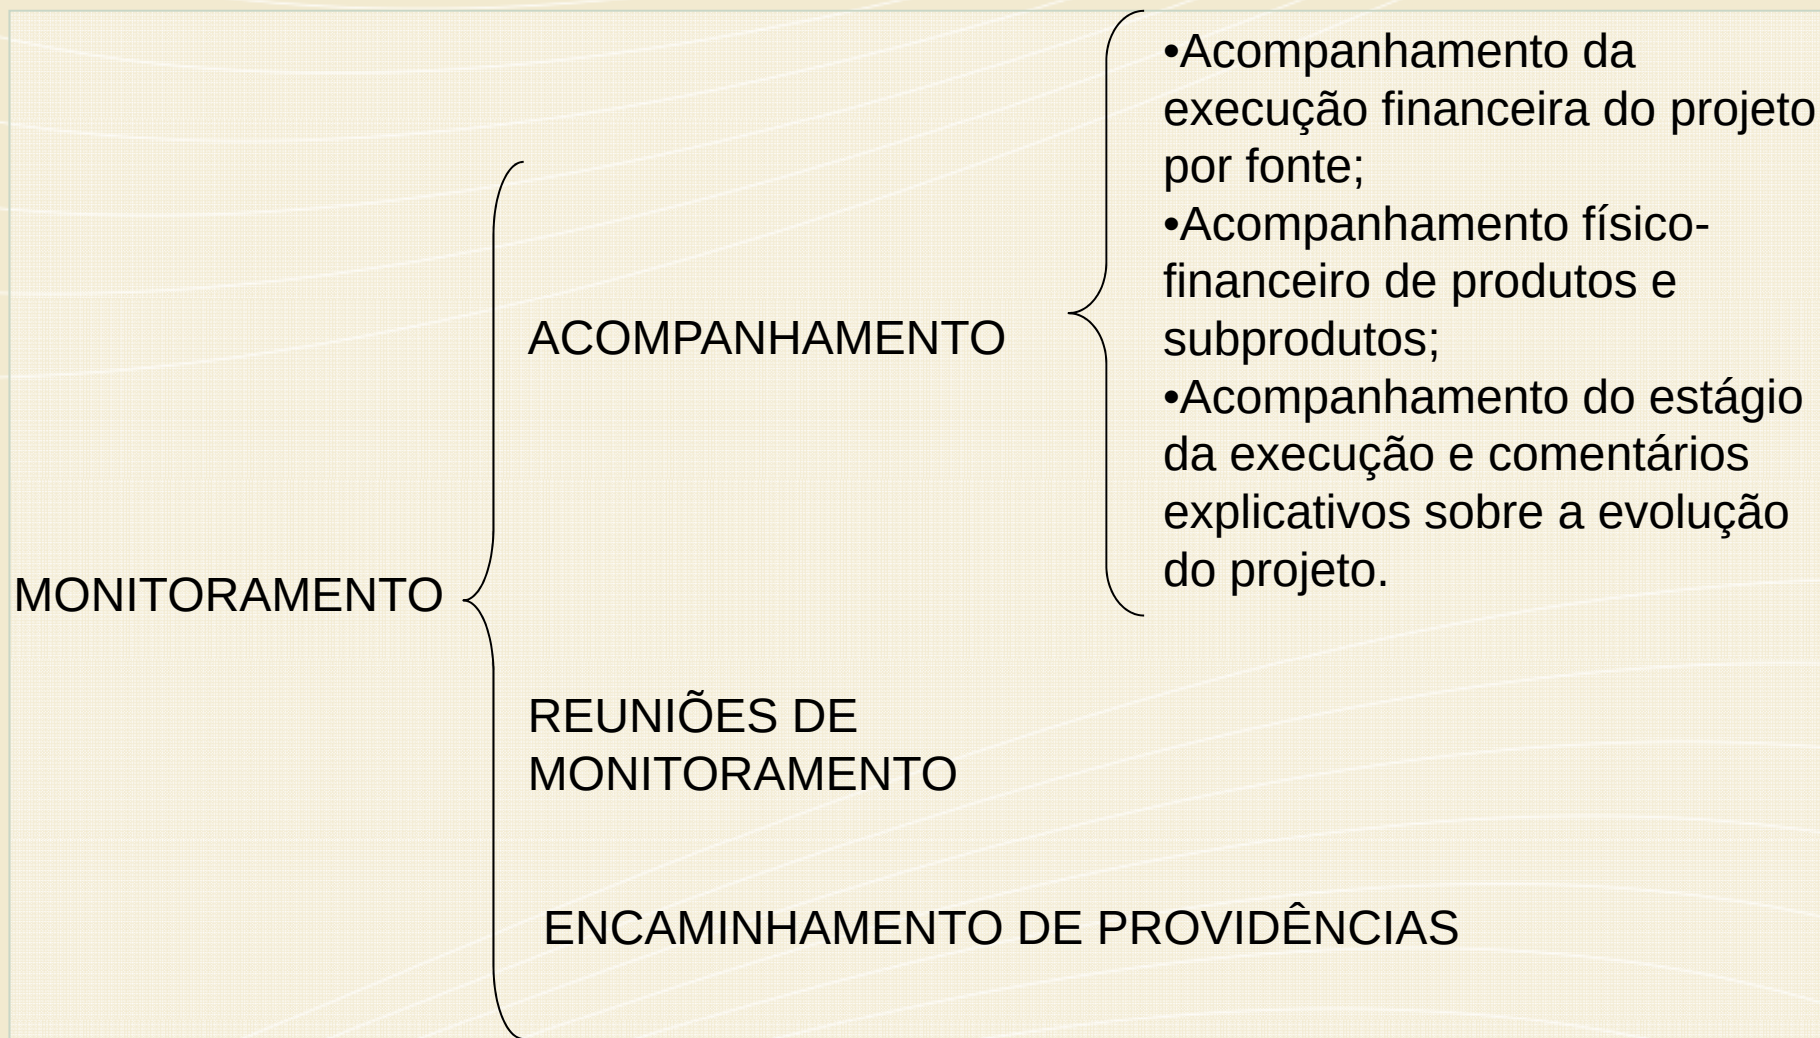



Fluxograma de Monitoramento

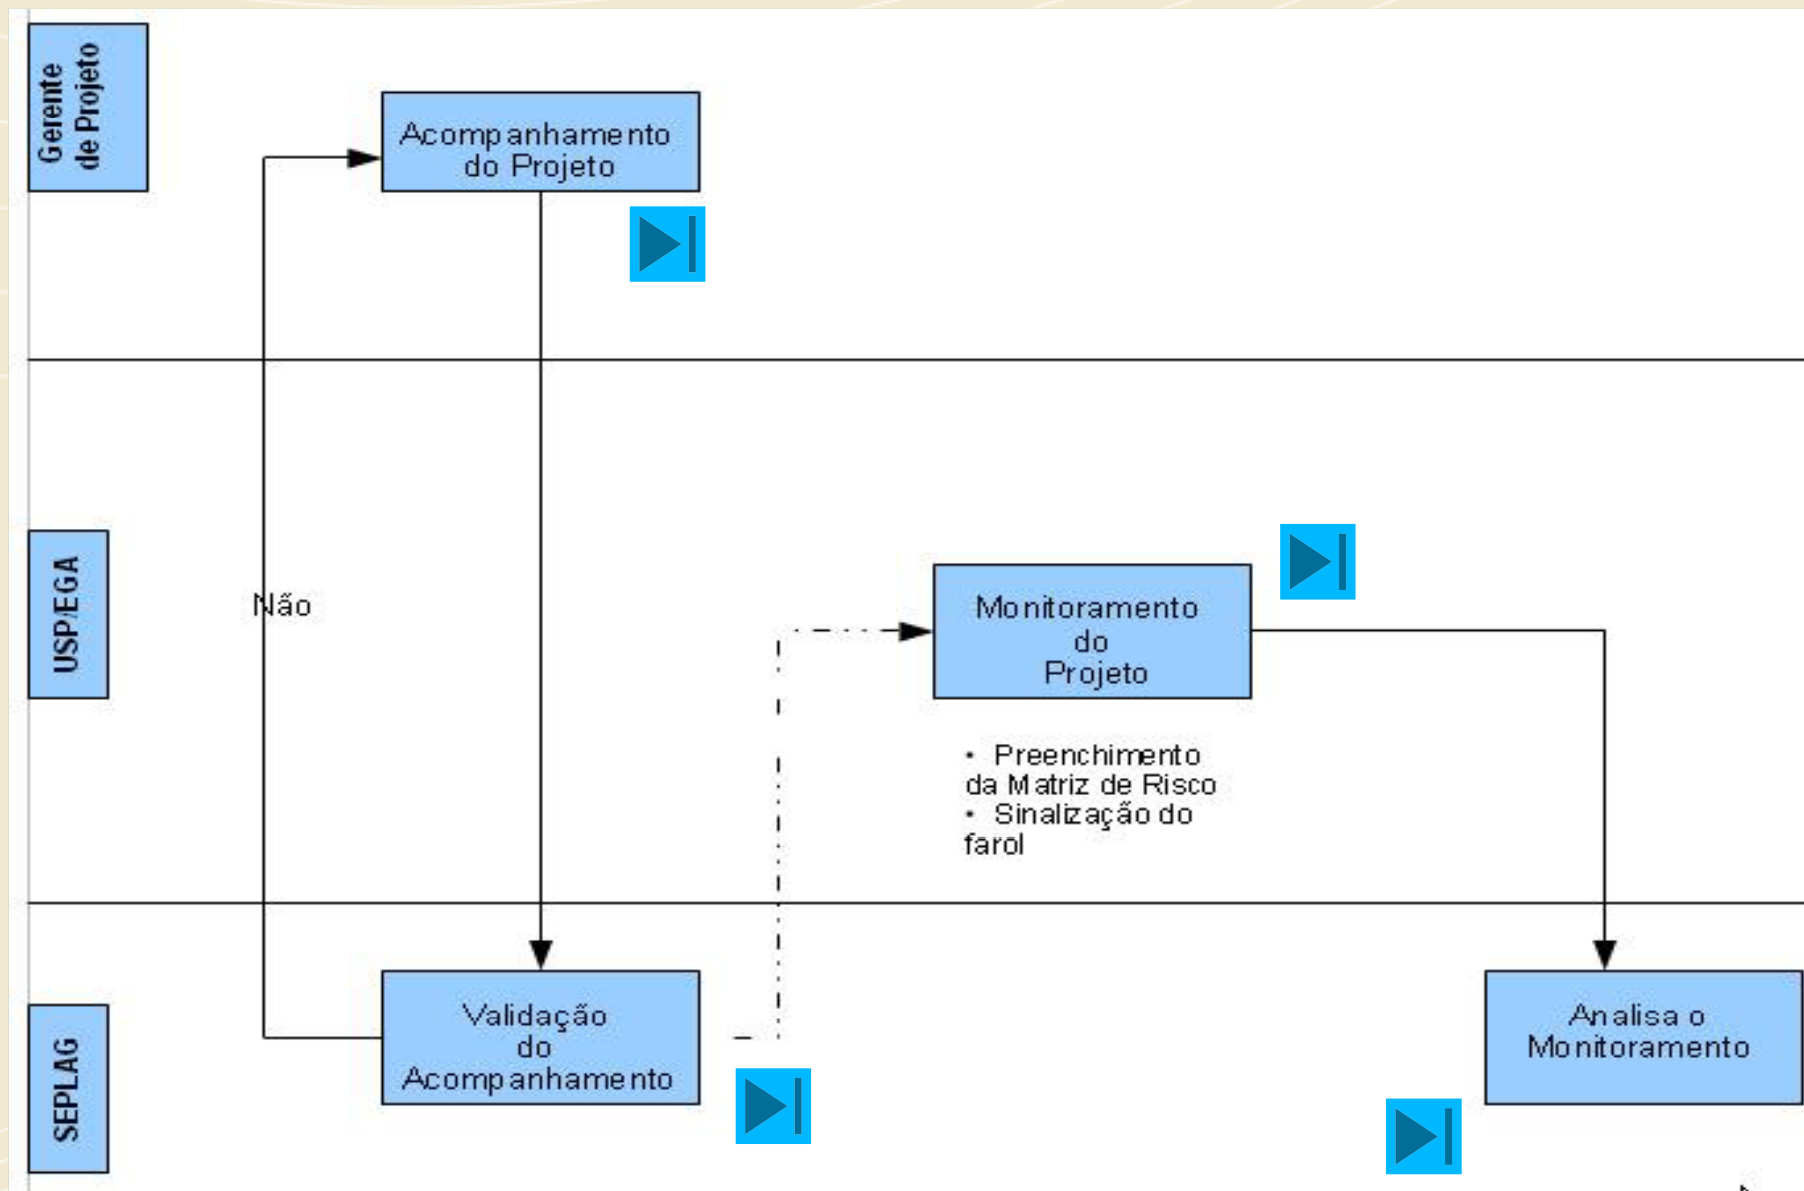



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
*Secretaria do Planejamento
e Gestão*

Painel de controle

WebMapp - Consultas - Windows Internet Explorer

http://172.26.0.38:8083/homologamapp2009/MappConsulta/Paginas/ConsultaDinamica.aspx

WebMapp - Consultas

MARCOS MEDEIROS DE VASCONCELLOS
Gestores do Mapp (1 usuários online)

Planejamento Acompanhamento Monitoria Estágio de Execução Mapp Limite Mapp Consulta GPR Sair

Consulta: 07-Programação e Execução Financeira Anual por Projeto (Mapp Virtual)

Secretaria: Todas as Secretarias

Mapp: Todos os Mapps

Estágio: Todos os Estágios

Ano: ☐ 2007 ☐ 2008 ☒ 2009 ☐ 2010

Fonte: Outros, 00, 07, 10, 11, 19, 21, 22, 23, 24, 40, 44, 45, 48, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 70, 71, 72, 75, 80, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 [Ver/Alterar Fontes](#)

Filtro:

	Total Programado	Total Empenhado	%
	5.023.289.967,09	1.406.287.100,96	28,00%

Programação e Execução Financeira Anual por Projeto (Mapp Virtual)

Secretaria	Descrição	Estágio	Programado	Empenhado	%	F/F	Fa
SEINFRA	IMPLANTAÇÃO DA METRÔ DE FORTALEZA	-DETALHAR	445.297.921,99	86.122.974,19	19,32%		
SEINFRA	IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM	-DETALHAR	219.190.780,80	46.234.395,65	21,05%		
SEINFRA	69 - Programa Luz para Todos com 30.698 em 2008 e mais 52.000 em 2009/2010	EM EXECUÇÃO	205.500.000,00	125.250.959,81	60,94%		
SETUR	13 - Aquisição de Terreno e Construção do Pavilhão de Feiras do Ceará	EM EXECUÇÃO	150.624.273,83	42.447.530,47	28,18%		
SRH	Construção do eixo de integração	-DETALHAR	136.837.062,52	18.181.697,89	13,28%		
SSPDS	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESASTRES CAUSADOS PELAS ENCHENTES	-DETALHAR	116.900.000,00	62.285.285,52	53,28%		
SEDUC	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ	-DETALHAR	107.091.683,12	0,00	0,00%		
SCIDADES	OBRAS DO PROGRAMA SANEAR II EM DEMAIS MUNICÍPIOS DO CEARÁ	-DETALHAR	94.723.818,32	23.228.006,73	24,52%		
SCIDADES	1 - PAC MC MARANGUAPINHO - Elaboração de Projeto e Construção de 9214 habitações em Fortaleza, 100 em Maranguape e 108 em Maracanaú	EM EXECUÇÃO	81.752.523,17	14.894.811,54	18,21%		
SCIDADES	OBRAS DO PROGRAMA SANEAR II EM FORTALEZA	-DETALHAR	81.546.921,75	7.380.941,42	9,05%		
CASA CIVIL	1 - Publicidade na Mídia	EM EXECUÇÃO	69.110.774,00	48.352.275,22	69,96%		
SDA	Programa Garantia Safra	-DETALHAR	49.500.000,00	42.508.855,24	85,87%		
DER	132 - Conservação Rotineira das Rodovias Pavimentadas e Não Pavimentadas do Estado do Ceará	EM EXECUÇÃO	47.480.827,57	25.207.039,62	53,08%		
SESA	IMPLANTAÇÃO DAS POLICLÍNICAS DO ESTADO DO CEARÁ	-DETALHAR	46.844.979,86	13.690.649,53	29,22%		
SESA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA (HGF)	-DETALHAR	43.610.328,88	28.034.764,23	64,28%		
SEFAZ	5 - AUTOMAÇÃO da FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIA EM TRÂNSITO	ATIVIDADES PREPARATÓRIAS	41.920.661,28	12.381.266,32	29,53%		
SETUR	56 - Duplicação da CE 040 no Trecho Iguape - Cascavel - Beberibe	EM EXECUÇÃO	40.540.202,84	11.109.305,94	27,40%		
SETUR	38 - PRODETUR II BID/BNB Construção de 228 Km de estrada para complementação da Rodovia Estruturante CE 085 - 05 trechos	EM EXECUÇÃO	38.799.273,84	3.989.858,16	10,28%		
SRH	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	-DETALHAR	37.272.077,81	3.909.746,76	10,48%		
SCIDADES	3 - PAC FGTS Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Cocó - PROMURB COCÓ - Barragem, dragagem, urbanização e 1.250 unidades habitacionais.	EM LICITAÇÃO	37.180.000,00	10.551.846,60	28,38%		
SCIDADES	5 - Construção de 5000 Unidades Habitacionais em Parceria com Municípios através da Resolução 460 e PSH	EM EXECUÇÃO	35.100.695,57	2.892.782,58	8,24%		
SCIDADES	2 - PAC - Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Maranguapinho - PROMURB MARANGUAPINHO - Barragem, dragagem e urbanização	EM EXECUÇÃO	34.087.920,13	463.890,50	1,36%		
SEDUC	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE ENSINO MÉDIO	-DETALHAR	34.072.901,75	237.364,78	0,69%		
DER	336 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO CEARÁ (PROESTRADAS)	EM EXECUÇÃO	34.019.816,16	4.362.095,31	12,82%		
SRH	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS	-DETALHAR	31.693.438,54	0,00	0,00%		

Intranet local 100%

Iniciar Google Talk gmail.com Monitoramento dos p... Acesso a Sistemas WebMapp - Consulta... PT 17:06



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
*Secretaria do Planejamento
e Gestão*

Agenda dos treinamentos

Agenda dos treinamentos

Reunião com as setoriais para apresentar as novas rotinas de acompanhamento e monitoramento de projetos

Público-alvo: Coordenadores de planejamento e articuladores

Data: 15 e 16 de outubro

Horário : 9 às 11 h

Treinamento com os técnicos das setoriais

Público-alvo: técnicos com conhecimentos sobre SIAP e Webmapp

Período: 21 a 28/10

Horário: 8:30 às 11:30h (manhã) e 13:30 às 16:30h (tarde)



Agenda dos treinamentos

Os participantes dos treinamentos deverão comparecer ao auditório da SOHIDRA – 1º andar, nos dias indicados abaixo:

21/10(manhã) - GG, GVG, CC, CM,SECON, PGE, SEPLAG e SEFAZ

22/10(manhã) - SEINFRA, CIDADES, SRH e CONPAM

23/10(manhã) - DPGE, SSPDS, SEJUS e SESA

27/10(tarde) - SETUR, SDA, CEDE, STDS e SESPORTE

28/10 (tarde) - SEDUC, SECULT, SECITECE e CEE



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
*Secretaria do Planejamento
e Gestão*

***Obrigado pela
Atenção.***

WebMapp - Consultas - Windows Internet Explorer

http://172.26.0.38:8083/homologamapp2009/MappConsulta/Paginas/ConsultaDinamica.aspx

WebMapp - Consultas

MARCOS MEDEIROS DE VASCONCELLOS
Gestores do Mapp (1 usuários online)

Planejamento Acompanhamento Monitoria Estágio de Execução Mapp Limite Mapp Consulta GPR Sair

Consulta: 07-Programação e Execução Financeira Anual por Projeto (Mapp Virtual)

Secretaria: Todas as Secretarias

Mapp: Todos os Mapps

Estágio: Todos os Estágios

Ano: ☐ 2007 ☐ 2008 ☒ 2009 ☐ 2010

Fonte: Outros, 00, 07, 10, 11, 19, 21, 22, 23, 24, 40, 44, 45, 48, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 70, 71, 72, 75, 80, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 [Ver/Alterar Fontes](#)

Filtro: Consultar Relatório

Total Programado	Total Empenhado	%
5.023.289.967,09	1.406.287.100,96	28,00%

Programação e Execução Financeira Anual por Projeto

Secretaria	Projeto	Programado	Empenhado	%	F/F	Farol
SEINFRA	IMPLANTAÇÃO DA METRÔ DE FORTALEZA	445.297.921,99	86.122.974,19	19,34%		
SEINFRA	IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PO	219.190.780,80	48.234.395,65	21,09%		
SEINFRA	69 - Programa Luz para Todos com 30.898 em 20	205.500.000,00	125.250.959,81	60,94%		
SETUR	13 - Aquisição de Terreno e Construção do Pavil	150.624.273,83	42.447.530,47	28,18%		
SRH	Construção do eixo de integração	138.837.062,52	18.181.697,89	13,26%		
SSPDS	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P	116.900.000,00	62.285.285,52	53,28%		
SEDUC	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PR	107.091.683,12	0,00	0,00%		
SCIDADES	OBRAS DO PROGRAMA SANEAR II EM DEMAIS I	94.723.818,32	23.228.006,73	24,52%		
SCIDADES	1 - PAC MC MARANGUAPINHO - Elaboração de P	81.752.523,17	14.894.811,54	18,21%		
SCIDADES	OBRAS DO PROGRAMA SANEAR II EM FORTALE	81.546.921,75	7.380.941,42	9,05%		
CASA CIVIL	1 - Publicidade na Mídia	69.110.774,00	48.352.275,22	69,96%		
SDA	Programa Garantia Safra	49.500.000,00	42.508.855,24	85,87%		
DER	132 - Conservação Rotineira das Rodovias Pavim	47.480.827,57	25.207.039,62	53,08%		
SESA	IMPLANTAÇÃO DAS POLICLÍNICAS DO ESTADO DO CEARÁ	46.844.979,86	13.690.649,53	29,22%		
SESA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA (HGF)	43.610.328,88	28.034.764,23	64,26%		
SEFAZ	5 - AUTOMAÇÃO da FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIA EM TRÂNSITO	41.920.661,28	12.381.266,32	29,53%		
SETUR	56 - Duplicação da CE 040 no Trecho Iguaúpe - Cascavel - Beberibe	40.540.202,84	11.109.305,94	27,40%		
SETUR	38 - PRODETUR II BID/BNB Construção de 228 Km de estrada para complementação da Rodovia Estruturante CE 085 - 05 trechos	38.799.273,84	3.989.858,16	10,28%		
SRH	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	37.272.077,81	3.909.746,76	10,48%		
SCIDADES	3 - PAC FGTS Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Cocó - PROMURB COCÓ - Barragem, dragagem, urbanização e 1.250 unidades habitacionais.	37.180.000,00	10.551.848,60	28,38%		
SCIDADES	5 - Construção de 5000 Unidades Habitacionais em Parceria com Municípios através da Resolução 460 e PSH	35.100.695,57	2.892.782,58	8,24%		
SCIDADES	2 - PAC - Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Maranguapinho - PROMURB MARANGUAPINHO - Barragem, dragagem e urbanização	34.087.920,13	483.890,50	1,36%		
SEDUC	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE ENSINO MÉDIO	34.072.901,75	237.364,78	0,69%		
DER	336 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO CEARÁ (PROESTRADAS)	34.019.816,16	4.362.095,31	12,82%		
SRH	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS	31.693.438,54	0,00	0,00%		

HISTÓRICO DE ACOMPANHAMENTOS

Mapp : 69 - Programa Luz para Todos com 30.898 em 2008 e mais 52.000 em 2009/2010

Estágio	Data	Observação
EM EXECUÇÃO	24/09/2009	Para 2009, estão previstas 31.086 ligações, das quais foram realizadas no 1º quadrimestre 7.837 ligações da cota do Governo Federal. Da contrapartida do Governo Estadual de 2008, recebemos 1.543 ligações em 30 de julho do corrente de 3.000 previstas até 30 de novembro. O Governo do Estado repassou em 2008, R\$ 12.474.000,00 do total de R\$ 18.400.000,00 previstos no convênio. Para encerrar o Programa ainda serão realizadas 53.124 ligações a serem iniciadas em 2009 e concluídas em dezembro de 2010, das quais o Governo do Estado realizará sua contrapartida de 5.312, a um custo unitário por ligação de R\$ 8.520,00 orçado pela Eletrobrás, totalizando R\$ 45.258.240,00.
EM EXECUÇÃO	26/08/2009	Para 2009, estão previstas 31.086 ligações, das quais foram realizadas no 1º quadrimestre 7.837 ligações da cota do Governo Federal. Da contrapartida do Governo Estadual de 2008, recebemos 1.543 ligações em 30 de julho do corrente de 3.000 previstas até 30 de novembro. O Governo do Estado repassou em 2008, R\$ 12.474.000,00 do total de R\$ 18.400.000,00 previstos no convênio. Para encerrar o Programa ainda serão realizadas 53.124 ligações a serem iniciadas em 2009 e concluídas em dezembro de 2010, das quais o Governo do Estado realizará sua contrapartida de 5.312, a um custo unitário por ligação de R\$ 8.520,00 orçado pela Eletrobrás, totalizando R\$ 45.258.240,00.

Fechar

Concluído

Intranet local 100%

17:09

WebMapp - Consultas - Windows Internet Explorer

http://172.26.0.38:8083/homologamapp2009/MappConsulta/Paginas/ConsultaDinamica.aspx

WebMapp - Consultas

MARCOS MEDEIROS DE VASCONCELLOS
Gestores do Mapp (1 usuários online)

Planejamento Acompanhamento Monitoria Estágio de Execução Mapp Limite Mapp Consulta GPR Sair

Consulta: 07-Programação e Execução Financeira Anual por Projeto (Mapp Virtual)
Secretaria: Todas as Secretarias
Mapp: Todos os Mapps
Estágio: Todos os Estágios
Ano: ☐ 2007 ☐ 2008 ☒ 2009 ☐ 2010
Fonte: Outros, 00, 07, 10, 11, 12

Ordenar por Código

Filtro:

Programação e Execução Financeira

PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA (Mapp Virtual)

Mapp Virtual: IMPLANTAÇÃO DA METRÔ DE FORTALEZA

Anos: ☐ 2007 ☐ 2008 ☒ 2009 ☐ 2010 (Ocultar Municípios) (Ocultar Subprodutos)

Secretaria	Produto/Subproduto	Município	Unidade	Qtd Prevista	Qtd Realizada	%	Valor Programado	Valor Empenhado	%
SEINFRA	IMPLANTAÇÃO DA METRÔ	FORTALEZA	und	0,0	0,0	0,00%	310.220.053,43	46.903.673,20	15,11%
SEINFRA	IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-
SEINFRA	69 - Programa Luz para Todos	-	-	-	-	-	-	-	-
SETUR	13 - Aquisição de Terreno	-	km	3,7	0,0	0,00%	108.126.732,59	17.722.146,98	16,39%
SRH	Construção do eixo de Integração	-	und	0,0	0,0	0,00%	39.269.116,04	0,00	0,00%
SSPDS	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	-	und	283,0	0,0	0,00%	946.755,23	466.065,39	49,22%
SEDUC	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS	-	und	0,0	0,0	0,00%	12.196.102,02	4.980.470,84	40,83%
SCIDADES	OBRAS DO PROGRAMA SANEAMENTO	-	km	0,4	0,0	0,00%	76.451.083,08	14.263.080,73	18,65%
SCIDADES	1 - PAC MC MARANGUAPINHO	-	und	0,0	0,0	0,00%	40.075.847,75	0,00	0,00%
CASA CIVIL	1 - Publicidade na Mídia	-	km	0,3	0,0	0,00%	28.803.872,88	9.471.909,26	32,88%
SDA	Programa Garantia Safrá	-	und	0,0	0,0	0,00%	4.350.543,84	0,00	0,00%
DER	132 - Conservação Rotineira	-	-	-	-	-	-	-	-
SESA	IMPLANTAÇÃO DAS POLÍCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
SESA	REFORMA E AMPLIAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
SEFAZ	5 - AUTOMAÇÃO da FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
SETUR	56 - Duplicação da CE 040 no Trecho Iguaçu - Cascavel - Bebenide	-	-	-	-	-	-	-	-
SETUR	38 - PRODETUR II BID/BNB Construção de 228 Km de estrada para complementação da Rodovia Estruturante CE 085 - 05 trechos	-	-	-	-	-	-	-	-
SRH	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	-	-	-	-	-	-	-	-
SCIDADES	3 - PAC FGTS Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Cocó - PROMURB COCÓ - Barragem, dragagem, urbanização e 1.250 unidades habitacionais.	-	-	-	-	-	-	-	-
SCIDADES	5 - Construção de 5000 Unidades Habitacionais em Parceria com Municípios através da Resolução 460 e PSH	-	-	-	-	-	-	-	-
SCIDADES	2 - PAC - Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Maranguapinho - PROMURB MARANGUAPINHO - Barragem, dragagem e urbanização	-	-	-	-	-	-	-	-
SEDUC	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-	-
DER	336 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO CEARÁ (PROESTRADAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
SRH	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS	-	-	-	-	-	-	-	-

Fechar

javascript:__doPostBack('ctl00\$phConteudo\$consultaMappVirtual\$execucaoFisicoFinanceiraDoAnoMappVirtual\$linkMostrarOcultarSubprod')

Intranet local 100%

17:08



Projeto: 1 - Ampliação do Complexo Portuário do Pecém - Terminal de Múltiplo Uso - TMUT

Ameaça ou problema	Providências	Responsável	Data para Resolução	Classificação do Risco	Status	Acompanhamento da providência
Demora na liberação da licença ambiental pelo IBAMA	Acompanhar o processo	Luiz Hernani	15/10/2008	Baixa	Concluído	Licença emitida em 17/11/2009





Rotina de acompanhamento do projeto

Acompanhamentos dos Estágios de Execução - Windows Internet Explorer

http://172.26.0.38/siap2009homologacao/Paginas/plan.cd.mapp.acomp_fin.aspx?isn_projeto&rid=0

SEPLAG - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
MARCOS MEDEIROS DE VASCONCELOS 12 usuários

Movimentos Relatórios Consultas/Manutenção Administração Análises Ferramentas Sair

Principal :: Listagem de MAPPs para Acompanhamento :: Listagem de Acompanhamentos do Projeto MAPP

Detalhes:

Secretaria: 43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES
Orgão: 43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES
Programa: 711 - Saneamento Ambiental do Ceará
MAPP: 38 - FUNASA - Conclusão da Obra de Usina de Triagem e Beneficiamento em Maracanaú
Valor Total: 540.369,34
Status: Aprovado
Data Início: 01/01/2004
Data Fim: 31/12/2009
Data Aprovação:
Responsável: EDMUNDO OLINDA FILHO
Objetivo: Construção e aparelhagem da Usina de Triagem e beneficiamento de recicláveis em Maracanaú
Justificativa: Aumento do Bem-Estar Social: fornecer à sociedade local para tratamento adequado de resíduos sólidos. Ação que impacta na redução de doenças e dos níveis de poluição causados pelo descarte inadequado dos resíduos sólidos.
Observação: Aguardando assinatura do termo de aditivo pela FUNASA Casa Civil/GABGOV em 21.02.08
Detalhamento Físico Mapp:
Prioridade: Baixa

Data:
Estágio: EM EXECUÇÃO Gravar Estágio

Listagem

© 2009 SEPLAG - Todos os direitos reservados SEPLAG

Intranet local 100%

Iniciar Google Talk gmail.com Monitoramento dos p... Acesso a Sistemas ... Acompanhamentos d... PT 16:37

Acompanhamentos dos Estágios de Execução - Windows Internet Explorer

http://172.26.0.38/siap2009homologacao/Paginas/plan.cd.mapp.acomp_fin.aspx?isn_projeto&rid=0

Acompanhamentos dos Estágios de Execução

ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS

Movimentos Relatórios Consultas/Manutenção Administração Análises Ferramentas Sair

Principal :: Listagem de MAPPs para Acompanhamento :: Listagem de Acompanhamentos do Projeto MAPP

Detalhes:

Secretaria: 43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES
Orgão: 43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES
Programa: 711 - Saneamento Ambiental do Ceará
MAPP: 38 - FUNASA - Conclusão da Obra de Usina de Triagem e Beneficiamento em Maracanaú
Valor Total: 540.369,34
Status: Aprovado
Data Início: 01/01/2004
Data Fim: 31/12/2009
Data Aprovação:
Responsável: EDMUNDO OLINDA FILHO
Objetivo: Construção e aparelhagem da Usina de Triagem e beneficiamento de recicláveis em Maracanaú
Justificativa: Aumento do Bem-Estar Social: fornecer à sociedade local para tratamento adequado de resíduos sólidos. Ação que impacta na redução de doenças e dos níveis de poluição causados pelo descarte inadequado dos resíduos sólidos.
Observação: Aguardando assinatura do termo de aditivo pela FUNASA Casa Civil/GABGOV em 21.02.08
Detalhamento Físico Mapp:
Prioridade: Baixa

Data: 25/09/2009
Estágio: EM EXECUÇÃO

VER FINANCIADORES

DATAS DO PROJETO

Datas	Programada	Revisada
Início	01/12/2008	02/02/2009
Término	31/12/2008	02/01/2010

PRODUTOS / MUNICÍPIOS

	Produto	Unid.	Município	Prog 2007	Real 2007	Prog 2008	Real 2008	Prog 2009	Real 2009	Tipo	Prog 2010	Real 2010	Tipo Beneficiário	Qtde Beneficiário	
Subprodutos	116 - CENTRO DE RECICLAGEM IMPLANTADO	und	0114200 - MARACANAÚ	0	0	1	1	0	0	2 Und	0	0		0	Editar
Subprodutos	603 - VEÍCULO ADQUIRIDO	und	0114200 - MARACANAÚ	0	0	1	1	0	0	4 Und	0	0		0	Editar
									6						

VER EXECUÇÃO FINANCEIRA DO ANO

Acompanhamento:

VER ACOMPANHAMENTOS ANTERIORES

Concluído

Intranet local 100%

Iniciar Google Talk gmail.com Monitoramento dos p... Acesso a Sistemas - ... Acompanhamentos d... PT 16:40



Acompanhamento do projeto

- Gerente de Projeto (GP) define data e estágio do projeto, **informa execução de produtos e subprodutos por município** e fornece informações descritivas sobre o projeto;
- Para fazer um novo acompanhamento **é obrigatório** preencher: data, estágio e acompanhamento textual;
- **É recomendável** o preenchimento dos seguintes campos: quantidade realizada de produto, tipo de beneficiário, quantidade de beneficiário, quantidade de subproduto, datas de revisão para início e término e informações complementares sobre a execução dos subprodutos. **O sistema adotará os valores do acompanhamento anterior no caso de não preenchimento destes campos.**



Acompanhamento de projeto regras de negócios

- O acompanhamento poderá ser feito pelo SIAP (módulo de acompanhamento de projetos) ou no WebMapp (módulo de estágio de execução);
- O acompanhamento poderá ser editado até sua conclusão;
- Os acompanhamentos anteriores não poderão ser editados, apenas visualizados;
- Não será mais necessário fazer o acompanhamento do PF e autorização de parcelas;





Rotina de validação do acompanhamento

Windows Internet Explorer

http://172.26.0.38/siap2009homologacao/Paginas/exec.ls.analise.mapp.acomp.aspx

Live Search

172.26.0.38/siap2009homologacao/Paginas/exec.ls.analise.mapp.acomp.aspx

SEPLAG - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
MARCOS MEDEIROS DE VASCONCELOS 12 usuários

MovimentosRelatóriosConsultas/ManutençãoAdministraçãoAnálisesFerramentasSair

Principal :: Listagem MAPP para Analise de Acompanhamentos

Buscar em:
Secretaria: 43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES (SCIDADES)
Órgão: 43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES (SCIDADES)
Programa: 711 - Saneamento Ambiental do Ceará
Estágio: EM EXECUÇÃO
Prioridade: Todas
Todos Iniciar por Buscar

1 registros encontrados.

	Descrição	Tipo	Valor Total
38 - FUNASA - Conclusão da Obra de Usina de Triagem e Beneficiamento em Maracanaú		Investimento	540.369,34

© 2009 SEPLAG - Todos os direitos reservados

SEPLAG

Intranet local100%

16:43

Análise do Acompanhamento MAPP - Windows Internet Explorer

http://172.26.0.38/siap2009homologacao/Paginas/exec.cd.analise.mapp.acomp.aspx?rid=69822

Análise do Acompanhamento MAPP

Secretaria: 43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES
Orgão: 43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES
Programa: 711 - Saneamento Ambiental do Ceará
MAPP: 38 - FUNASA - Conclusão da Obra de Usina de Triagem e Beneficiamento em Maracanaú
Valor Total: 540.369,34
Status: Aprovado
Data Início: 01/01/2004
Data Fim: 31/12/2009
Data Aprovação:
Responsável: EDMUNDO OLINDA FILHO
Objetivo: Construção e aparelhagem da Usina de Triagem e beneficiamento de recicláveis em Maracanaú
Justificativa: Aumento do Bem-Estar Social: fornecer à sociedade local para tratamento adequado de resíduos sólidos. Ação que impacta na redução de doenças e dos níveis de poluição causados pelo descarte inadequado dos resíduos sólidos.
Observação: Aguardando assinatura do termo de aditivo pela FUNASA Casa Civil/GABGOV em 21.02.08
Detalhamento Físico Mapp:
Prioridade: Baixa

Data: 25/09/2009 00:00
Estágio: EM EXECUÇÃO

+ VER FINANCIADORES

DATAS DO PROJETO

Datas	Programada	Revisada
Início	01/12/2008	02/02/2009
Término	31/12/2008	02/01/2010

PRODUTOS / SUBPRODUTOS / MUNICÍPIOS
(Mostrar Municípios)(Mostrar Subprodutos)

Produto/Subproduto	Unidade	Qtd 2007	Valor 2007	Qtd 2008	Valor 2008	Qtd 2009	Valor 2009	Qtd 2010	Valor 2010	Beneficiário	Qtde Beneficiário	Início Revisão	Término Revisão
116 - CENTRO DE RECICLAGEM IMPLANTADO	und	0	0,00	1	1,00	0	2,00	0	0,00		0	02/02/2009	31/12/2009
603 - VEÍCULO ADQUIRIDO	und	0	0,00	1	1,00	0	4,00	0	0,00		0	02/03/2009	02/01/2010

+ VER EXECUÇÃO FINANCEIRA DO ANO

Acompanhamento: RECEBIDO CAMINHÃO E INSTALADO POLIGUINDASTE NA CARROCERIA. TAMBÉM RECEBIDA UMA DAS PRENSAS (A OUTRA PRECISOU SER SUBSTITUÍDA PORQUE FOI DANIFICADA DURANTE O TRANSPORTE ENTRE O FABRICANTE E A USINA DE TRIAGEM). A FUNASA ENCAMINHOU NOVO PLANO DE TRABALHO PARA POSSIBILITAR RESSARCIMENTO DE PARTE DO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO. PROCESSO 09032333-5 ENCAMINHADO NESTA DATA PELA ÁREA TÉCNICA DA PARA COLETA DA ASSINATURA DO SECRETÁRIO - teste 7

+ VER ACOMPANHAMENTOS ANTERIORES

Validar Acompanhamento: ☐ Sim ☐ Não

Justificativa:

Concluído

Intranet local 100%

16:46



Validação do acompanhamento de projeto regras de negócios

- A validação dos acompanhamentos é papel da equipe técnica da SEPLAG;
- O técnico poderá validar sem justificativa. Para os **acompanhamentos não validados, será necessário justificar**;
- **Projetos com acompanhamentos não validados não podem solicitar parcelas**;






GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento
e Gestão

Rotina de Monitoramento do Projeto



Monitoramento

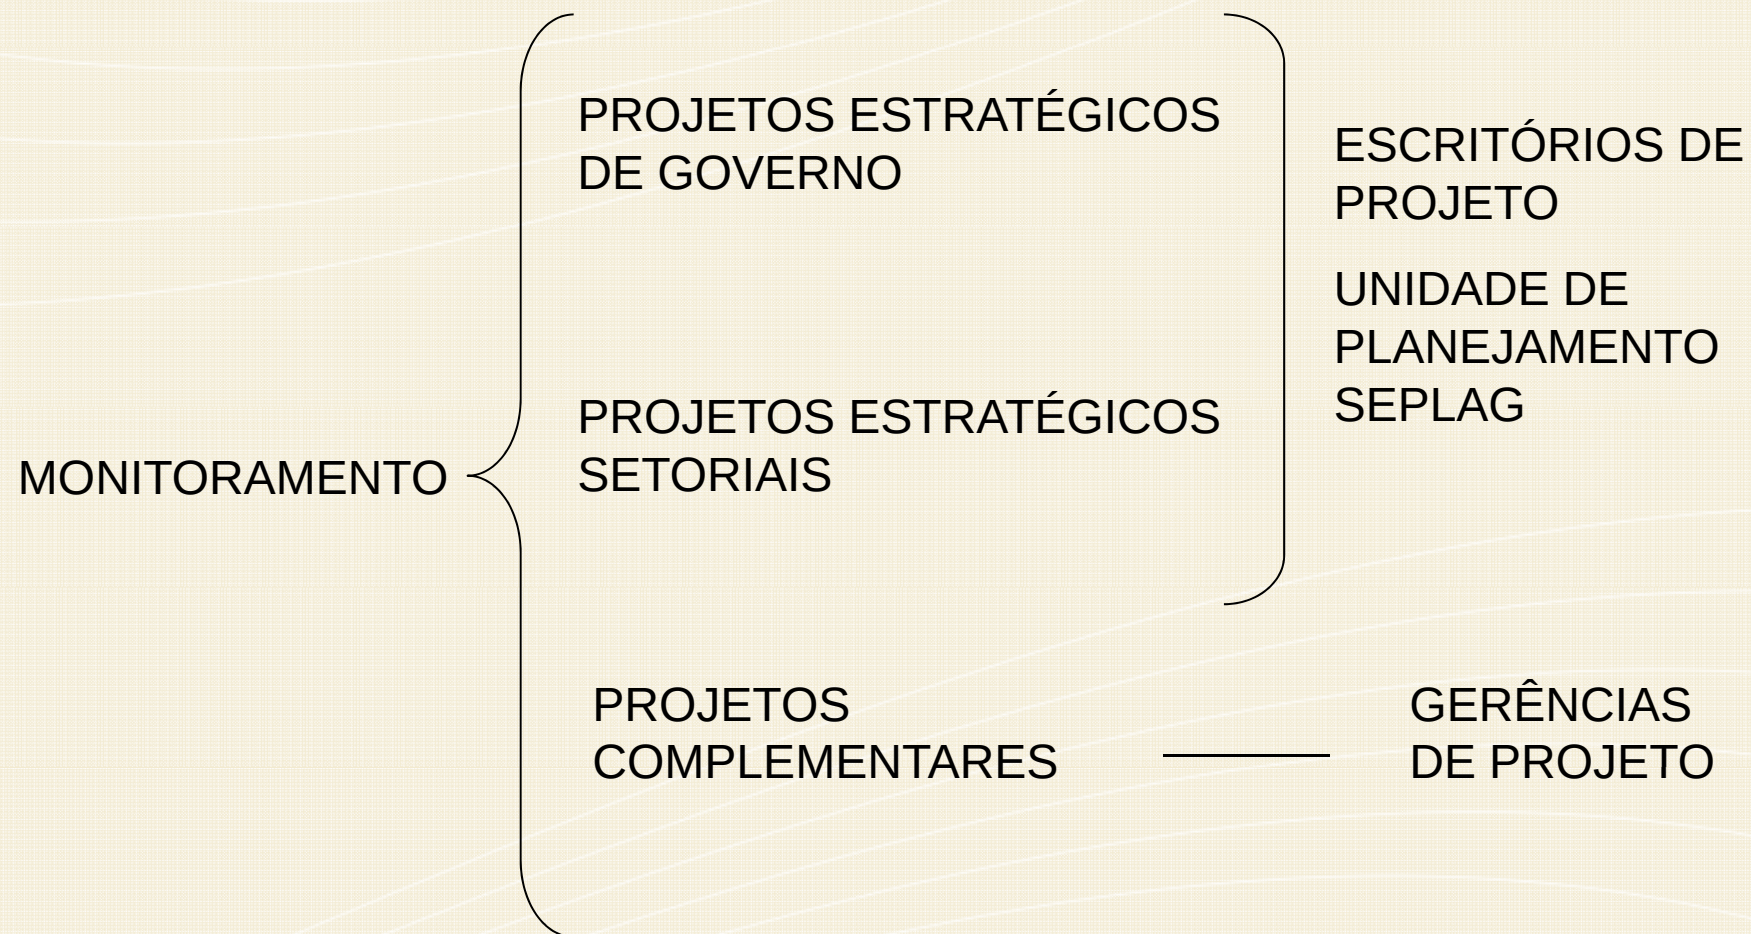



Classificação dos projetos

Os projetos são classificados em:

- Projetos Estratégicos de Governo - são aqueles projetos estruturantes, fundamentais à consecução dos resultados de Governo;
- Projetos Estratégicos Setoriais - são aqueles projetos importantes para obtenção dos resultados setoriais, embora estejam num nível de importância inferior em relação aos estratégicos de governo; e
- Projetos Complementares - são aqueles projetos que atuam complementarmente à ação de governo.



Monitoramento do Projeto

- Sinaliza o projeto (verde, amarelo e vermelho) - **FAROL**;
- Discute e preenche a **Matriz Acompanhamento de Problemas e Ameaças**;
- Classifica o Problema (grave, médio e pequeno);

SIAP 2009 SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS

Detalhes:

Secretaria: 1000000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
Órgão: 1000000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
Programa: 010 - Infra-estrutura do Sistema Penitenciário do Ceará - INFRAJUS
UAEF: 02 - Execução de Projeto e Construção de 11 Cadeias Públicas com 25 vagas nos municípios de Aracati, Araripe, Cruz, Fortim, Graça, Jati, Juca de Jericoatara, Itaitinga, Itapagé, Itapicuma e Itapipuma
Valor Total: 17.000.000,00
Status: Aprovado
Data Início: 30/09/2008
Data Fim: 31/12/2010
Data Atualização: 31/12/2010
Responsável: Jefferson José Gurgel Filho
Descrição: Construção de 11 cadeias públicas nos municípios de Aracati, Araripe, Cruz, Fortim, Graça, Jati, Juca de Jericoatara, Itaitinga, Itapagé, Itapicuma e Itapipuma com capacidade para 220 vagas e suas vagas.
Justificativa: Construção de 11 cadeias públicas nos municípios de Aracati, Araripe, Cruz, Fortim, Graça, Jati, Juca de Jericoatara, Itaitinga, Itapagé, Itapicuma e Itapipuma com capacidade para 220 vagas e suas vagas.
Observação: Termino previsto em 2010. Cruz, Araripe, Itapagé, Itapicuma e Itapipuma com 20 vagas cada. Juca de Jericoatara com 20 vagas e suas vagas.
Detalhamento: Fatores de Risco
Prioridade: Alta

VER FINANCIADORES

DATAS DO PROJETO

Item	Programa	Finalidade
1	30/09/2008	30/09/2008
2	30/09/2008	30/09/2008

PRODUTOS - MUNICÍPIOS

Produto	Município	Proj. 2007	Real. 2007	Proj. 2008	Real. 2008	Proj. 2009	Real. 2009	Proj. 2010	Real. 2010	Proj. 2011	Real. 2011	Proj. 2012	Real. 2012	Proj. 2013	Real. 2013
Subproduto 01 - Cadeia Pública Construída	Aracati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subproduto 01 - Cadeia Pública Construída	Araripe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subproduto 01 - Cadeia Pública Construída	Cruz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subproduto 01 - Cadeia Pública Construída	Fortim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subproduto 01 - Cadeia Pública Construída	Itaitinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subproduto 01 - Cadeia Pública Construída	Jati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subproduto 01 - Cadeia Pública Construída	Juca de Jericoatara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subproduto 01 - Cadeia Pública Construída	Itapagé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subproduto 01 - Cadeia Pública Construída	Itapicuma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subproduto 01 - Cadeia Pública Construída	Itapipuma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FAROL

Ver Execução Financeira do Ano

Ver Acompanhamentos Anteriores

Matriz de Problemas e Riscos

Problema	Condição	Prioridade	Responsável	Prazo
Problema 1	Condição 1	Alta	Responsável 1	30/09/2008
Problema 2	Condição 2	Média	Responsável 2	30/09/2008
Problema 3	Condição 3	Baixa	Responsável 3	30/09/2008

Windows Internet Explorer - Listagem para Monitoramento de Projetos MAPP

http://172.26.0.38/siap2009homologacao/Paginas/plan.ls.monitoramento.mapp.aspx

SEPLAG - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
MARCOS MEDEIROS DE VASCONCELOS 12 usuários

Movimentos | Relatórios | Consultas/Manutenção | Administração | Análises | Ferramentas | Sair

Principal :: Listagem para Monitoramento de Projetos MAPP

Buscar em:

Secretaria: 43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES (SCIDADES)

Órgão: 43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES (SCIDADES)

Programa: 711 - Saneamento Ambiental do Ceará

Estágio: EM EXECUÇÃO

Prioridade: Todas

Todos [] Iniciar por [] Buscar

Para localizar o registro desejado: Escolha onde deseja pesquisar, digite o texto e pressione o botão [Buscar].

5 registros encontrados.

	Descrição	Tipo	Valor Total
40	Consultoria para Consórcios Municipais	Investimento	703.030,15
42	Contratação de Consultoria para Plano de Gestão para Abatedouros Públicos	Investimento	596.967,78
427	Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia para Implantação de Aterro Sanitário, Centro de Triagem, Estação de Transferência, Estudos Ambientais e Revisão do Plano de Gestão - Municípios da região 2: Paracuru, Paraipaba e Trairi.	Investimento	200.000,00
62	Contrapartida da Obra de Esgotamento Sanitário - PMSS - em Limoeiro do Norte	Investimento	3.823.524,13
38	FUNASA - Conclusão da Obra de Usina de Triagem e Beneficiamento em Maracanaú	Investimento	540.369,34

© 2009 SEPLAG - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

SEPLAG

Concluído

Intranet local 100%

16:47

Monitoramento de Projeto Mapp - Windows Internet Explorer

http://172.26.0.38/siap2009homologacao/Paginas/plan.cd.monitoramento.mapp.aspx?isn_acompanhamento_mapp=69822&rid=0

Monitoramento de Projeto Mapp

SEPLAG - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
MARCOS MEDEIROS DE VASCONCELOS 12 usuários

MovimentosRelatóriosConsultas/ManutençãoAdministraçãoAnálisesFerramentasSair

Principal :: Listagem de MAPPs para Monitoramento :: Monitoramento de Projeto Mapp

Detalhes:

Secretaria: 43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES
Orgão: 43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES
Programa: 711 - Saneamento Ambiental do Ceará
MAPP: 38 - FUNASA - Conclusão da Obra de Usina de Triagem e Beneficiamento em Maracanaú
Valor Total: 540.369,34
Status: Aprovado
Data Início: 01/01/2004
Data Fim: 31/12/2009

Data Aprovação:
Responsável: EDMUNDO OLINDA FILHO
Objetivo: Construção e aparelhagem da Usina de Triagem e beneficiamento de recicláveis em Maracanaú
Justificativa: Aumento do Bem-Estar Social: fornecer à sociedade local para tratamento adequado de resíduos sólidos. Ação que impacta na redução de doenças e dos níveis de poluição causados pelo descarte inadequado dos resíduos sólidos.
Observação: Aguardando assinatura do termo de aditivo pela FUNASA Casa Civil/GABGOV em 21.02.08

Detalhamento Físico Mapp:
Prioridade: Baixa

DATA DO ACOMPANHAMENTO: 25/09/2009

ESTÁGIO: EM EXECUÇÃO

OBSERVAÇÃO:

RECEBIDO CAMINHÃO E INSTALADO POLIGUINDASTE NA CARROCERIA. TAMBÉM RECEBIDA UMA DAS PRENSAS (A OUTRA PRECISOU SER SUBSTITUÍDA PORQUE FOI DANIFICADA DURANTE O TRANSPORTE ENTRE O FABRICANTE E A USINA DE TRIAGEM). A FUNASA ENCAMINHOU NOVO PLANO DE TRABALHO PARA POSSIBILITAR RESSARCIMENTO DE PARTE DO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO. PROCESSO 09032333-5 ENCAMINHADO NESTA DATA PELA ÁREA TÉCNICA DA PARA COLETA DA ASSINATURA DO SECRETÁRIO - teste 7

DATAS DO PROJETO

Datas	Programada	Revisada
Início	01/12/2008	02/02/2009
Término	31/12/2008	02/01/2010

VER FINANCIADORES

Fonte	Aprovado Anterior ao Mapp (A)	Limite	2007 (B)	2008 (C)	2009 (D)	2010 (E)	Total (A+B+C+D+E)
(00)-(01) Tesouro	0,00	0,00	0,00	250.879,42	158.324,92	0,00	409.204,34
(82) Governo Federal - Adm. Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	131.165,00	0,00	131.165,00

VER EXECUÇÃO DO MAPP

Fonte	Empenhado 2007	Empenhado 2008	Empenhado 2009	Empenhado 2010	Total
(00)-(01) Tesouro	0,00	250.879,42	0,00	0,00	250.879,42

VER PRODUTOS / SUBPRODUTOS / MUNICÍPIOS

(Ocultar Municípios) (Ocultar Subprodutos)

Produto/Subproduto	Município	Unidade	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Beneficiário	Qtde	Início	Término	Complemento
--------------------	-----------	---------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	--------------	------	--------	---------	-------------

http://172.26.0.38/siap2009homologacao/Paginas/plan.cd.monitoramento.mapp.aspx?isn_acompanhamento_mapp=69822&rid=0#

Intranet local100%

Iniciar

Google Talk

gmail.com

Monitoramento dos p...

Acesso a Sistemas — ...

Monitoramento de Pr...

PT

16:51

Monitoramento de Projeto Mapp - Windows Internet Explorer

http://172.26.0.38/siap2009homologacao/Paginas/plan.cd.monitoramento.mapp.aspx?isn_acompanhamento_mapp=69822&rid=0

Monitoramento de Projeto Mapp

Página Ferramentas

Fonte	Aprovado Anterior ao Mapp (A)	Limite	2007 (B)	2008 (C)	2009 (D)	2010 (E)	Total (A+B+C+D+E)
(00)-(01) Tesouro	0,00	0,00	0,00	250.879,42	158.324,92	0,00	409.204,34
(82) Governo Federal - Adm. Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	131.165,00	0,00	131.165,00

☐ VER EXECUÇÃO DO MAPP

Fonte	Empenhado 2007	Empenhado 2008	Empenhado 2009	Empenhado 2010	Total
(00)-(01) Tesouro	0,00	250.879,42	0,00	0,00	250.879,42

☐ VER PRODUTOS / SUBPRODUTOS / MUNICÍPIOS

(Ocultar Municípios) (Ocultar Subprodutos)

Produto/Subproduto	Município	Unidade	Qtd 2007	Valor 2007	Qtd 2008	Valor 2008	Qtd 2009	Valor 2009	Qtd 2010	Valor 2010	Beneficiário	Qtde Beneficiário	Início Revisão	Término Revisão	Complemento
116 - CENTRO DE RECICLAGEM IMPLANTADO	0114200 - MARACANAÚ	und	0	0,00	1	1,00	0	2,00	0	0,00		0	02/02/2009	31/12/2009	-
1847 - EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS ADQUIRIDOS	-	und	0	0,00	3	3,00	0	16,00	0	0,00	-	0	02/02/2009	31/12/2009	foram adquiridos todos os equipamentos
603 - VEÍCULO ADQUIRIDO	0114200 - MARACANAÚ	und	0	0,00	1	1,00	0	4,00	0	0,00		0	02/03/2009	02/01/2010	-
113 - CAMINHÃO	-	und	0	0,00	1	1,00	0	1,00	0	0,00	-	0	02/03/2009	02/01/2010	o veículo foi entregue.

☐ VER EXECUÇÃO FINANCEIRA DO ANO

Fonte	Limite	Programado	Solicitado	Fixado	Empenhado	Pago	%
(00)-(01) Tesouro	0,00	158.324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(82) Governo Federal - Adm. Direta	0,00	131.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTICIPANTES

☐ VER ACOMPANHAMENTOS ANTERIORES

FAROL: ☒ DESEMPENHO FAVORÁVEL ☐ PROJETO COM PROBLEMAS ☐ DESEMPENHO INSATISFATÓRIO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DE PROBLEMAS OU AMEAÇAS

Problema	Providências	Responsáveis	Prazo	Classificação	Status	Acompanhamento
RESSARCIMENTO DE PARTE DO PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	ENCAMINHAR PLANO DE TRABALHO PARA ASSINATURA DO SECRETÁRIO	COSAM	15/10/2009	BAIXO	EM ANDAMENTO COM ATRASO	O Secretário já assinou o plano de trabalho.
TESTE 4	TE	REFDFSFS	12/10/2009	BAIXO	NÃO INICIADO	

© 2009 SEPLAG - Todos os direitos reservados

SEPLAG

Intranet local 100%


16:53



Estado de Sinalização dos Projetos



Projetos com **desempenho favorável**, em relação à execução física e financeira, e cujas **dificuldades forem absolutamente contornáveis** pela gerência do Projeto.



Projetos com **problemas ou possíveis situações de riscos** que possam **comprometer o desempenho do projeto e/ou ainda impactar outras ações de governo**.



Projetos cujos resultados e/ou prazos **apresentam-se fortemente comprometidos em função dos entraves e dificuldades**.



Matriz de Acompanhamento de Problemas e Ameaças

“A **Matriz de Acompanhamento Problemas e Ameaças** é instrumento gerencial que contribuirá para identificar e **acompanhar a evolução**, de forma agregada e tempestiva, **dos problemas e ameaças que possam tornar incerto o cumprimento de prazos, custos e alcance dos resultados dos projetos**, ao mesmo tempo em que define estratégias e providências, com vistas a solucionar os problemas e dificuldades para implantação do projeto.” (Metodologia de monitoramento de projetos – SEPLAG)



Elementos da Matriz de Acompanhamento de Problema e Ameaça

Problema ou Ameaça: Problema instalado ou possibilidade de situações desfavoráveis à execução do projeto, os quais, se não forem resolvidos ou mitigados, deverão atrasar sua execução e/ou comprometer o alcance dos seus resultados.

Providência: Descrição das medidas adequadas à resolução do problema ou mitigação da ameaça. Tomada de iniciativa no intuito de prevenir, transferir ou minimizar as ameaças e resolver os problemas.

Responsável: Pessoa ou entidade responsável pela providência.

Data da resolução: É a data-limite indicada para a resolução da providência indicada.

Classificação do Problema ou Ameaça – Nível de gravidade dos problemas ou ameaças (ver em treinamento).

Status: Estágio de encaminhamento da providência e será classificado em: Concluída, Em andamento normal, Em andamento com Atraso e Não iniciada.

Acompanhamento da Providência: Informação sobre os encaminhamentos e ocorrências na providência.

Monitoramento do projeto

- **Todos os projetos Mapp** serão monitorados;
- A sinalização dos projetos estratégicos de governo e setoriais será acionada pela equipe do EP/SEPLAG.
- A sinalização dos projetos complementares será acionada pelos gerentes de projeto.
- Para os projetos estratégicos sinalizados como amarelo e vermelho, é recomendável o preenchimento da MAPA. No caso dos projetos estratégicos sinalizados de verde, o preenchimento é opcional;
- Para os projetos complementares sinalizados com vermelho, o preenchimento da matriz de acompanhamento de problemas e ameaças é recomendável;
- **O monitoramento não influi na solicitação de parcelas**





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento
e Gestão

Rotina de conclusão do Monitoramento do Projeto

Windows Internet Explorer window titled "Listagem para Conclusão de Monitoramento de Projetos MAPP". The address bar shows the URL: <http://172.26.0.38/siap2009homologacao/Paginas/plan.ls.analise.monitoramento.mapp.aspx>.

The page header includes the logo "SIAP 2009" and the text "SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS". The user is logged in as "SEPLAG - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO" with the name "MARCOS MEDEIROS DE VASCONCELOS" and the role "Administrador".

The navigation menu includes: Movimentos, Relatórios, Consultas/Manutenção, Administração, Análises, Ferramentas, and Sair.

The main content area is titled "Principal :: Listagem para Conclusão de Monitoramento de Projetos MAPP". It contains a search form with the following fields:

- Secretaria: 43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES (SCIDADES)
- Órgão: 43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES (SCIDADES)
- Programa: 711 - Saneamento Ambiental do Ceará
- Estágio: Todos os Estágios
- Prioridade: Todas

Buttons: Todos, Iniciar por, and Buscar.

Below the search form, a message states: "Para localizar o registro desejado: Escolha onde deseja pesquisar, digite o texto e pressione o botão [Buscar]."

The search results show 2 registros encontrados. The table below displays the results:

	Descrição	Tipo	Valor Total
38	FUNASA - Conclusão da Obra de Usina de Triagem e Beneficiamento em Maracanaú	Investimento	540.369,34
54	Conclusão do Projeto de Diagnóstico e Plano de Gestão de Resíduos Sólidos na Serra da Ibiapaba	Investimento	40.617,48

The footer of the page includes the copyright notice: "© 2009 SEPLAG - Todos os direitos reservados" and the SEPLAG logo.

The Windows taskbar at the bottom shows the "Iniciar" button, several open applications (Google Talk, gmail.com, Monitoramento dos p..., Acesso a Sistemas, Listagem para Conclu...), and the system clock showing 17:01 on PT.

Conclusão de Monitoramento de Projeto MAPP - Windows Internet Explorer

http://172.26.0.38/siap2009homologacao/Paginas/exec.cd.analise.monitoramento.mapp.aspx

SEPLAG - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
MARCOS MEDEIROS DE VASCONCELOS

Movimentos Relatórios Consultas/Manutenção Administração Análises Ferramentas Sair

Principal :: Listagem de MAPPs para Conclusão de Monitoramento :: Conclusão de Monitoramento de Projeto MAPP

Detalhes:

Secretaria: 43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES
Orgão: 43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES
Programa: 711 - Saneamento Ambiental do Ceará
MAPP: 38 - FUNASA - Conclusão da Obra de Usina de Triagem e Beneficiamento em Maracanaú
Valor Total: 540.369,34
Status: Aprovado
Data Início: 01/01/2004
Data Fim: 31/12/2009
Data Aprovação:
Responsável: EDMUNDO OLINDA FILHO
Objetivo: Construção e aparelhagem da Usina de Triagem e beneficiamento de recicláveis em Maracanaú
Justificativa: Aumento do Bem-Estar Social: fornecer à sociedade local para tratamento adequado de resíduos sólidos. Ação que impacta na redução de doenças e dos níveis de poluição causados pelo descarte inadequado dos resíduos sólidos.
Observação: Aguardando assinatura do termo de aditivo pela FUNASA Casa Civil/GABGOV em 21.02.08
Detalhamento Físico Mapp:
Prioridade: Baixa

DATA DO ACOMPANHAMENTO: 25/09/2009
ESTÁGIO: EM EXECUÇÃO
OBSERVAÇÃO: RECEBIDO CAMINHÃO E INSTALADO POLIGUINDASTE NA CARROCERIA. TAMBÉM RECEBIDA UMA DAS PRENSAS (A OUTRA PRECISOU SER SUBSTITUÍDA PORQUE FOI DANIFICADA DURANTE O TRANSPORTE ENTRE O FABRICANTE E A USINA DE TRIAGEM). A FUNASA ENCAMINHOU NOVO PLANO DE TRABALHO PARA POSSIBILITAR RESSARCIMENTO DE PARTE DO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO. PROCESSO 09032333-5 ENCAMINHADO NESTA DATA PELA ÁREA TÉCNICA DA PARA COLETA DA ASSINATURA DO SECRETÁRIO - teste 7

DATAS DO PROJETO

Datas	Programada	Revisada
Início	01/12/2008	02/02/2009
Término	31/12/2008	02/01/2010

VER FINANCIADORES

Fonte	Aprovado Anterior ao Mapp (A)	Limite	2007 (B)	2008 (C)	2009 (D)	2010 (E)	Total (A+B+C+D+E)
(00)-(01) Tesouro	0,00	0,00	0,00	250.879,42	158.324,92	0,00	409.204,34
(82) Governo Federal - Adm. Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	131.165,00	0,00	131.165,00

VER EXECUÇÃO DO MAPP

Fonte	Empenhado 2007	Empenhado 2008	Empenhado 2009	Empenhado 2010	Total
(00)-(01) Tesouro	0,00	250.879,42	0,00	0,00	250.879,42

VER PRODUTOS / SUBPRODUTOS / MUNICÍPIOS
(Mostrar Municípios) (Mostrar Subprodutos)

Produto/Subproduto	Unidade	Qtd 2007	Valor 2007	Qtd 2008	Valor 2008	Qtd 2009	Valor 2009	Qtd 2010	Valor 2010	Beneficiário	Qtde Beneficiário	Início Revisão	Término Revisão
--------------------	---------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	--------------	-------------------	----------------	-----------------

Intranet local 100%

Iniciar Google Talk gmail.com Monitoramento dos p... Acesso a Sistemas ... Conclusão de Monitor... PT 17:03

Conclusão de Monitoramento de Projeto MAPP - Windows Internet Explorer

http://172.26.0.38/siap2009homologacao/Paginas/exec.cd.analise.monitoramento.mapp.aspx

Conclusão de Monitoramento de Projeto MAPP

VER PRODUTOS / SUBPRODUTOS / MUNICÍPIOS
(Mostrar Municípios) (Mostrar Subprodutos)

Produto/ Subproduto	Unidade	Qtd 2007	Valor 2007	Qtd 2008	Valor 2008	Qtd 2009	Valor 2009	Qtd 2010	Valor 2010	Beneficiário	Qtde Beneficiário	Início Revisão	Término Revisão
116 - CENTRO DE RECICLAGEM IMPLANTADO	und	0	0,00	1	1,00	0	2,00	0	0,00		0	02/02/2009	31/12/2009
603 - VEÍCULO ADQUIRIDO	und	0	0,00	1	1,00	0	4,00	0	0,00		0	02/03/2009	02/01/2010

VER EXECUÇÃO FINANCEIRA DO ANO

Fonte	Limite	Programado	Solicitado	Fixado	Empenhado	Pago	%
(00)-(01) Tesouro	0,00	158.324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(82) Governo Federal - Adm. Direta	0,00	131.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTICIPANTES

VER ACOMPANHAMENTOS ANTERIORES

FAROL: ☒ DESEMPENHO FAVORÁVEL ☐ PROJETO COM PROBLEMAS ☒ DESEMPENHO INSATISFATÓRIO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DE PROBLEMAS OU AMEAÇAS

Problema	Providências	Responsáveis	Prazo	Classificação	Status	Acompanhamento
RESSARCIMENTO DE PARTE DO PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	ENCAMINHAR PLANO DE TRABALHO PARA ASSINATURA DO SECRETÁRIO	COSAM	15/10/2009	BAIXO	EM ANDAMENTO COM ATRASO	O Secretário já assinou o plano de trabalho.
TESTE 4	TE	REFDFSFS	12/10/2009	BAIXO	NÃO INICIADO	

COMENTÁRIOS SEPLAG

Você deseja bloquear a execução financeira do Projeto?

☒ Sim ☐ Não

	Código	Descrição
☒	4310092008	Construção, fornecimento e montagem de equipamentos da usina de triagem e beneficiamento de recicláveis em Maracanaú

Bloquear / Desbloquear

Voltar p/ Listagem

© 2009 SEPLAG - Todos os DIREITOS RESERVADOS

SEPLAG

Concluído

Intranet local 100%

17:04



Conclusão do monitoramento de projeto - regras de negócios

- Na conclusão do monitoramento, o técnico SEPLAG deverá fazer um **comentário resumido** sobre a execução do projeto. **Este comentário não será obrigatório;**
- Na conclusão do monitoramento, o técnico de SEPLAG poderá **bloquear, total ou parcialmente**, a solicitação de parcelas do projeto.
- O **desbloqueio do projeto** será feito mediante um novo monitoramento;
- O gerente SEPLAG terá **permissão para liberação de parcela** de projeto bloqueado

