



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Planejamento e Gestão

EXPANSÃO DA REDE DE PLANEJAMENTO

Philippe Theophilo Nottingham



ESTRATÉGIA DE GESTÃO DO GOVERNO PRIMEIRO MOMENTO


- Adoção do Modelo de GPR
- Participação da Sociedade
 - PPA Regionalizado e Participativo; e
 - Governo na Minha Cidade
- Mapp
- Monitoramento de Projetos
 - Fundação Getúlio Vargas – Principais Projetos Estratégicos




ESTRATÉGIA DE GESTÃO DO GOVERNO SEGUNDO MOMENTO

1. Organização da Rede Estadual de Planejamento - Unificação da coordenação das funções de planejamento dentro de cada secretaria e o Monitoramento Intensivo de Projetos Estratégicos do Governo
2. Criação de Unidades Setoriais de Planejamento - USP
3. Instalação de **Escritórios de Projetos nas Secretarias**
4. Definição das metodologias de monitoramento e de gerenciamento de projetos do Governo do Estado
5. Criação da Escola de Gestão Pública (EGP)
6. Especialização de uma equipe na SEPLAG/CPLOG em Monitoramento dos Projetos, Programas e Resultados do Governo


ESTRUTURA DA REDE DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO

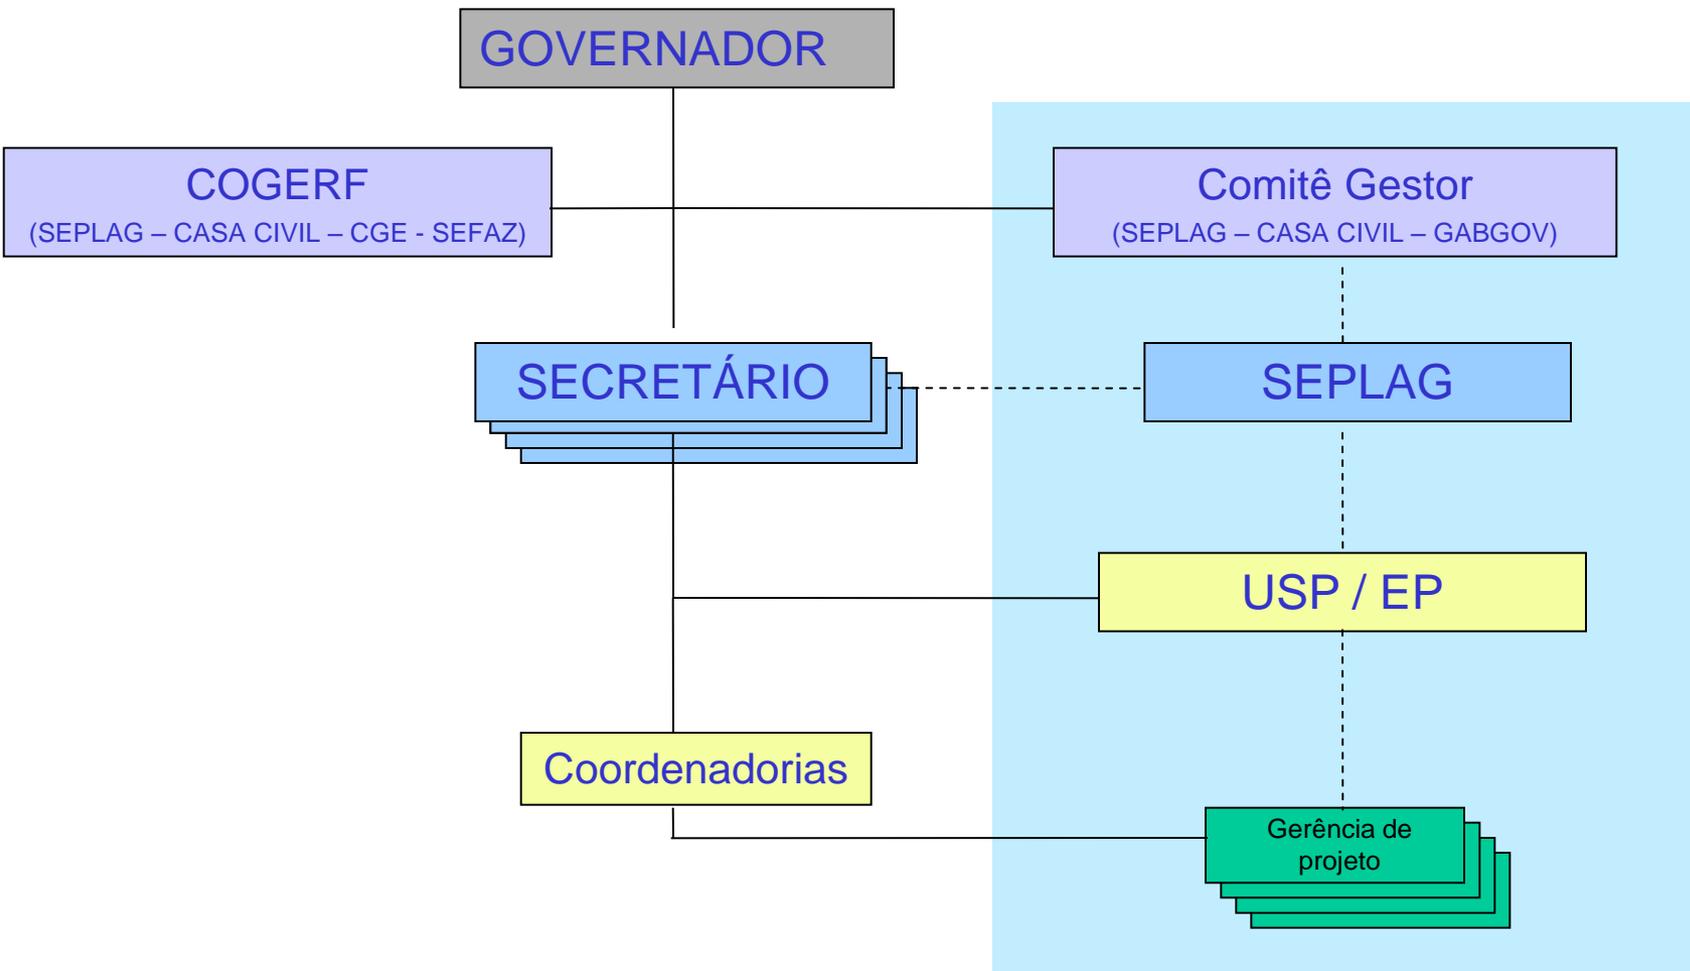




Embasamento Legal

O Decreto 29.917, de 08 de outubro de 2009, redefine o sistema estadual de planejamento, institui a rede estadual de planejamento, que será responsável pela condução dos processos de planejamento, orçamento e gestão pública por resultados, no âmbito da Administração Pública Estadual, sob a coordenação da SEPLAG.




FUNÇÕES DA REDE DE PLANEJAMENTO

- Integração e articulação do Planejamento Governamental com o Planejamento Setorial
- Centralização da coordenação dos instrumentos de planejamento e monitoramento em uma única unidade nas secretarias setoriais
- Facilitação da disseminação e aplicação das metodologias referentes aos instrumentos de Planejamento



FUNÇÕES DA UNIDADE SETORIAL DE PLANEJAMENTO - USP

- Coordenação da Elaboração, Revisão e Avaliação do PPA da Secretaria e suas Vinculadas
- Coordenação da Elaboração e Alterações do ORÇAMENTO da Secretaria e suas Vinculadas
- Coordenação da definição de Indicadores e Acompanhamento da GPR da Secretaria e suas Vinculadas
- Coordenação do Processo de Monitoramento de projetos por meio do Escritório de Projetos
- Integração dos Instrumentos de Planejamento no Âmbito da Secretaria e suas Vinculadas
- Centralização a nível setorial da articulação com a SEPLAG para as questões relacionadas aos Instrumentos de planejamento (PPA – GPR – LOA – MAPP)



FUNÇÕES DOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS

- Monitoramento Intensivo dos Projetos Estratégicos (de Governo e Setorial)
- Monitoramento de Projetos Complementares através de painel de Controle
- Orientar as gerências de projetos sobre a Metodologia de Gerenciamento de Projetos do Estado.
- Identificar necessidade e viabilizar a capacitação das gerências de projetos



SITUAÇÃO DESEJADA COM OS PROJETOS

Alcance dos Resultados, no prazo estabelecido e no custo programado

ESTRATÉGIA DE MONITORAMENTO

- 1 - Seleção de Projetos Estratégicos
- 2 - Gerenciamento intensivo de projetos estratégicos
 - Painel de Controle com Farol
 - Acompanhamento da Gerência (estágio e comentários sobre a execução)
 - Gerenciamento de problemas e riscos (Matriz de Riscos)
 - Reuniões SEPLAG / Setorial
 - Observações de monitoramento da SEPLAG
- 3 – Monitoramento Extensivo de projetos complementares através do Painel de Monitoramento do WebMapp.
 - Faróis acesos pelos gerentes
 - Matriz de Risco para projetos com farol vermelho



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

Apresentação do Módulo de Monitoramento dos Principais Empreendimentos no WebMapp



Estratégia de implantação

Atividades / Etapas	Período
Indicação dos coordenadores da USP e gerentes do EP	Até 30/ Agosto
Palestra se detalhamento do funcionamento da rede estadual de planejamento para Coordenadores e nível gerencial das secretarias envolvidas e suas vinculadas	01/ Setembro
Reunião com os Coordenadores de USP / EP	02 / Setembro
Capacitação inicial para equipe de implantação (Coordenadores das USP /SEPLAG em monitoramento e gerenciamento de projetos (1 turma de 40 horas/aula)	13 a 24 /Setembro
Implantação do arranjo institucional da USP/EP (definição de equipe infraestrutura e seleção de projetos estratégicos)	27/09 a 08/10
Monitoramento dos projetos estratégicos	A partir de 18/10
Capacitação em gerenciamento de projeto com foco em iniciação, planejamento e uso do WebMapp/SIAP e dot.project (4 turmas de 40 horas)	18/10/10 a 19/11/10
Assessoramento em escopo, tempo, custo, riscos, Webmapp/Siap e dotproject	22/11/10 a 04/03/11
Capacitação em gerenciamento de projeto com foco em contratação, execução,	14/03/11 a 15/04/11



Necessidades Imediatas

- Definição do Coordenador da USP e do Escritório de Projetos – **Até 30/Agosto**
- Disponibilizar o Nível Gerencial da Secretaria e Vinculadas para o **Evento do dia 01/ Setembro**
- Discutir Internamente a definição da área interna que assume o papel da USP
- Seleção de Projetos Prioritários
- Motivar Internamente o Nível Gerencial da Secretaria sobre o papel da Rede de Planejamento e da importância do Monitoramento Intensivo dos Projetos



SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG

Philippe Theophilo Nottingham
Coordenador de Planejamento Orçamento e Gestão
philipe@seplag.ce.gov.br
(85) 3101 4525

*GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão*



ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE PLANEJAMENTO

1 - Primeira Etapa (Piloto) – 5 Secretarias - 2009 / 2010
(SEINFRA, SEDUC, SSPDS, SETUR E SRH)

2 - Segunda Etapa – 9 Secretarias – 2010 / 2011
(SESA, SCIDADES, SDA, STDS, SESPORTE, SECULT, SECITECE,
CONPAM, SEJUS)

3 - Terceira Etapa – 8 Secretarias – 2011 / 2012
(SEPLAG, SEFAZ, CGE, GABGOV, GABVICE, CASA MILITAR, CASA CIVIL,
CEDE)
