



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

*Secretaria do Planejamento
e Gestão*

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO– CPLOG

WEBMAPP

MONITORAMENTO DE AÇÕES E PROJETOS PRIORITÁRIOS

MANUAL PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA

COORDENAÇÃO:

PHILIPPE NOTTINGHAM

ELABORAÇÃO:

MARCOS MEDEIROS DE VASCONCELLOS

GEORGE KILMER CHAVES CRAVEIRO

COLABORAÇÃO:

KELLY ROSANA HOLANDA LAVOR

NAIANA CORRÊA LIMA

JOSÉ WAGNER ALVES FERNANDES

RAIMUNDO AVILTON MENESES JÚNIOR

2009

Sumário

1 - INTRODUÇÃO.....	3
2 - ACESSO AO SISTEMA.....	6
3 - MÓDULOS DO WEBMAPP.....	9
3.1 - Módulo de Planejamento.....	9
3.2 - Módulo de Acompanhamento.....	20
3.3 - Módulo de Monitoramento	28
3.4 - Módulo de Estágio de Execução.....	39
3.5 - Módulo de Consulta	44
3.6 - Módulo de GPR.....	50

1- INTRODUÇÃO

Em 2007, o Governo definiu uma nova metodologia de seleção e monitoramento de projetos, dando origem ao MAPP - Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários, cujo modelo foi inicialmente proposto, a pedido do Governador Cid Gomes, pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), tendo sido implementado e transformado no sistema gerencial WebMapp pela Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG). A principal finalidade desse sistema é servir como instrumento de planejamento e acompanhamento dos investimentos do Governo.

Nesse novo modelo, as secretarias propõem projetos tendo como referência o PPA e as diretrizes e políticas de Governo, sem estabelecer limites financeiros, ficando a decisão de aprovação a cargo do Governador do Estado. Para operacionalização desse modelo foi desenvolvido, conforme dissemos anteriormente, o Webmapp, ficando a cargo do SIAP – Sistema de Acompanhamento dos Projetos - a execução desses projetos. Em 2008, no entanto, os sistemas WebMapp e Siap foram fundidos num único sistema. O WebMapp especializou-se no apoio às funções de decisão e acompanhamento dos níveis estratégicos do Governo (Governador e Secretários), enquanto o SIAP acumulou todas as funções operacionais, além daquelas existentes nos módulos do WebMapp.

Convém ressaltar que o sistema WebMapp/SIAP está integrado a outros sistemas de informação do Estado (Sistema de Contabilidade, Sistema de Licitações, Sistema de Contratos e Convênios etc.) de forma que, além das informações geradas internamente, contém informações externas relevantes e necessárias ao acompanhamento das ações do Governo.

Antes de tratar sobre o sistema propriamente dito, é importante que o técnico responsável pelas tarefas realizadas nos sistemas corporativos compreenda com se dá a execução dos recursos públicos alocados nos projetos de investimentos, doravante denominados projetos Mapp.

Inicialmente, os projetos são propostos diretamente ao chefe do poder executivo. Nessas propostas são informados o escopo do projeto (bem ou serviço ofertado à sociedade), a localização (município), o custo e as fontes de recursos.

Uma vez aprovado, o projeto deve ser detalhado. Este detalhamento consiste na estruturação do projeto em fases e etapas de execução, bem como a identificação dos municípios contemplados com a aplicação dos recursos previstos. Esse detalhamento deve ser analisado e validado pela equipe técnica do governo responsável pelo planejamento governamental.

Paralelamente ao processo de detalhamento do projeto, o órgão setorial já pode iniciar o

processo licitatório, através do cadastro e publicação da Intenção de Gasto - IG, caso seja necessário.

Lembra-se que toda despesa deve estar contemplada na Lei Orçamentária Anual (LOA). Assim, este é o momento para verificar a existência de créditos orçamentários para fazer face às despesas a serem executadas no ano. Este procedimento de ajuste pode ser realizado até o momento de solicitação de recursos (solicitação de parcelas).

Uma vez aprovado o detalhamento da programação físico-financeira, devemos verificar se o programa de governo, onde o projeto aprovado deve ser executado, possui os recursos suficientes e, caso negativo, devemos então providenciar os ajustes necessários. No caso de convênios de receitas ou contratos de financiamento, devemos informar os valores e as previsões anuais.

É chegado o momento de cadastrar o Projeto Finalístico (PF). O projeto finalístico constitui o elemento de ligação entre o projeto Mapp e o orçamento. No PF, define-se a ação orçamentária e as fontes de recursos onde serão realizadas todas as despesas do projeto Mapp. Convém ressaltar que, atrelados ao PF, estão todos os contratos de execução das despesas referentes ao projeto, cadastradas no SACC, sistema administrado pela Controladoria Geral do Estado (CGE), órgão responsável pelo acompanhamento da execução dos contratos e convênios.

Antes da execução propriamente dita, o órgão precisa solicitar limite financeiro ao COGERF – Comitê de Gestão Fiscal. Esta solicitação é necessária somente para as fontes de recursos do Tesouro Estadual e do SWAP. Para realizar este procedimento, a licitação já deve estar devidamente homologada. O órgão deve informar o valor que deverá ser utilizado no exercício e uma previsão de desembolso mensal. Isto é imprescindível, pois, como se sabe, a fazenda estadual arrecada mensalmente os recursos, necessitando, portanto, de uma previsão da necessidade de caixa para fazer face às despesas dos projetos de investimento.

Com o projeto aprovado, créditos orçamentários e limites financeiros suficientes, o órgão inicia a execução física e financeira do projeto. A execução física será acompanhada mensalmente por ocasião da liberação de recursos financeiros através da solicitação de parcelas. Esse acompanhamento da execução física é importante, pois o governo precisa anualmente prestar contas à sociedade acerca da destinação dos recursos públicos. Esse controle é feito pela própria sociedade ou através do trabalho das controladorias e dos tribunais de contas. Assim, caberá aos técnicos dos órgãos executores manter estas informações atualizadas e consistentes.

A solicitação de parcelas será permitida apenas para os projetos com acompanhamento físico devidamente validado. Para solicitar o pagamento de despesas realizadas em determinado projeto, o órgão deverá informar o projeto Mapp, o gestor financeiro do recurso, o valor a ser

empenhado e pago, o código da dotação orçamentária e os contratos/convênios de receita e de despesa, caso os tenha.

É verificada, pelo sistema, a existência de saldo no projeto, nos contratos/convênios de despesa e no orçamento, e, caso afirmativo, essa parcela é enviada para a fazenda estadual que autorizará o empenho e o pagamento.

Por fim, todas as informações referentes à execução física e financeira são disponibilizadas, através dos sistemas informatizados, aos gestores públicos.

A Figura 1 mostra o fluxo de execução dos projetos Mapp.

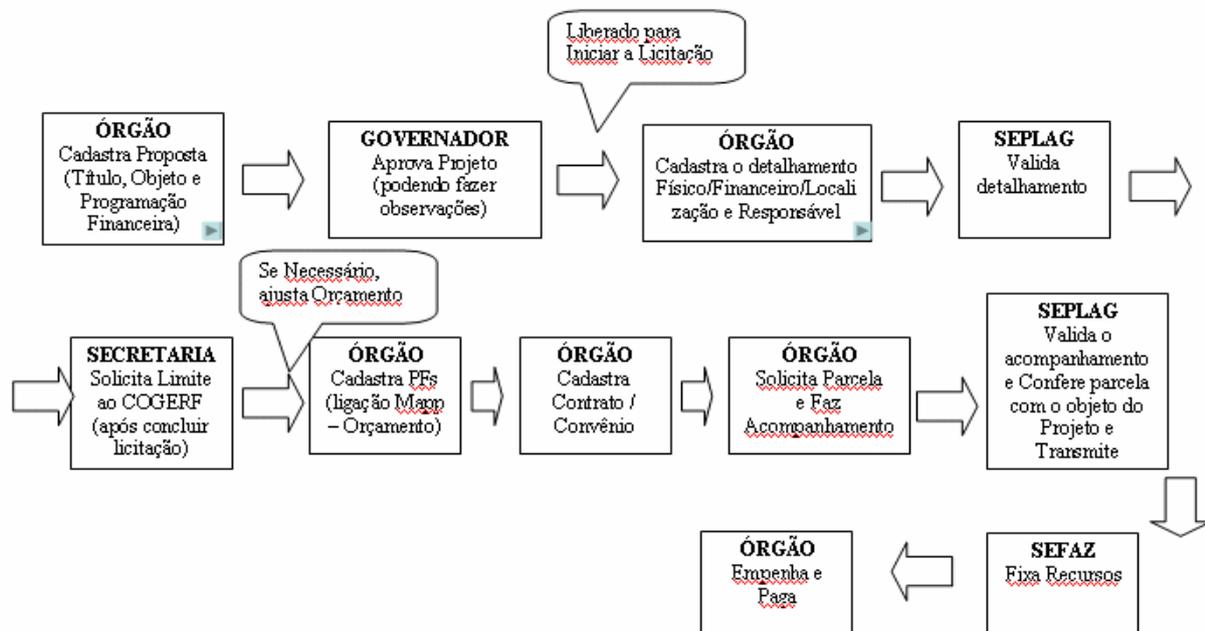


Figura 1 – Fluxo de execução dos projetos Mapp

2 - ACESSO AO SISTEMA

Para acessar o sistema, deve-se entrar na página da SEPLAG, no site www.seplag.ce.gov.br, selecionar no menu **Serviços** (à direita da tela) a opção **Acesso a Sistemas** e, em seguida, **SIAP/SIOF/WebMapp/PLANOS**, conforme ilustra a figura 2.

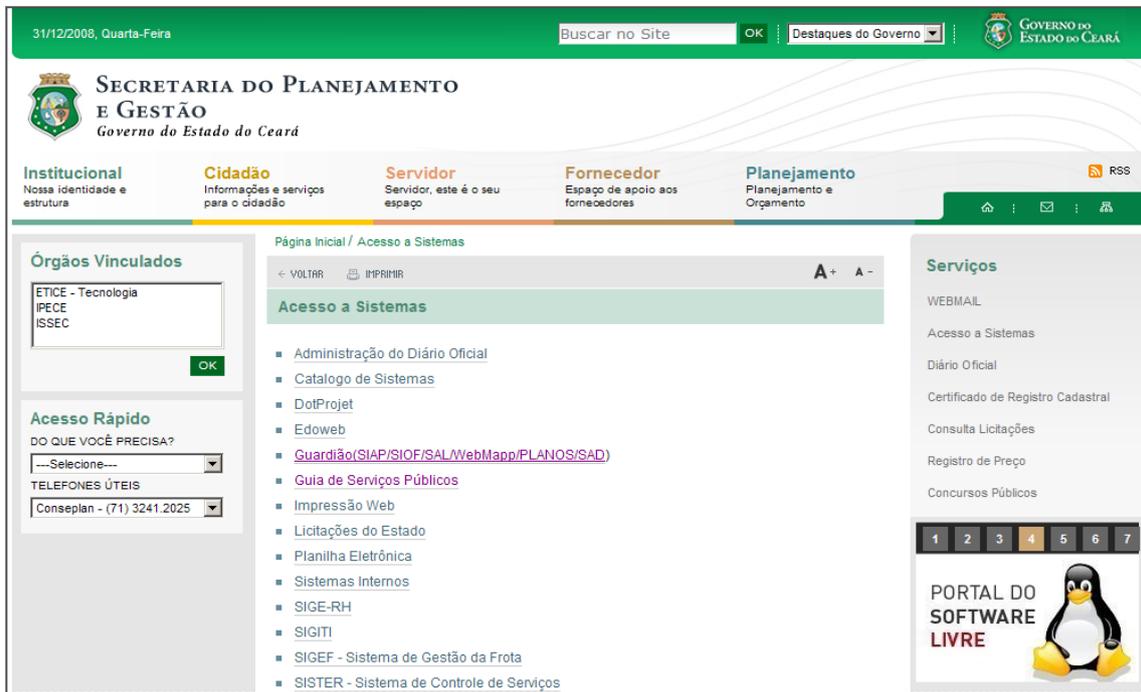


Figura 2 – Tela do site da SEPLAG

Em seguida, uma janela de acesso ao guardião do sistema é aberta; digita-se o CPF e a senha de acesso para abrir a janela de seleção de sistemas, conforme mostra a figura 3.

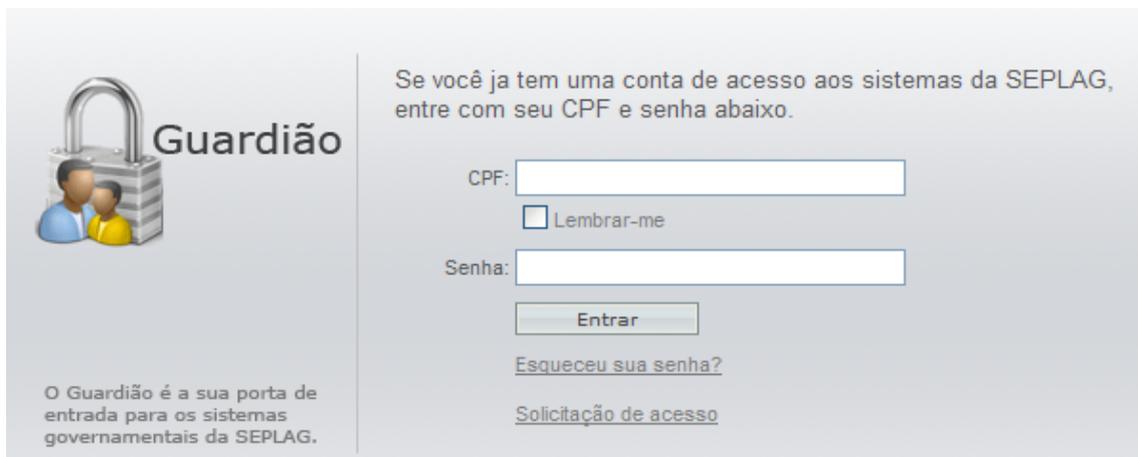


Figura 3 – Tela do Guardião

Caso ainda não se tenha senha de acesso ao guardião dos sistemas, o pedido poderá ser feito através do link [Solicitação de acesso](#). Somente a partir do encaminhamento desta solicitação à SEPLAG é que poderá ocorrer o cadastramento para acesso aos sistemas.

Para solicitar acesso a um ou mais sistemas, deve-se clicar no botão **Quero me cadastrar** e proceder ao preenchimento dos campos. A figura 4 ilustra a tela de cadastramento da solicitação de acesso aos sistemas.



Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG
Solicitação de Acesso aos Sistemas SEPLAG - 2007

Através desta ferramenta é possível fazer solicitação de acesso aos seguintes sistemas da SEPLAG:
SIAP, SIOF, SACC, SIEG, SDE.

Reimpressão da solicitação:
CPF:

Figura 4 – Tela de cadastramento da solicitação de acesso aos sistemas

As janelas se sucederão e, ao final de cada grupo de campos para preenchimento, acessa-se o seguinte clicando no botão **Próximo**. Ao final, fecha-se a rotina e acessa-se novamente a página inicial de cadastro. Novamente na página de cadastramento, deve-se clicar no botão **Reimpressão da solicitação** e digitar o CPF. Esse comando permite a impressão do formulário de solicitação de acesso ao(s) sistema(s) que deverá ser assinado pelo gestor do Órgão/Entidade e encaminhado diretamente ao Atendimento SEPLAG.

No caso de já se ter acesso ao Guardiã, é necessário apenas o envio de um ofício à SEPLAG, solicitando o acesso ao WebMapp.

O Atendimento SEPLAG procederá à análise e, uma vez aprovada a solicitação, enviará por e-mail uma senha provisória, que poderá ser alterada posteriormente.

The screenshot shows a registration form titled "Solicitação de Acesso aos Sistemas SEPLAG - 2007" from the "Governo do Estado do Ceará, Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG". The form is titled "Dados básicos do usuário" and includes the following fields: "Nome completo", "Email principal", "Outro email", "Instituição atual" (a dropdown menu with "ADAGRI" selected), "Nº CPF", and "Fone p/ contato". A "Próximo >>" button is located at the bottom of the form.

Figura 5 – Tela de cadastramento das informações da solicitação de acesso

Uma vez cadastrado e estando na página inicial do Guardião, seleciona-se o sistema desejado, no caso, o WebMapp Setorial. A figura 6 mostra essa janela.

The screenshot shows the "Guardião" dashboard for user "MARCOS MEDEIROS DE VASCONCELLOS" (marcosv@seplag.ce.gov.br). The dashboard features a grid of system icons and descriptions:

- SIAP**: SIAP - Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas 2007
- SAD**: Sistema de Acompanhamento de Desempenho
- SACC**: 2. SACC - Sistema Acompanhamento de Contratos e Convênios - 2007
- SIOF**: 3. SIOF - Sistema Orçamento Financeiro
- SIAP**: SIAP - Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas 2008
- PLANOS**: Planos de Ação
- WebMapp**: MAPP - Homologação
- WebMapp**: MAPP - Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários
- SIOF 2008**: Sistema Integrado Orçamentário e Financeiro
- SACC**: 2. SACC - Sistema Acompanhamento de Contratos e Convênios - 2008

An "Alterar Senha" button is visible in the top right corner.

Figura 6 – Tela de listagem dos sistemas

Antes da navegação pelo WebMapp, atenção ao botão **Alterar Senha** que permite a alteração da senha enviada pelo Atendimento SEPLAG.

3 - MÓDULOS DO WEBMAPP

O acesso ao WebMapp leva inicialmente ao módulo de planejamento – **Mapp Planejamento**. A partir dessa janela, pode-se acessar os demais módulos: Acompanhamento, Monitoria, Estágio de Execução, Mapp Consulta e GPR. Os ícones de acesso podem ser vistos na parte superior da janela, conforme mostra a figura 7.

The screenshot shows the 'WebMapp Planejamento' interface. At the top, there is a navigation menu with icons for 'Planejamento', 'Acompanhamento', 'Monitoria', 'Estágio de Execução', 'Mapp Consulta', 'GPR', and 'Sair'. Below the menu, there are search filters for 'Secretaria', 'Órgão', 'Programa', 'Status', and 'Fonte'. A table displays project data with columns for 'Código', 'Secretaria', 'Qtde Mapp', and 'Valor Total'.

Código	Secretaria	Qtde Mapp	Valor Total
30000000	CASA CIVIL - CASA CIVIL	49	240.616.693,52
14000000	CASA MILITAR - CM	15	4.229.820,84
49000000	CONSELHO DE POLÍTICAS E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE - CONPAM	93	80.413.727,18
48000000	CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - CEDE	41	20.033.003,18
17000000	CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CEE	34	9.007.563,09
41000000	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO - CGE	50	4.162.286,32
06000000	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO - DPG	14	8.642.265,10
11000000	GABINETE DO GOVERNADOR - GG	21	17.651.892,83
12000000	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - GVG	12	2.304.512,92
13000000	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE	25	10.724.231,66
31000000	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR - SECITECE	432	361.687.200,48
27000000	SECRETARIA DA CULTURA - SECULT	343	244.057.428,23
22000000	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	451	567.510.660,39
19000000	SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	34	250.533.445,16
08000000	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	461	3.723.327.421,73
18000000	SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA - SEJUS	101	171.778.699,42
24000000	SECRETARIA DA SAÚDE - SESA	753	682.882.466,11
10000000	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS	472	441.520.430,07

Figura 7 – Tela inicial do módulo de Planejamento do WebMapp

A seguir será apresentado cada um dos módulos, em separado, e mostrado suas funcionalidades.

3.1 - Módulo de Planejamento

O Módulo de Planejamento é responsável pela inserção de informações referentes ao planejamento do governo no período de 2007 a 2010, caracterizando-se por ser o espaço onde são cadastrados os projetos no sistema.

Para cadastrar um novo projeto, a secretaria deverá informar a descrição do projeto, observações (informações relevantes), detalhamento físico, em forma de texto, e as fontes de recursos. Importa ressaltar que, neste momento, o sistema não faz nenhuma crítica quanto à existência de previsão orçamentária dos recursos ou mesmo, no caso das operações de crédito

ou convênio de receita, se a secretaria já contratou os recursos previstos. A secretaria tem total liberdade para elaborar o projeto. É importante também que se saiba que os valores programados nos projetos servirão de limites financeiros para os projetos finalísticos a ele vinculados.

Neste momento, será necessário também que se classifique o projeto em estratégico de governo, estratégico setorial ou complementar. A seguir serão descritas as características de cada tipo de projeto.

Os projetos estratégicos de governo são aqueles projetos estruturantes, fundamentais à consecução dos resultados de Governo. São características desses projetos:

- impactam com grande intensidade o alcance dos resultados Estratégicos de governo;
- contribuem para alavancar a economia cearense e/ou encaminham significativamente problemas sociais relevantes;
- requerem gerenciamento intensivo dos órgãos responsáveis pela gestão do Governo (SEPLAG, CGE, SEFAZ, CASA CIVIL e GABGOV) e da Setorial responsável;
- os projetos desse grupo, em regra, representam os grandes compromissos do Governo.

Os projetos estratégicos setoriais são aqueles projetos importantes para obtenção dos resultados setoriais, embora estejam num nível de importância inferior em relação aos estratégicos de governo. São características desses projetos:

- contribuem para o alcance dos resultados de governo.
- participam e/ou asseguram o alcance das metas das políticas setoriais.
- exigem gerenciamento intensivo da Setorial responsável.

Os projetos complementares são aqueles projetos que atuam complementarmente à ação de governo. São características desses projetos:

- atuam para viabilizar a complementação das metas setoriais.
- são necessários para o funcionamento da máquina do Governo.
- em regra, são de menor custo e complexidade

Ao ser cadastrado um novo projeto, este adquire o status de proposta. A partir desse momento, a proposta de projeto estará, então, disponível para a apreciação do Governador, que poderá lhe conferir o status de aprovado, negado ou pendente.

Uma vez negado, o projeto ficará bloqueado no sistema, por um mês, e depois será excluído. O Governador poderá também classificá-lo como pendente, significando que precisa de informações adicionais para concluir a análise ou que não considera oportuna sua execução. Nessas hipóteses, convém que o órgão tome a iniciativa de entrar em contato com o Governador para oferecer mais esclarecimentos sobre o referido projeto. Uma vez aprovado, o órgão responsável deve dar início à execução do projeto.

No módulo de Planejamento, depara-se na parte superior com cinco caixas de seleção. São elas: *Secretaria*, *Órgão*, *Programa*, *Status* (Proposta, Aprovado, Pendente e Negado) e *Fonte*.



Figura 8 – Tela de seleção da consulta do módulo de planejamento do WebMapp

Logo abaixo, há um quadro com as seguintes informações: Código da Secretaria, Descrição da Secretaria, Quantidade de Projetos e Valor Total Programado para todos os anos. Assim, ao se entrar no módulo sem nenhuma seleção, é mostrado o valor total de todas as Secretarias e suas vinculadas, em todos os anos, em todos os programas, em todas as fontes e em todos os projetos, inclusive os que se encontram ainda como propostas e pendentes.

WebMapp Planejamento
Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários

Técnicos Seplag
GEORGE KILMER CHAVES CRAVEIRO (11 usuários online)

Planejamento Acompanhamento Monitoria Estágio de Execução Mapp Consulta GPR Sair

Mapp Planejamento

Secretaria: Todas as Secretarias

Órgão:

Programa: Selecione um Programa de Governo

Status: Todos Fonte: Todas as Fontes

Código	Secretaria	Qtde Mapp	Valor Total
30000000	CASA CIVIL - CASA CIVIL	49	240.616.693,52
14000000	CASA MILITAR - CM	15	4.229.820,84
49000000	CONSELHO DE POLÍTICAS E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE - CONPAM	94	80.802.546,23
48000000	CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - CEDE	41	20.033.003,18
17000000	CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CEE	34	9.007.563,09
41000000	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO - CGE	50	4.162.286,32
06000000	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO - DPG	14	3.642.265,10
11000000	GABINETE DO GOVERNADOR - GG	21	17.651.892,83
12000000	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - GVG	12	2.304.512,92
13000000	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE	25	10.724.231,66
31000000	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR - SECITECE	432	361.687.200,48
27000000	SECRETARIA DA CULTURA - SECULT	343	244.957.428,23
22000000	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	451	567.510.660,39
19000000	SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	34	250.533.445,16
08000000	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	461	3.723.327.421,73
18000000	SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA - SEJUS	101	171.778.699,42
24000000	SECRETARIA DA SAÚDE - SESA	758	683.150.563,39
10000000	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS	472	441.520.430,07
43000000	SECRETARIA DAS CIDADES - SCADES	671	2.150.089.298,35
21000000	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA	177	693.426.258,70
42000000	SECRETARIA DO ESPORTE - SESPORTE	105	80.313.793,78
46000000	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG	144	173.255.883,64
47000000	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS	187	398.595.847,61
36000000	SECRETARIA DO TURISMO - SETUR	67	869.596.746,19
29000000	SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH	232	1.334.363.430,36
TOTAL GERAL		4990	12.542.281.923,19

RESUMO FINANCEIRO GERAL

	Valor 2007 (A)	Valor 2008 (B)	Valor 2009 (C)	Valor 2010 (D)	Valor Total (A+B+C+D)
TOTAL GERAL	681.462.877,86	1.927.460.711,57	6.679.988.363,51	3.253.371.970,25	12.542.281.923,19

Copyright © SEPLAG 2009. Todos os direitos reservados. **SEPLAG**

Figura 9 - Tela inicial do módulo de Planejamento do WebMapp

Ainda na tela apresentada na figura 9, temos outro quadro denominado RESUMO FINANCEIRO GERAL e ao seu lado o símbolo (+). Ao se clicar nesse símbolo, acessa-se informações relativas ao planejamento organizadas por fonte orçamentária.

À medida que são feitas as seleções nas caixas apresentadas, as informações são filtradas até que se chegue à consulta desejada. Observa-se que ao ser clicada a caixa de seleção a mesma abrirá uma listagem de opções, onde se pode indicar a opção desejada colocando o cursor sobre a mesma e clicando.

Vale ressaltar que, ao serem feitas as seleções nos filtros, o RESUMO FINANCEIRO GERAL se modificará automaticamente por Secretaria, órgão e programa, como demonstrado nas figuras 11, 12 e 13, respectivamente.

Em todas as opções de consulta citadas anteriormente, o quadro terá as seguintes colunas: fonte, valor 2007, valor 2008, valor 2009, valor 2010 e valor total.

RESUMO FINANCEIRO GERAL					
Fonte	Valor 2007 (A)	Valor 2008 (B)	Valor 2009 (C)	Valor 2010 (D)	Valor Total (A+B+C+D)
(00)-(01) Tesouro	182.826.569,39	752.348.849,10	2.268.460.940,44	879.075.436,17	4.082.711.795,10
(07) Salário-Educação	0,00	7.335.625,66	13.637.701,95	4.095.725,00	25.069.052,61
(10) FECOP	63.939.076,95	163.226.556,66	280.982.402,11	32.515.022,67	540.663.058,39
(11) CIDE	32.269.340,87	32.843.125,42	41.439.811,79	24.600.000,00	131.152.278,08
(19) FEPA	0,00	1.448.065,89	0,00	0,00	1.448.065,89
(21) Governo Municipal - Aplicação Direta	391.732,29	9.333.458,43	35.511.618,60	11.349.240,33	56.586.049,65
(22) Governo Federal - Aplicação Direta	14.351.451,26	152.616.394,20	304.906.047,34	186.155.400,00	658.029.292,80
(23) Órgãos Privados - Aplicação Direta	1.000.000,00	5.120.902,09	17.007.834,27	16.796.502,22	39.925.238,58
(24) Órgãos Internacionais - Aplicação Direta	0,00	432.865,78	2.466.225,30	0,00	2.899.091,08
(40) SWAP A	14.838.323,45	144.291.419,78	364.808.978,47	117.780.795,42	641.719.517,12
(44) Royalties	-4.001.306,86	10.990.261,62	31.926.213,69	1.302.235,00	48.220.017,37
(45) Crédito Interno - BNDES	41.786.652,76	49.691.048,75	370.204.133,51	221.379.186,61	683.061.021,63
(48) Crédito Externo - Tesouro	233.000,00	9.428.725,10	5.285.200,00	0,00	14.946.925,10
(50) FUNDEB	0,00	46.408.167,75	91.047.189,50	18.973.288,74	156.428.645,99
(55) Crédito Interno - BNB	32.454.607,16	33.949.449,24	61.717.729,68	0,00	128.121.786,08
(56) Crédito Interno - CEF	11.743.125,14	10.053.205,17	43.051.781,44	200.986.422,92	265.834.534,67
(57) Crédito Externo - KFW	1.390.508,06	1.286.154,54	5.054.110,44	18.839.210,28	26.569.963,32
(58) Crédito Externo - BIRD	1.977.622,64	39.485.707,63	83.346.467,81	176.809.753,60	301.619.551,68
(59) Crédito Externo - BID	0,00	2.189.480,00	533.819.786,85	178.860.837,62	714.870.104,47
(70) Recursos Próprios	14.590.187,06	51.770.315,62	199.026.719,21	46.063.603,93	311.450.825,82
(71) Crédito Interno - Outras Fontes	15.884.154,81	6.436.684,06	50.693.706,91	58.423.072,70	131.437.618,48
(72) Crédito Externo - Outras Fontes	14.004.799,19	29.610.211,56	72.626.552,47	40.141.344,25	156.382.907,47
(75) Medida Compensatória Ambiental	0,00	747.081,41	13.331.875,00	3.180.348,14	17.259.304,55
(80) Órgãos Internacionais - Adm. Direta	0,00	176.936,35	1.776.907,55	0,00	1.953.843,90
(82) Governo Federal - Adm. Direta	146.600.660,67	197.779.643,18	1.281.148.290,87	665.912.479,06	2.291.441.073,78
(83) Governo Federal - Adm. Indireta	81.475.074,23	133.755.094,99	432.299.245,53	349.995.565,59	997.524.980,34
(86) Governo Municipal - Adm. Direta	100.000,00	377.909,62	4.080.335,11	136.500,00	4.694.744,73
(87) Governo Municipal - Adm. Indireta	0,00	132.993,90	188.006,10	0,00	321.000,00
(89) Órgãos Privados - Adm. Indireta	0,00	122.885,93	2.984.511,67	0,00	3.107.397,60
(90) Governo Federal - PADH	5.604.685,07	30.113.910,56	39.048.511,04	0,00	74.767.106,67
(91) SUS	0,00	3.957.581,58	27.747.528,66	0,00	31.705.110,24
(99) Aplicação Direta de Outras Entidades	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
Outras fontes - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	681.462.877,86	1.927.460.711,57	6.679.986.363,51	3.253.371.970,25	12.542.281.923,19

[Incluir Projeto](#)

Copyright© SEPLAG 2009. Todos os direitos reservados SEPLAG

Figura 10 – Tela do Resumo Financeiro Geral no módulo de planejamento

WebMapp Planejamento						
Mapp Planejamento		Órgão	Otdc Mapp	Valor Total		
Secretaria:	49000000 - CONSELHO DE POLÍTICAS E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE (CONPAM)		54	25.106.038,86		
Órgão:	Todos os Órgãos		2	851.000,00		
Programa:			4	22.231.846,15		
Status:	Todos	Fonte:	[(00)-(01) Tesouro]			
Buscar						
TOTAL GERAL			60	48.188.885,01		
RESUMO FINANCEIRO GERAL - POR SECRETARIA						
	Valor Anterior Mapp	Valor 2007 (A)	Valor 2008 (B)	Valor 2009 (C)	Valor 2010 (D)	Valor Total (A+B+C+D)
TOTAL GERAL	0,00	268.818,30	4.631.213,00	35.109.153,71	8.179.700,00	48.188.885,01

[Incluir Projeto](#)

Copyright© SEPLAG 2009. Todos os direitos reservados SEPLAG

Figura 11 – Tela do Resumo Financeiro Geral, por Secretaria, no módulo de planejamento

WebMapp Planejamento
Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários

Técnicos Seplag
GEORGE HILMER CHAVES CRAVEIRO (15 44 44 0116)

Planejamento Acompanhamento Monitoria Estágio de Execução Mapp Consulta GPR Sair

Mapp Planejamento

Secretaria: 49000000 - CONSELHO DE POLÍTICAS E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE (CONPAM)

Órgão: 49200002 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (FEMA)

Programa: Todos os Programas de Governo

Status: Todos Fonte: (00)-(01) Tesouro

Projeto MAPP	Entidade	Status	Valor Total	Fonte
001 Aquisição de 11 Estações Fixas e Móveis de Monitoramento do Ar.	FEMA	Aprovado	351.000,00	
015 Execução de obras e ornamentações do Parque do Cocó	FEMA	Aprovado	500.000,00	
1				

RESUMO FINANCEIRO GERAL - POR ÓRGÃO

	Valor Anterior Mapp	Valor 2007 (A)	Valor 2008 (B)	Valor 2009 (C)	Valor 2010 (D)	Valor Total (A+B+C+D)
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	851.000,00	0,00	851.000,00

Copyright© SEPLAG 2009. Todos os direitos reservados **SEPLAG**

Figura 12 – Tela do Resumo Financeiro Geral, por Órgão, no módulo de planejamento

WebMapp Planejamento
Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários

Técnicos Seplag
GEORGE HILMER CHAVES CRAVEIRO (15 44 44 0116)

Planejamento Acompanhamento Monitoria Estágio de Execução Mapp Consulta GPR Sair

Mapp Planejamento

Secretaria: 27000000 - SECRETARIA DA CULTURA (SECULT)

Órgão: 27000000 - SECRETARIA DA CULTURA (SECULT)

Programa: 074 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Status: Todos Fonte: (00)-(01) Tesouro

Projeto MAPP	Entidade	Status	Valor Total	Fonte
125 Formação em Arte e Cultura para Pessoas com Deficiência	SECULT	Aprovado	370.000,00	
168 Implantação do I Edital de Incentivo às Artes para Pessoas com Deficiência.	SECULT	Aprovado	607.000,00	
169 Festivais Regionais de Arte e Cultura para Pessoas com Deficiência.	SECULT	Aprovado	400.000,00	
297 Implantação do II Edital de incentivo às Artes para Pessoas com Deficiência.	SECULT	Proposta	1.800.000,00	
330 II Formação em Arte e Cultura para Pessoas com Deficiência	SECULT	Proposta	800.000,00	
1				

RESUMO FINANCEIRO GERAL - POR PROGRAMA

	Valor Anterior Mapp	Valor 2007 (A)	Valor 2008 (B)	Valor 2009 (C)	Valor 2010 (D)	Valor Total (A+B+C+D)
TOTAL GERAL	0,00	0,00	370.000,00	2.307.000,00	1.300.000,00	3.977.000,00

Copyright© SEPLAG 2009. Todos os direitos reservados **SEPLAG**

Figura 13 – Tela do Resumo Financeiro Geral, por Programa, no módulo de planejamento

WebMapp Planejamento
Monitoramento de Ativos e Projetos Prioritários

Técnicos SEPLAG
GEORGE HILMER CHAVES CRAVEIRO (12 estados online)

Planejamento Acompanhamento Monitoria Estágio de Execução Mapp Consulta GPR Sair

Mapp Planejamento

Secretaria: 48000000 - CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CEDE)

Órgão: 48000000 - CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CEDE)

Programa: Todos os Programas de Governo

Status: Todos Fonte: Todas as Fontes

Essa lupa me fornece a fonte de cada projeto MAPP

Projeto MAPP	Entidade	Status	Valor Total	Fonte																					
018 Aquisição de 2 veículos (1 tipo SUV e 1 tipo Hatch) para o CEDE	CEDE	Aprovado	189.000,00																						
019 Organização, Tratamento e Automação do Arquivo Corrente do CEDE	CEDE	Aprovado	78.835,00																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonte</th> <th>Aprovado Ant. Mapp</th> <th>2007 (A)</th> <th>2008 (B)</th> <th>2009 (C)</th> <th>2010 (D)</th> <th>Total (A+B+C+D)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(00)-(01) Tesouro.</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>78.835,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>78.835,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GERAL</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>78.835,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>78.835,00</td> </tr> </tbody> </table>					Fonte	Aprovado Ant. Mapp	2007 (A)	2008 (B)	2009 (C)	2010 (D)	Total (A+B+C+D)	(00)-(01) Tesouro.	,00	,00	78.835,00	,00	,00	78.835,00	TOTAL GERAL	,00	,00	78.835,00	,00	,00	78.835,00
Fonte	Aprovado Ant. Mapp	2007 (A)	2008 (B)	2009 (C)	2010 (D)	Total (A+B+C+D)																			
(00)-(01) Tesouro.	,00	,00	78.835,00	,00	,00	78.835,00																			
TOTAL GERAL	,00	,00	78.835,00	,00	,00	78.835,00																			
020 Implantação do Sistema de Climatização/Refrigeração do CEDE.	CEDE	Aprovado	25.510,00																						
021 Implantação da Rede Estruturada de TI	CEDE	Aprovado	63.608,00																						
022 Pavimentação do acesso ao distrito industrial do Cariri.	CEDE	Proposta	1.493.980,61																						
023 Aquisição de Equipamentos de TI - CEDE	CEDE	Proposta	85.000,00																						
024 Aquisição de Aparelhos de FAX SIMILE para o CEDE	CEDE	Proposta	1.607,95																						

1

RESUMO FINANCEIRO GERAL - POR ÓRGÃO

	Valor Anterior Mapp	Valor 2007 (A)	Valor 2008 (B)	Valor 2009 (C)	Valor 2010 (D)	Valor Total (A+B+C+D)
TOTAL GERAL	0,00	0,00	1.850.933,61	86.607,95	0,00	1.937.541,56

Copyright © SEPLAG 2009. Todos os direitos reservados

SEPLAG

Figura 14 – Tela do Resumo Financeiro Geral, por Programa e Fonte, no módulo de planejamento

Na última coluna do quadro, ao lado da coluna indicativa do valor total do projeto, conforme ilustra a figura 14, há uma lupa. Clicando neste ícone, vê-se um quadro onde constam os valores programados por ano e fonte para o referido projeto. Caso se deseje entrar no projeto, basta clicar na descrição do mesmo e o sistema abrirá a janela correspondente.

O botão **Incluir Projeto** é a porta de entrada para informações de planejamento no Webmapp. Clicando nesse botão, abre-se uma janela em que é solicitada a descrição do projeto MAPP, informações adicionais e relevantes a serem inseridas no campo para observação e o detalhamento físico textual. Será solicitado também que o projeto seja classificado como: estratégicos de governo, estratégico setorial e complementar.

Ao se salvar as informações cadastradas, pressionando o botão **Gravar Projeto**, aparecerá o quadro Mapp Financeiro, conforme ilustra a figura 16.

Quando o botão **Incluir Financiador** é pressionado, abre-se uma caixa onde deverá ser selecionada a fonte e indicados os valores programados para os anos de 2007 a 2010, conforme mostra a figura 17.

WebMapp Planejamento
Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários

Técnicos Seplog
GEORGE HILMER CHAVES CRAVEIRO (27) 41.810.0146

Planejamento Acompanhamento Monitoria Estágio de Execução Mapp Consulta GPR Sair

Mapp Planejamento

Secretaria: 31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR (SECITECE) Ordenar por Código

Órgão: 31200006 - FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ (NUTEC) Ordenar por Código

Programa: 196 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Status: Todos Fonte: Todas as Fontes

Descrição Projeto Mapp:

Data Aprovação:

Status: Pendente Aprovado Proposta Negado

Observação:
* A informação cadastrada nesse campo é apenas um informativo adicional sobre o Projeto Mapp, não é considerada Estágio Financeiro e com isso não é refletida no MAPP Acompanhamento.

Prioridade do Projeto: Estratégico de Governo Estratégico de Setorial Complementar

Detalhamento Físico:

Gravar Projeto Voltar p/ Listagem

Figura 15 – Tela de solicitação da proposta de projeto Mapp

Mapp Planejamento

Secretaria: 43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES (SCIDADES) Ordenar por Código

Órgão: 43200002 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ (CAGECE) Ordenar por Código

Programa: 711 - SANEAMENTO AMBIENTAL DO CEARÁ

Status: Todos Fonte: (40) SWAP A

Descrição Projeto Mapp: PAC OGU/SANEAR II - Implantação do Macro Sistema do SES em Fortaleza (Cocô/Interceptor)

Status: Pendente Aprovado Proposta Negado

Observação: Entrega da proposta programada 20/04/08
Casa Civil em 06/03/08
* A informação cadastrada nesse campo é apenas um informativo adicional sobre o Projeto Mapp, não é considerada Estágio Financeiro e com isso não é refletida no MAPP Acompanhamento.

Editar Projeto Excluir Projeto Voltar p/ Listagem

Mapp Financeiro

Fonte	Aprovado Anterior ao MAPP	Limite	2007 (A)	2008 (B)	2009 (C)	2010 (D)	Total (A+B+C+D)	
(82) Governo Federal - Adm. Direta	0,00	0,00	0,00	33.316.611,20	8.329.152,80	0,00	41.645.764,00	Editar Deletar
(72) Crédito Externo - Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	8.329.152,80	2.082.288,20	0,00	10.411.441,00	Editar Deletar
(40) SWAP A	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	9.493.288,00	0,00	10.493.288,00	Editar Deletar
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	42.645.764,00	19.904.729,00	0,00	62.550.493,00	

Incluir Financiador

Figura 16 - Tela de cadastramento das fontes de recursos da proposta de projeto Mapp

Projeto Mapp: CONSULTORIA PARA TRANSPORTE ESCOLAR

* A informação cadastrada nesse campo é apenas um informativo adicional sobre o Projeto Mapp, não é considerada Estágio Financeiro e com isso não é refletida no MAPP Acompanhamento.

Aprovado Anterior ao MAPP	Limite	2007	2008	2009	2010	
0	0	0	0	0	0	Gravar Cancelar

Figura 17 - Quadro de inclusão das fontes de recursos da proposta de projeto Mapp

Este procedimento deve ser repetido até que todas as fontes de receitas estejam listadas no sistema, quando, então, se pressionará o botão **Voltar p/ Listagem**. Caso se deseje excluir o projeto, basta clicar no botão correspondente. Somente os projetos com status de proposta podem ser excluídos. Projetos com status de aprovado ou pendente somente podem ser excluídos pelo Governador. Os negados são excluídos de forma automática pelo sistema após 30 dias. Caso se deseje fazer alteração no projeto, o sistema dispõe da opção **Editar Projeto**. Clicando neste botão, pode-se alterar o programa ou mesmo a descrição do projeto com status de proposta.

Outra funcionalidade importante é a alteração dos valores das fontes de recursos. No Mapp Financeiro, na última coluna do lado direito, temos dois botões: **Editar** e **Deletar**. O botão **Editar** permite a alteração da fonte e/ou dos valores programados, enquanto o botão **Deletar** possibilita a exclusão da fonte por completo.

Na tela de edição do projeto, pode-se acessar também o quadro de detalhamento da programação físico-financeira dos produtos e subprodutos por município. Cabe lembrar que este quadro somente pode ser visualizado após o mesmo ter sido cadastrado no SIAP.

Já se sabe como são inseridas as informações no sistema. Cabe-nos, agora, aprender a navegar nesse módulo.

Como foi dito anteriormente, o sistema possui, na parte superior da tela, caixas de seleção.

The screenshot displays the 'WebMapp Planejamento' interface. At the top, there are navigation tabs: Planejamento, Acompanhamento, Monitoria, Estágio de Execução, Mapp Consulta, GPR, and Sair. The main area is titled 'Mapp Planejamento' and contains several dropdown menus for filtering: Secretaria (43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES (SCIDADES)), Órgão (Todos os Órgãos), Programa, Status (Todos), and Fonte (Todas as Fontes). There are 'Ordenar por Código' buttons for the first two dropdowns. A 'Buscar' button is located below the filters. Below the filters is a table with the following data:

Código	Órgão	Ode Mapp	Valor Total
43200002	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	92	698.098.737,68
43000000	SECRETARIA DAS CIDADES - SCIDADES	603	1.462.854.014,99
TOTAL GERAL		695	2.160.952.752,67

Below the table is a section titled 'RESUMO FINANCEIRO GERAL - POR SECRETARIA' with a sub-table:

	Valor Anterior Mapp	Valor 2007 (A)	Valor 2008 (B)	Valor 2009 (C)	Valor 2010 (D)	Valor Total (A+B+C+D)
TOTAL GERAL	21.937.949,48	89.674.123,26	165.898.461,08	794.982.805,92	1.088.459.412,93	2.160.952.752,67

At the bottom right of the interface is an 'Incluir Projeto' button. The footer contains 'Copyright © SEPLAG 2009. Todos os direitos reservados' and the 'SEPLAG' logo.

Figura 18 – Tela principal do módulo de planejamento para o órgão - Cagece

Usando como referência a Cagece: deve-se selecionar a secretaria a que estiver vinculada, no caso a Secretaria das Cidades e depois o órgão, Cagece, conforme está mostrado nas figuras 18 e 19. Em seguida, o sistema disponibilizará a seleção do programa. Nesse momento, o sistema já listou, no quadro abaixo, todos os projetos MAPP daquele órgão, bem como o status e o valor total.

WebMapp Planejamento
Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários

Técnicos Seplag
GEORGE HILMER CHAVES CRAVEIRO (18 de março de 2011)

Planejamento Acompanhamento Monitoria Estágio de Execução Mapp Consulta GPR Sair

Mapp Planejamento

Secretaria: 43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES (SCIDADES)

Órgão: 43200002 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ (CAGECE)

Programa: Todos os Programas de Governo

Status: Todos Fonte: (00)-(01) Tesouro

Projeto MAPP	Entidade	Status	Valor Total	Fonte
001 PAC FUNASA - Ampliação do SES em Barroquinha	CAGECE	Aprovado	166.106,73	
002 PAC FUNASA - Implantação de SES em Poranga	CAGECE	Aprovado	197.016,87	
003 PAC FUNASA - Ampliação de SES em Santana do Cariri	CAGECE	Aprovado	359.689,02	
007 PAC FGTS/SANEAR II - Implantação do SES da Bacia CD-3 em Fortaleza	CAGECE	Aprovado	3.240.408,31	
010 SANEAR II - Conclusão de Obras de Ampliação de SES nas Bacias K-2, SD-2, SD-3, SD-4 e SD-5 em Fortaleza	CAGECE	Aprovado	8.750.957,66	
011 SANEAR II - Conclusão de Obras de Ampliação do SAA em Santa Quitéria	CAGECE	Aprovado	305.302,82	
012 PAC FGTS/SANEAR II - Ampliação do SAA em Aracati	CAGECE	Aprovado	5.721.175,88	
013 PAC MCS/SANEAR II - Implantação do SES em Crateús	CAGECE	Aprovado	931.733,77	
014 SANEAR II - Ampliação do SAA em Mombaça	CAGECE	Aprovado	1.848.207,06	
015 SANEAR II - Desenvolvimento Institucional da CAGECE	CAGECE	Aprovado	12.862.754,11	
017 PAC FUNASA - Implantação de SES em Marco	CAGECE	Aprovado	176.448,22	
020 PAC MCS/SANEAR II - Implantação de SES em Aracati	CAGECE	Aprovado	5.933.225,66	
021 PAC MCS/SANEAR II - Implantação de SES em Quixadá	CAGECE	Aprovado	4.010.167,36	
022 KFW II - Gerenciamento das Obras de Saneamento Básico em 29 Municípios	CAGECE	Aprovado	4.851.964,41	
025 PAC FGTS/SANEAR II - Ampliação do SES da Bacia CE-4 em Fortaleza	CAGECE	Aprovado	1.874.008,24	
026 PAC FGTS/SANEAR II - Ampliação do SES da Bacia CE-5 em Fortaleza	CAGECE	Aprovado	4.781.288,04	
030 PAC FGTS/SANEAR II - Implantação do SES da Bacia CD-1 em Fortaleza	CAGECE	Aprovado	2.030.355,71	
031 PAC FGTS/SANEAR II - Implantação do SES da Bacia CD-2 em Fortaleza	CAGECE	Aprovado	2.163.550,27	
032 SANEAR II - Gestão do Programa	CAGECE	Aprovado	19.814.793,75	
033 Desenvolvimento Institucional da Cagece - Substituição de rede de cimento amianto em diversos sistemas de abastecimento de água no Estado do Ceará	CAGECE	Pendente	14.861.196,72	
035 PAC Funasa - Elaboração de Projeto Executivo dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário dos municípios com até 50 mil habitantes beneficiados pela transposição do São Francisco.	CAGECE	Aprovado	565.226,16	
036 PAC 50 a 150 mil - Midades - Implantação do Sistema de Abastecimento de Água em Aquiraz	CAGECE	Aprovado	3.514.470,57	
037 PAC 50 a 150 mil - Midades - Ampliação e Melhorias na ETA do Sistema de Abastecimento de Água de Pacajus, Horizonte e Chorozinho	CAGECE	Aprovado	163.587,92	
038 PAC 50 a 150 mil - Midades - Melhorias operacionais no Sistema de Abastecimento de Água de Pacatuba.	CAGECE	Aprovado	88.914,60	
039 PAC 50 a 150 mil - Midades - Melhorias operacionais no Sistema de Abastecimento de Água de Russas.	CAGECE	Aprovado	157.067,10	
040 PAC 50 a 150 mil - Midades - Elaboração de Projeto Executivo do Sistema de Abastecimento de Água da sede municipal de Juazeiro do Norte.	CAGECE	Aprovado	65.348,43	
041 PAC 50 a 150 mil - Midades - Elaboração de Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário da sede municipal de Juazeiro do Norte.	CAGECE	Aprovado	80.209,27	
042 PAC 50 a 150 mil - Midades - Elaboração de Projeto Executivo do Sistema de Abastecimento de Água da sede municipal de Barbalha.	CAGECE	Aprovado	27.581,80	
043 PAC 50 a 150 mil - Midades - Elaboração de Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário da sede municipal de Barbalha.	CAGECE	Aprovado	42.033,32	
095 PAC 50 A 150 MIL/MCIDADES - Ampliação do SES de Tianguá (Palmeira Comprida)	CAGECE	Aprovado	496.776,38	

1

RESUMO FINANCEIRO GERAL - POR ÓRGÃO

Fonte	Valor Anterior Mapp	Valor 2007 (A)	Valor 2008 (B)	Valor 2009 (C)	Valor 2010 (D)	Valor Total (A+B+C+D)
(00)-(01) Tesouro	5.529.358,85	8.691.410,52	14.557.170,57	49.491.938,21	27.341.048,86	105.610.925,01
(40) SWAP A	0,00	0,00	2.274.955,69	5.622.387,69	0,00	7.897.343,38
(57) Crédito Externo - KFW	0,00	184.538,82	790.530,45	1.879.532,27	701.754,19	3.556.355,73
(70) Recursos Próprios	0,00	0,00	5.814.640,31	17.204.736,72	15.291.958,50	38.311.335,53
(71) Crédito Interno - Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	10.441.925,32	51.943.292,42	62.385.217,74
(72) Crédito Externo - Outras Fontes	0,00	14.004.799,19	26.977.956,88	28.786.351,22	5.531.905,29	75.301.012,58
(82) Governo Federal - Adm. Direta	0,00	0,00	0,00	50.617.481,47	8.533.829,38	59.151.310,85
TOTAL GERAL	5.529.358,85	22.880.748,53	50.415.253,90	164.044.352,90	109.343.786,64	352.213.500,82

Copyright© SEPLAG 2009. Todos os direitos reservados

SEPLAG

Figura 19 – Tela principal do módulo de planejamento para o órgão - Cagece

Nesse módulo, é possível também selecionar os projetos por status (aprovado, pendente, negado ou proposta) e por fonte orçamentária. Logo abaixo do quadro dos projetos, encontra-se a consulta correspondente aos financiadores referentes à mesma seleção.

A figura 20 ilustra situação em que se procura identificar os projetos que têm como fonte de recursos FEMA.

The screenshot shows the 'WebMapp Planejamento' interface. At the top, there are navigation tabs: Planejamento, Acompanhamento, Monitoria, Estágio de Execução, Mapp Consulta, GPR, and Sair. The main area is titled 'Mapp Planejamento' and contains several filters:

- Secretaria: Todas as Secretarias
- Órgão: (empty)
- Programa: Seleccione um Programa de Governo
- Status: Todos
- Fonte: (19) FEMA

 There are 'Ordenar por Código' buttons for both the Secretaria and Programa filters. A 'Buscar' button is located below the filters. Below the filters is a table with columns: Código, Secretaria, Otde Mapp, and Valor Total. The table shows a single entry for 'CONSELHO DE POLÍTICAS E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE - CONPAM' with a total value of 1.450.415,89. Below this table is a section titled 'RESUMO FINANCEIRO GERAL' with a table showing financial data by source (Fonte) for the years 2007, 2008, 2009, and 2010, along with a total value. The sources listed are Tesouro, FEMA, Recursos Próprios, and Órgãos Privados - Adm. Indireta. The total value for FEMA is 1.450.415,89. At the bottom right of the interface is an 'Incluir Projeto' button. The footer contains the copyright notice 'Copyright© SEPLAG 2009. Todos os direitos reservados' and the SEPLAG logo.

Código	Secretaria	Otde Mapp	Valor Total
49000000	CONSELHO DE POLÍTICAS E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE - CONPAM	11	1.450.415,89
TOTAL GERAL		11	1.450.415,89

Fonte	Valor Anterior Mapp	Valor 2007 (A)	Valor 2008 (B)	Valor 2009 (C)	Valor 2010 (D)	Valor Total (A+B+C+D)
(00)-(01) Tesouro	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00
(19) FEMA	2.350,00	0,00	1.448.065,89	0,00	0,00	1.450.415,89
(70) Recursos Próprios	0,00	0,00	2.449.008,35	6.485.456,90	580.000,00	9.514.465,25
(89) Órgãos Privados - Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL GERAL	2.350,00	0,00	3.897.074,24	7.086.456,90	580.000,00	11.565.881,14

Figura 20 – Tela principal do módulo de planejamento com filtro de fonte

3.2 - Módulo de Acompanhamento

Com o projeto aprovado, torna-se necessário acompanhar sua evolução. O módulo de acompanhamento veio, portanto, para exercer este papel. As informações nele constantes vêm do Módulo de Estágio de Execução, que se conhecerá mais adiante, do Módulo de Planejamento e do SIAP/SIOF. Nele pode-se pesquisar, por projeto MAPP, os valores programados por ano nas diversas fontes, bem como a execução financeira por fonte. Além disso, verifica-se o acompanhamento do último estágio de execução e as observações relativas a esse estágio.

No que se refere à execução física, esse módulo dispõe de dois quadros, onde se obtém informações acerca do planejamento e da execução físico-financeira por produto, subproduto e município.

Nesse módulo pode-se também acessar Sistema de Acompanhamento das Licitações, na

PGE e obter informações sobre o andamento das licitações vinculadas ao projeto selecionado. Além disso, pode-se conhecer os contratos e/ou convênios de despesas através dos quais estão sendo executados determinado projeto, através de *link* com o sistema de controle de contratos e convênios, da CGE.

É possível também, a partir desse módulo, fazer alterações no planejamento dos projetos Mapp, apesar desse recurso não estar disponível para todos os perfis de usuários.

Nesse módulo, não se insere nenhum tipo de informação, apenas se consulta.

Para acessar o módulo de acompanhamento, deve-se clicar no ícone MAPP Acompanhamento. No canto superior da tela, encontra-se o ícone do MAPP Planejamento, que permite retornar para a tela principal.

É importante que se saiba que as informações que aparecem nesse módulo referem-se apenas aos projetos aprovados.

Como no módulo de planejamento, aqui também temos, na parte superior da tela, um quadro com as caixas de seleção (*Secretaria, Órgão, Programa, Projeto e Fonte*).

Um recurso importante é o filtro da busca. Caso não se tenha a descrição completa do projeto ou o número, mas apenas o assunto, pode-se pesquisar o projeto digitando palavras-chave na caixa correspondente, tais como: Município, PCF e outros.

Ao lado do filtro, encontra-se um campo com informações referentes ao acompanhamento do estágio de execução do projeto Mapp. São elas: descrição do projeto, último estágio de execução com a data e o acompanhamento correspondente, ativado pelo botão visualizar observação.

Conforme se observa na Figura 21, são apresentados os seguintes quadros: Programação Financeira, Execução Financeira do Ano (2009) e Execução Financeira de anos anteriores.

O quadro de Programação Financeira é organizado por fonte, por órgão ou por secretaria e fornece informações sobre o planejamento nos anos de 2007 a 2010.

Os quadros de Execução Financeira também podem ser organizados por fonte, por órgão ou por Secretaria e trazem informações sobre a programação financeira do ano a que se referem, os limites financeiros deliberados pelo COGERF e os valores solicitados, fixados, empenhados e pagos. Estas informações migram dos sistemas SIAP e SIC. As figuras a seguir ilustram estes quadros. A Figura 21 mostra a execução por fonte e a Figura 22 mostra as mesmas informações organizadas por Secretaria.

WebMapp Acompanhamento GEORGE RILMER CHAVES CRAVEIRO
Técnicos Suptag (11 usuários online)

Planejamento Acompanhamento Monitoria Estágio de Execução Mapp Consulta GPR Sal

Secretaria: Todas as Secretarias Ordenar por Código
 Programa: Todos os Programas Ordenar por Código
 Fonte: Todas as Fontes Ordenar por Código

Filtro:

Programação Financeira por Fonte (Por Orçamento) (Por Secretaria)

Fonte	Valor 2007 Antes Mapp (A)	Valor 2007 (B)	Valor 2008 (C)	Valor 2009 (D)	Valor 2010 (E)	Valor Total (A+B+C+D+E)
(00)-(01) Tesouro	66.518.956,43	167.442.426,70	600.006.471,97	1.551.516.406,52	609.009.199,70	3.054.991.461,32
(07) Salário-Educação	0,00	0,00	7.335.625,66	13.518.590,00	4.095.725,00	24.949.940,66
(10) FECP	78.226.075,60	63.711.076,95	156.339.303,66	236.085.679,10	20.977.969,51	556.339.104,82
(11) CIDE	17.559.510,22	32.269.340,07	32.843.125,42	41.439.811,79	24.600.000,00	146.710.796,58
(19) FEMSA	2.350,00	0,00	1.448.065,89	0,00	0,00	1.450.415,89
(21) Governo Municipal - Aplicação Direta	120.400,00	391.732,29	9.087.868,14	29.940.499,76	9.349.240,33	48.889.740,54
(22) Governo Federal - Aplicação Direta	0,00	14.351.451,26	152.616.394,20	262.603.065,54	194.657.340,00	644.228.251,00
(23) Órgãos Privados - Aplicação Direta	0,00	1.000.000,00	5.120.902,09	15.866.295,27	16.796.502,22	36.805.699,58
(24) Órgãos Internacionais - Aplicação Direta	0,00	0,00	432.865,78	3.092.206,18	0,00	3.515.071,96
(40) SVA/PA A	2.896.836,54	14.536.322,45	138.705.149,78	304.992.585,36	97.598.858,41	558.719.752,56
(44) Royalties	4.563.773,97	4.001.306,96	10.465.261,62	24.590.996,29	0,00	43.621.338,74
(45) Crédito Interno - BNDES	1.233.508,65	41.796.652,76	49.691.048,75	355.815.873,89	206.012.011,02	654.539.395,07
(48) Crédito Externo - Tesouro	0,00	233.000,00	9.428.725,10	5.285.200,00	0,00	14.946.925,10
(50) FUNDEB	0,00	0,00	46.408.167,75	61.959.522,42	14.733.904,00	123.100.594,17
(55) Crédito Interno - BINB	0,00	32.379.607,16	33.159.449,24	56.051.929,66	0,00	121.590.986,06
(56) Crédito Interno - CEF	0,00	11.743.125,14	10.053.205,17	43.051.781,44	200.986.422,92	265.834.534,67
(57) Crédito Externo - KPVV	0,00	1.390.508,06	1.286.154,54	5.054.110,44	18.839.210,28	26.569.963,32
(58) Crédito Externo - BIRD	8.585.405,23	1.977.622,64	37.519.367,68	76.755.791,65	178.564.803,43	303.402.990,63
(59) Crédito Externo - BID	0,00	0,00	0,00	426.508.257,35	187.717.097,62	614.225.354,97
(70) Recursos Próprios	4.159.777,64	14.590.187,06	49.962.162,33	189.745.703,22	38.063.803,93	296.541.434,38
(71) Crédito Interno - Outras Fontes	1.718.945,83	15.884.154,91	6.436.684,06	45.336.248,23	56.471.131,09	127.847.164,02
(72) Crédito Externo - Outras Fontes	0,00	14.004.799,15	29.610.211,56	49.023.566,89	27.770.566,41	120.409.144,05
(75) Medida Compensatória Ambiental	0,00	0,00	747.081,41	13.331.675,00	3.180.348,14	17.299.304,55
(80) Órgãos Internacionais - Adm. Direta	0,00	0,00	176.936,35	1.776.907,55	0,00	1.953.843,90
(82) Governo Federal - Adm. Direta	5.398.862,65	136.181.048,24	193.202.134,44	1.182.469.248,34	720.411.226,01	2.237.673.521,71
(83) Governo Federal - Adm. Indireta	3.253.933,23	76.935.873,44	125.755.094,99	394.033.741,26	351.985.629,62	932.358.272,54
(86) Governo Municipal - Adm. Direta	0,00	100.000,00	42.306,28	2.147.269,06	0,00	2.289.575,34
(87) Governo Municipal - Adm. Indireta	0,00	0,00	132.993,90	188.006,10	0,00	321.000,00
(89) Órgãos Privados - Adm. Indireta	0,00	0,00	122.885,93	2.887.611,67	0,00	3.010.497,60
(90) Governo Federal - PADH	0,00	5.604.685,07	30.113.910,56	64.116.198,27	0,00	99.834.793,90
(91) SUS	0,00	0,00	3.857.581,58	19.180.754,05	0,00	23.038.336,63
Outras fontes - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	194.375.616,22	650.524.926,95	1.802.167.135,83	5.498.676.732,36	2.983.820.727,61	11.129.515.152,97

Execução Financeira do Ano por Fonte (Por Orçamento) (Por Secretaria)

Anos: 2007 2008 2009 2010

Fonte	Programado (A)	Limite (B)	Solicitado (C)	Ficado (D)	Empenhado (E)	Pago (F)	% (G/F)
(00)-(01) Tesouro	1.551.816.406,52	620.799.379,99	251.824.689,49	233.491.163,12	233.491.163,12	168.922.545,74	16,04
(07) Salário-Educação	13.518.590,00	0,00	3.931.170,37	3.590.794,80	3.590.794,80	1.610.884,80	26,56
(10) FECP	236.085.679,10	230.465.899,94	87.445.196,71	59.251.894,67	59.251.894,67	56.900.569,04	29,09
(11) CIDE	41.439.811,79	17.396.305,24	9.197.944,39	8.964.375,24	8.964.375,24	8.920.824,33	21,63
(19) FEMSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21) Governo Municipal - Aplicação Direta	29.940.499,76	0,00	7.112.363,84	7.112.363,84	7.112.363,84	7.112.363,84	23,75
(22) Governo Federal - Aplicação Direta	262.603.065,54	0,00	17.955.311,08	17.955.311,08	17.955.311,08	17.955.311,08	6,35
(23) Órgãos Privados - Aplicação Direta	15.866.295,27	0,00	3.223.025,13	3.223.025,13	3.223.025,13	3.223.025,13	20,28
(24) Órgãos Internacionais - Aplicação Direta	3.092.206,18	0,00	45.725,93	45.725,93	45.725,93	45.725,93	1,48
(40) SVA/PA A	304.992.585,36	79.672.746,45	14.263.218,74	12.096.139,03	12.096.139,03	9.125.413,12	3,98
(44) Royalties	24.590.996,29	10.367.871,43	2.982.212,98	2.823.284,09	2.823.284,09	2.535.485,50	11,48
(45) Crédito Interno - BNDES	355.815.873,89	0,00	16.802.759,19	16.796.762,62	16.796.762,62	18.760.691,91	5,28
(48) Crédito Externo - Tesouro	5.285.200,00	0,00	207.339,17	207.339,17	207.339,17	207.339,17	3,92
(50) FUNDEB	61.959.522,42	27.660.968,28	19.994.436,25	17.769.203,20	17.769.203,20	14.170.634,67	28,67
(55) Crédito Interno - BINB	56.051.929,66	0,00	5.587.442,43	5.427.131,25	5.427.131,25	5.420.917,12	9,68
(56) Crédito Interno - CEF	43.051.781,44	0,00	1.574.721,46	1.090.292,35	1.090.292,35	1.081.961,40	2,53
(57) Crédito Externo - KPVV	5.054.110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(58) Crédito Externo - BIRD	76.755.791,65	0,00	14.231.935,37	13.324.666,15	13.324.666,15	11.461.054,12	17,35
(59) Crédito Externo - BID	426.508.257,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(70) Recursos Próprios	189.745.703,22	0,00	39.437.236,72	36.743.743,65	36.743.743,65	36.986.067,61	20,41
(71) Crédito Interno - Outras Fontes	45.336.248,23	0,00	2.405.813,34	2.405.813,34	2.405.813,34	2.405.813,34	5,30
(72) Crédito Externo - Outras Fontes	49.023.566,89	0,00	10.205.035,74	10.205.035,74	10.205.035,74	10.205.035,74	20,81
(75) Medida Compensatória Ambiental	13.331.675,00	0,00	373.791,23	325.791,23	325.791,23	216.791,23	2,44
(80) Órgãos Internacionais - Adm. Direta	1.776.907,55	0,00	1.776.907,55	1.776.907,55	1.776.907,55	1.776.907,55	100,00
(82) Governo Federal - Adm. Direta	1.182.469.248,34	0,00	39.792.018,47	35.012.246,51	35.012.246,51	25.025.948,32	2,96
(83) Governo Federal - Adm. Indireta	394.033.741,26	0,00	22.156.074,42	21.933.675,30	21.933.675,30	21.161.303,90	5,56
(86) Governo Municipal - Adm. Direta	2.147.269,06	0,00	64.017,79	64.017,79	64.017,79	64.017,79	2,98
(87) Governo Municipal - Adm. Indireta	188.006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(89) Órgãos Privados - Adm. Indireta	2.887.611,67	0,00	200.245,31	43.508,26	43.508,26	43.508,26	1,50
(90) Governo Federal - PADH	64.116.198,27	0,00	7.078.324,52	6.479.423,50	6.479.423,50	5.133.233,86	10,10
(91) SUS	19.180.754,05	0,00	3.304.765,12	2.333.118,06	2.333.118,06	1.331.040,53	12,16
Outras fontes - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.498.676.732,36	986.362.826,33	564.424.262,37	523.725.796,28	523.725.796,28	430.713.526,12	9,52

Execução Financeira Anual por Fonte (Por Orçamento) (Por Secretaria)

Fonte	Programado 2007	Empenhado 2007	Programado 2008	Empenhado 2008	Programado 2009	Empenhado 2009	%
(00)-(01) Tesouro	234.203.526,07	195.980.912,21	660.006.471,97	651.078.351,51	2.446.026.404,56	1.080.550.426,84	44,18%
(07) Salário-Educação	0,00	0,00	7.335.625,66	7.335.625,66	20.854.215,66	10.926.420,46	52,39%
(10) FECP	141.936.152,55	135.326.018,67	156.339.303,66	156.289.303,65	534.361.135,31	350.667.216,99	65,86%
(11) CIDE	49.827.851,09	40.656.130,62	32.843.125,42	31.993.125,42	124.110.766,30	89.611.531,48	72,20%
(19) FEMSA	2.350,00	0,00	1.448.065,89	1.448.065,89	1.450.415,89	1.448.065,89	99,84%
(21) Governo Municipal - Aplicação Direta	512.132,29	0,00	9.087.868,14	8.950.570,20	39.540.500,21	16.062.934,04	40,62%
(22) Governo Federal - Aplicação Direta	14.351.451,26	399.268,50	152.616.394,20	149.616.394,20	449.670.911,00	167.970.963,78	37,36%
(23) Órgãos Privados - Aplicação Direta	1.000.000,00	0,00	5.120.902,09	5.120.902,09	22.009.197,36	8.343.927,22	37,91%
(24) Órgãos Internacionais - Aplicação Direta	0,00	0,00	432.865,78	432.865,78	3.515.071,96	476.591,71	13,62%
(40) SVA/PA A	17.415.159,99	16.898.571,25	138.705.149,78	138.161.344,95	461.112.895,15	167.155.056,13	36,25%
(44) Royalties	8.565.080,63	7.821.150,17	10.465.261,62	10.003.261,56	43.621.338,74	20.647.665,82	47,33%
(45) Crédito Interno - BNDES	43.020.461,41	43.020.461,41	49.691.048,75	49.691.048,75	448.527.384,05	111.508.272,78	24,86%
(48) Crédito Externo - Tesouro	233.000,00	0,00	9.428.725,10	9.428.725,10	14.946.925,10	9.636.064,27	64,47%
(50) FUNDEB	0,00	0,00	46.408.167,75	46.401.178,15	108.366.690,17	64.170.381,35	59,22%
(55) Crédito Interno - BINB	32.379.607,16	29.444.547,62	33.199.449,24	33.197.985,00	121.630.986,08	66.059.663,95	55,96%
(56) Crédito Interno - CEF	11.743.125,14	10.487.364,34	10.053.205,17	10.053.205,17	64.848.111,75	21.630.851,86	33,36%
(57) Crédito Externo - KPVV	1.390.508,06	1.390.508,06	1.286.154,54	1.286.154,54	7.730.773,04	2.676.662,60	34,62%
(58) Crédito Externo - BIRD	10.563.027,87	9.886.820,17	37.519.367,68	37.519.367,24	124.838.187,20	60.730.853,56	48,65%
(59) Crédito Externo - BID	0,00	0,00	0,00	0,00	426.508.257,35	0,00	0,00%
(70) Recursos Próprios	18.749.964,90	12.678.080,34	49.962.162,33	49.570.102,25	258.477.930,45	101.191.926,24	39,15%
(71) Crédito Interno - Outras Fontes	17.603.100,64	0,00	6.436.684,06	6.436.684,06	69.376.032,93	36.842.497,40	53,12%
(72) Crédito Externo - Outras Fontes	14.004.799,15	142.836,48	29.610.211,56	29.610.211,56	92.638.577,64	39.858.063,76	43,13%
(75) Medida Compensatória Ambiental	0,00	0,00	747.081,41	747.081,41	14.078.956,41	1.072.872,64	7,62%
(80) Órgãos Internacionais - Adm. Direta	0,00	0,00	176.936,35	176.936,35	1.953.843,90	1.187.858,66	60,80%
(82) Governo Federal - Adm. Direta	141.590.910,92	135.679.432,36	193.202.134,44	191.237.378,40	1.517.262.293,70	361.929.057,27	23,85%
(83) Governo Federal - Adm. Indireta	80.189.806,67	72.898.767,65	125.755.094,99	125.747.619,89	599.978.842,92	220.360.062,64	36,73%
(86) Governo Municipal - Adm. Direta	100.000,00	0,00	42.306,28	0,00	2.289.575,34	64.077,79	2,80%
(87) Governo Municipal - Adm. Indireta	0,00	0,00	132.993,90	132.993,90	321.000,00	132.993,90	41,39%
(89) Órgãos Privados - Adm. Indireta	0,00	0,00	122.885,93	122.885,93	3.010.497,60	166.394,21	5,53%
(90) Governo Federal - PADH	5.604.685,07	5.604.685,07	30.113.910,56	30.113.910,56	99.834.793,90	42.198.019,13	42,27%

Resumo por Fonte		Resumo por Secretaria					
Entidade 2008	Programado (F)	Limite	Solicitado	Fixado	Empenhado (G)	Pago	% (G)/(F)
CASA CIVIL	64.504.494,72	48.767.503,15	4.832.830,08	4.680.577,08	4.570.946,07	3.993.046,13	7,09
CEDE	8.560.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
CEE	512.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
CM	1.432.604,99	989.989,99	727.989,99	727.989,99	727.989,99	231.600,00	50,82
CONPAM	27.714.870,09	339.999,96	652.559,33	439.197,28	439.197,28	107.177,28	1,58
DPG	4.531.018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GG	601.722,03	255.100,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00	22,6
GVG	842.510,67	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0
PGE	4.696.400,03	1.057.632,42	801.899,98	597.900,00	597.900,00	438.000,00	12,73
SCIDADES	844.481.490,66	31.509.418,10	4.115.838,96	1.058.621,15	1.058.621,15	1.056.931,15	0,13
SDA	322.959.147,38	28.205.665,56	8.247.389,59	7.095.764,03	6.938.066,63	6.828.302,69	2,15
SECITECE	98.342.837,30	6.255.765,59	3.087.286,24	2.149.348,56	2.032.594,22	888.151,00	2,07
SECON	1.335.596,67	247.348,98	160.257,54	159.288,67	159.288,67	6.312,07	11,93
SECULT	29.032.417,75	5.759.068,24	523.329,00	157.900,00	157.146,00	0,00	0,54
SEDOC	175.686.978,54	2.449.456,72	4.609.995,69	1.260.186,79	1.211.149,80	159.547,80	0,89
SEFAZ	143.052.605,02	2.108.687,21	454.630,72	437.320,00	434.709,99	25.359,99	0,3
SEINFRA	1.177.044.488,46	45.834.909,30	21.491.401,67	19.818.771,17	19.818.771,17	18.030.614,43	1,68
SEJUS	94.597.659,40	250.534,55	160.587,70	149.514,28	34.254,83	0,00	0,04
SEPLAG	48.867.186,95	2.251.908,47	1.346.948,90	1.183.313,77	1.121.436,13	1.060.889,78	2,29
SESA	245.142.908,71	2.351.480,81	2.290.964,86	2.038.796,85	1.999.574,48	1.902.296,69	0,82
SESPORTE	21.212.591,30	2.535.335,90	357.835,20	123.396,80	121.996,80	117.186,80	0,58
SETUR	240.259.825,42	2.819.317,37	1.630.685,07	1.308.936,08	891.739,68	70.638,32	0,37
SRH	545.863.064,21	19.847.639,92	43.045.919,64	20.187.329,43	19.652.784,70	4.454.187,27	3,6
SSPOS	98.222.016,32	11.046.879,57	6.245.941,76	5.464.021,53	5.464.021,53	3.809.187,30	5,56
STDS	125.787.212,76	10.567.424,85	6.090.549,57	5.134.467,33	4.899.575,48	4.221.833,43	3,9
TOTAL GERAL	4.325.284.479,73	225.893.066,66	111.165.841,49	74.308.640,80	72.467.764,60	47.401.264,13	1,68

Figura 22 - Tela de Resumo da execução, por Secretaria, do módulo de Acompanhamento do WebMapp

Assim como no módulo de planejamento, a navegação no módulo de acompanhamento também é simples.

Novamente, usa-se como exemplo a Secretaria das Cidades. Para se obter informações sobre a execução do projeto “CIDADES I – Gerenciamento do programa Cidades do Ceará e Elaboração de Estudos e Termos de Referência”, seleciona-se a “Secretaria das Cidades”, o órgão “Secretaria das Cidades”, o “Programa CIDADES DO CEARÁ I” e o projeto MAPP citado anteriormente. Ao se fazer esta operação, percebe-se que à medida que se vai selecionando as informações, a listagem correspondente vai sendo mostrada, bastando que se coloque o cursor no local desejado.

Na Figura 23, pode-se ver os quadros de acompanhamento do projeto citado no exemplo.

WebMapp Acompanhamento GEORGE KILMER CHAVES CRAVEIRO
Técnicos SepLag (11 usuários online)

Planejamento Acompanhamento Monitoria Estágio de Execução Mapp Consulta GPR Sair

Secretaria: 43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES (SCIDADES) **Através desse botão é possível mandar um e-mail para o Secretário/Gerente do Projeto** Ordenar por Código
 Órgão: 43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES (SCIDADES) Ordenar por Código
 Programa: 223 - CIDADES DO CEARÁ I ▼
 Mapp: 148 - CIDADES I - Gerenciamento do Programa Cidades do Ceará e Elaboração de Estudos e Termos de Referência **Através desse botão é possível ver um resumo da Licitação**
 Fonte: Todas as Fontes ▼

Descrição: CIDADES I - Gerenciamento do Programa Cidades do Ceará e Elaboração de Estudos e Termos de Referência
 Data da Aprovação: 9/3/2008 18:29:42
 Estágio de Execução Atual: EM EXECUÇÃO (Ocultar Acompanhamento) (Histórico)
 Data do Último Acompanhamento: 05/06/09
 Acompanhamento: Corresponde a estudos, planos e projetos executivos de preparação do Projeto Cidades do Ceará e Cariri Central. Foram efetuados 26 contratos, conforme status informado a seguir. 15 contratos concluídos: aquisição de impressoras, módulos isoladores, scanners, microcomputadores, notebooks e mobiliário (equipagem da UPP), contratação de 3 consultorias individuais (nas áreas ambiental, social e de turismo), estudo de trânsito e transporte do CRAJUBAR, contratação de 4 palestrantes e apoio logístico para realização de seminário sobre turismo e desenvolvimento econômico do Cariri (realizado nos dias 27 e 28.04.09), e realização de missão técnica a um centro de tecnologia de calçados na Paraíba (CITI e CTCC / Campina Grande); 11 contratos em fase de execução: auditoria externa, estudo de localização e viabilidade do distrito industrial do Cariri, plano de gestão do centro de convenções do Cariri, plano de negócios do CITE e projetos executivos diversos, a maioria de recuperação ambiental, urbanização e requalificação urbana (requalificação das praças centrais do Crato; museu no engenho tupinambá, em Barbalha; parque das macaúbas, em Caririaguá; requalificação da área central de Farias Brito; recuperação ambiental e urbanização no bairro seminário, no Crato; roteiro da fé, em Juazeiro do Norte; levantamentos de dados e estudos técnico-científicos dos geotopes do Geopark Araripe). Expectativa de conclusão: setembro de 2009. Mapp: 167 - CIDADES I - Componente 1: Investimentos em Infra-Estrutura Física na Região do Cariri Central Estágio Atual: Não Iniciado Corresponde a estudos, planos e projetos executivos de preparação do Projeto Cidades do Ceará e Cariri Central. Foram efetuados 26 contratos, conforme status informado a seguir. 15 contratos concluídos: aquisição de impressoras, módulos isoladores, scanners, microcomputadores, notebooks e mobiliário (equipagem da UPP), contratação de 3 consultorias individuais (nas áreas ambiental, social e de turismo), estudo de trânsito e transporte do CRAJUBAR, contratação de 4 palestrantes e apoio logístico para realização de seminário sobre turismo e desenvolvimento econômico do Cariri (realizado nos dias 27 e 28.04.09), e realização de missão técnica a um centro de tecnologia de calçados na Paraíba (CITI e CTCC / Campina Grande); 11 contratos em fase de execução: auditoria externa, estudo de localização e viabilidade do distrito industrial do Cariri, plano de gestão do centro de convenções do Cariri, plano de negócios do CITE e projetos executivos diversos, a maioria de recuperação ambiental, urbanização e requalificação urbana (requalificação das praças centrais do Crato; museu no engenho tupinambá, em Barbalha; parque das macaúbas, em Caririaguá; requalificação da área central de Farias Brito; recuperação ambiental e urbanização no bairro seminário, no Crato; roteiro da fé, em Juazeiro do Norte; levantamentos de dados e estudos técnico-científicos dos geotopes do Geopark Araripe). Expectativa de conclusão: setembro de 2009.

Programação Financeira por Fonte

Fonte	Valor 2007 Antes Mapp (A)	Valor 2007 (B)	Valor 2008 (C)	Valor 2009 (D)	Valor 2010 (E)	Valor Total (A+B+C+D+E)
(00)-(01) Tesouro	0,00	0,00	593.761,59	954.064,35	0,00	1.547.825,94
(40) SWAP A	0,00	0,00	101.104,00	823.896,00	0,00	925.000,00
(80) Órgãos Internacionais - Adm. Direta	0,00	0,00	176.936,35	1.776.907,55	0,00	1.953.843,90
TOTAL GERAL	0,00	0,00	871.801,94	3.554.867,90	0,00	4.426.669,84

Execução Financeira do Ano por Fonte
 Anos: 2007 2008 2009 2010

Fonte	Programado (F)	Limite	Solicitado	Fixado	Empenhado (G)	Pago	% (G/F)
(00)-(01) Tesouro	954.064,35	797.663,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(40) SWAP A	823.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(80) Órgãos Internacionais - Adm. Direta	1.776.907,55	0,00	1.137.385,16	1.010.922,31	1.010.922,31	893.310,39	56,89
TOTAL GERAL	3.554.867,90	797.663,92	1.137.385,16	1.010.922,31	1.010.922,31	893.310,39	28,43

Execução Financeira Anual por Fonte

Fonte	2007		2008		Acumulado 2007-2009		%
	Programado	Empenhado	Programado	Empenhado	Programado	Empenhado	
(00)-(01) Tesouro	0,00	0,00	593.761,59	536.938,87	1.547.825,94	536.938,87	34,69%
(40) SWAP A	0,00	0,00	101.104,00	91.034,63	925.000,00	91.034,63	9,84%
(80) Órgãos Internacionais - Adm. Direta	0,00	0,00	176.936,35	176.936,35	1.953.843,90	1.187.858,66	60,80%
TOTAL GERAL	0,00	0,00	871.801,94	804.909,85	4.426.669,84	1.815.832,16	41,02%

Programação Físico-Financeira

Programação Físico-Financeira por Projeto (Mostrar Municípios)(Mostrar Subprodutos)

Produto/Subproduto	Unidade	Otd 2007	Valor 2007	Otd 2008	Valor 2008	Otd 2009	Valor 2009	Otd 2010	Valor 2010	Otd Total	Valor Total
ESTUDO, PLANO, PROJETO E PESQUISA REALIZADOS	und	0	0,00	36	804.909,85	6	586.095,85	0	0,00	42	1.391.005,70
EQUIPAMENTO PARA TI ADQUIRIDO	und	0	0,00	0	0,00	16	22.097,00	0	0,00	16	22.097,00
EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ADQUIRIDOS	und	0	0,00	0	0,00	109	59.887,68	0	0,00	109	59.887,68
PROJETO ELABORADO	und	0	0,00	0	0,00	18	1.932.723,02	0	0,00	18	1.932.723,02

Execução Físico-Financeira Do Ano

Execução Físico-Financeira Do Ano (Mostrar Municípios) (Mostrar Subprodutos)
 Anos: 2007 2008 2009 2010

Produto/Subproduto	Unidade	Otd Prevista	Otd Realizada	%	Valor Programado	Valor Empenhado	%
ESTUDO, PLANO, PROJETO E PESQUISA REALIZADOS	und	6	0	0,00%	586.095,85	501.361,08	85,54%
EQUIPAMENTO PARA TI ADQUIRIDO	und	16	0	0,00%	22.097,00	597,00	2,70%
EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ADQUIRIDOS	und	109	0	0,00%	59.887,68	59.887,68	100,00%
PROJETO ELABORADO	und	18	0	0,00%	1.932.723,02	449.076,55	23,23%

© 2009 SEPLAG. Todos os direitos reservados.

Figura 23 – Tela do espelho da execução do projeto selecionado - SCIDADES

WebMapp Acompanhamento GEORGE KILMER CHAVES CRAVEIRO
Técnicos Seplag (4 usuários online)

Planejamento Acompanhamento Monitoria Estágio de Execução Mapp Consulta GPR Sair

Secretaria: 43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES (SCIDADES) Ordenar por Código

Órgão: 43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES (SCIDADES) Ordenar por Código

Programa: Todos os Programas

Mapp: 148 - CIDADES I - Gerenciamento do Programa Cidades do Ceará e Elaboração de Estudos e Termos de Referência

Fonte: Todas as Fontes

Filtro:

Descrição: **CIDADES I - Gerenciamento do Programa Cidades do Ceará e Elaboração de Estudos e Termos de Referência**

Data da Aprovação: 9/3/2008 18:29:42

Estágio de Execução Atual: **EM EXECUÇÃO (Mostrar Acompanhamento) (Histórico)**

Data do Último Acompanhamento: 05/06/09

Licitações			
	IIº SPU	Objeto da Licitação	Estágio Atual
Detalhes	083380426	PROCESSO NÃO CADASTRADO IIA PGE!	
Detalhes	084338091	PROCESSO NÃO CADASTRADO IIA PGE!	
Detalhes	084173424	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA NO PROJETO CIDADES DO CEARÁ.	CONCLUÍDO em 06/01/2009 17:00
Detalhes	084173408	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	CONCLUÍDO em 10/02/2009 10:00
Detalhes	084336536	CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA NA ÁREA SOCIAL, PARA PROMOVER A FORMAÇÃO ARTICULAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO NÚCLEO DE GESTÃO SÓCIO AMBIENTAL (NGSA) DO PROJETO CIDADES DO CEARÁ (CARIRI CENTRAL)	CONCLUÍDO em 10/11/2008 16:00
Detalhes	084336510	CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA NA ÁREA AMBIENTAL, PARA PROMOVER A FORMAÇÃO, ARTICULAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO NÚCLEO DE GESTÃO SÓCIO AMBIENTAL (NGSA) DO PROJETO CIDADES DO CEARÁ (CARIRI CENTRAL)	CONCLUÍDO em 10/11/2008 16:00
Detalhes	084336552	CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA NA ÁREA DO TURISMO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANO DE AÇÃO PARA SUBSIDIAR A ATUAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO CIDADES DO CEARÁ NO QUE DIA RESPEITO AO SETOR DE TURISMO NO CARIRI CENTRAL	CONCLUÍDO em 10/11/2008 16:00

Figura 24 – Tela do quadro de consultas das licitações no módulo de acompanhamento do WebMapp

Outro recurso importante é a consulta ao processo licitatório. Para obter informações sobre o andamento da licitação, deve-se selecionar a secretaria, o órgão, o programa e o projeto Mapp que se deseja obter informação. Caso o órgão tenha cadastrado o número do SPU (Sistema de Protocolo Único) do processo encaminhado à PGE no projeto Mapp, aparecerá o botão **ver Licitações**, conforme mostra as figuras 23 e 24. Ao clicar nesse botão, o sistema mostrará o quadro de consulta das licitações com as seguintes informações: número do SPU, objeto da licitação e estágio atual.

Para obter um resumo do processo licitatório correspondente ao SPU informado no Projeto Mapp, o usuário deverá clicar no botão **Detalhes**, conforme ilustrado na figura 25.

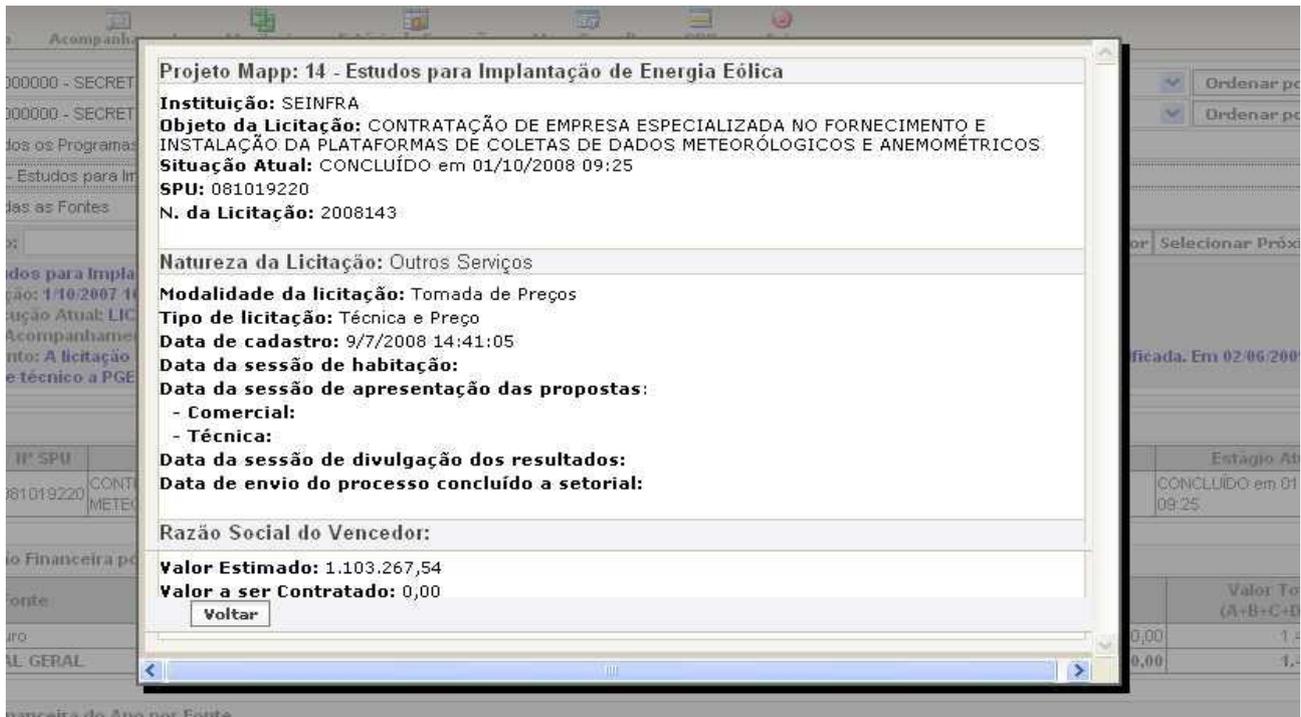


Figura 25 – Tela de Resumo do processo licitatório

Para acessar o extrato do processo licitatório, basta clicar no botão **ver extrato do processo** e o sistema WebMapp direcionará a consulta para o sistema de controle de licitações, na PGE, e abrirá o extrato do processo licitatório selecionado, conforme mostra a figura 26.

Extrato do Processo							
Situação Atual: CONCLUÍDO							
Instituição: CEARAPORTOS							
Área: ADMINISTRATIVO FINANCEIRO							
Natureza: Serviço/Obra							
Modalidade: Tomada de Preço							
Tipo de Licitação: Menor Preço							
Resumo do Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE EDIFICAÇÃO DE APOIO À PORTARIA PRINCIPAL DO TERMINAL PORTUARIO DO PERCEM.							
Números do Processo:							
	Tipo de Numero	Nº Principal	Numero	Data do Cadastro			
	LICITACAO	Nao	2008077	25/04/2008			
	SPU	Nao	075129701	08/04/2008			
Valores do Processo:							
	Tipo	Fonte	Moeda	Valor	Data do Cadastro		
	ITEM A SER CONTRATADO	Tesouro	Real	222.237,95	04/09/2008		
	A SER CONTRATADO	Tesouro	Real	222.237,95	04/09/2008		
	ESTIMADO GLOBAL	Tesouro	Real	281.774,08	08/04/2008		
Pessoas do Processo:							
	Papel	Pessoa				Tipo	
	CADASTRANTE	MAGNO FARNEY PINHEIRO HOLANDA				Fisica	
	VENCEDOR	FIEZA- PROJETOS E CONSULT.EM ENGENHARIA LTDA				Juridica	
	APOIO	TERESA CRISTINA DA SILVA				Fisica	
	PRESIDENTE	EXPEDITO PITA, JÚNIOR				Fisica	
Andamentos do Processo:							
	Responsavel	Data do Andamento	Fase	Tipo de Andamento	Observação	Pessoa	Hora
	TERESA CRISTINA DA SILVA	09/09/2008 13:52	FINALIZAÇÃO	CONCLUÍDO	PROC. CONCLUÍDO ENCAMINHADO À SETORIAL CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO: EMPRESA VENCEDORA: FIEZA – PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.,		
	TERESA CRISTINA DA SILVA	09/09/2008 13:50	FINALIZAÇÃO	RECEBER			
	MAGNO FARNEY PINHEIRO HOLANDA	04/09/2008 16:45	REALIZAÇÃO	TRAMITAR	CONCLUÍDO; EMPRESA: FIEZA – PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA., COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 222.237,95	TERESA CRISTINA DA SILVA	

Figura 26 – Extrato do processo licitatório

No quadro de Programação Financeira, encontram-se os valores programados para os vários anos e, no quadro de execução financeira, os valores programados, solicitados, fixados, empenhados e pagos, bem como os limites concedidos pelo COGERF.

Existem três botões que facilitam a navegação no módulo, que são os seguintes: **Editar Mapp**, **Selecionar Mapp Anterior** e **Selecionar Próximo Mapp**.

Quando o botão **Editar Mapp** é clicado, abre-se a tela de cadastramento do projeto, no Módulo de Planejamento, onde podem ser feitas alterações nas informações relativas ao projeto ou mesmo inseridas novas informações pelo Governador, tendo em vista que no MAPP Acompanhamento visualizam-se projetos aprovados.

Os botões **Selecionar Mapp Anterior** e **Selecionar Próximo Mapp** são usados para navegar na listagem sem voltar para a caixa de seleção.

Ao clicar no botão **Histórico**, o sistema disponibiliza o histórico dos acompanhamentos do projeto Mapp com os respectivos estágios, datas e observações, conforme mostra figura 27.

Estágio	Data	Observação
ATIVIDADES PREPARATÓRIAS	12/06/2009	O Termo de referência elaborado pelo Museu da Imagem e do Som - MIS foi encaminhado por meio do SPU nº 09255618-3 a Assessoria Jurídica - ASJUR para fins de elaboração de edital de concorrência pública.
EM EXECUÇÃO	25/05/0009	O Termo de referência foi elaborado e será entregue no dia 25/05 para contratação de produtora para execução do saldo no MAPP.
ATIVIDADES PREPARATÓRIAS	07/05/0009	O Termo de Referência será entregue no dia 07/05.
ATIVIDADES PREPARATÓRIAS	25/03/2009	Ação direcionada para o Museu da Imagem e do Som (MIS) que está elaborando o projeto de História Oral, com prazo de entrega até o dia 03/04/2009.
NÃO INICIADO	10/12/2008	O projeto continua sem poder ser executado pois não há fonte 70 no MAPP SECULT. Foi solicitado ao Governador Cid Gomes, por meio do ofício Nº.531/2008 GS, datado de 3/7/2008, a correção da fonte de recursos da 70 FFC para a fonte 00 TESOUIRO. Aguarda solução.

Programado (F)	Limite	Solicitado	Fixado	Empenhado (G)
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Figura 27 – Tela do Histórico de Acompanhamentos do módulo de acompanhamento do Webmapp

Resumindo, no Módulo de Acompanhamento, acessam-se as informações sobre a execução financeira dos projetos inseridos no WebMapp. Esta é uma visão pontual da execução. Para se ter uma visão mais ampla do desempenho da Secretaria, precisa-se cruzar informações de planejamento com o acompanhamento. Isto vai ser possível no próximo módulo que traz dados de monitoramento.

3.3 - Módulo de Monitoramento

O Módulo de Monitoramento deve ser utilizado para se avaliar como se encontra o desempenho físico e financeiro da Secretaria, através da identificação dos obstáculos verificados no processo de execução dos projetos inseridos no WebMapp.

Nele se pode fazer dois tipos de análise:

- avaliar a execução financeira por ano ou acumulada da Secretaria/Entidade nos anos de 2007 e 2008, ou de um projeto, bem como a execução de uma determinada fonte de recursos, como, por exemplo, operações de crédito; e
- conhecer o perfil de distribuição dos estágios de execução da Secretaria/Entidade e identificar quais grupos de projetos apresentam-se deficitários, como, por exemplo, aqueles licitados, mas sem execução.

Estas informações são importantes para a tomada de decisões em tempo hábil.

Assim como no Módulo de Acompanhamento, o Módulo de Monitoramento é somente para consulta, inexistindo, portanto, rotinas de inserção de informações, valendo ressaltar também que não apresenta caixas de seleção.

O acesso ao Módulo de Monitoramento se dá através do ícone **Mapp Monitoria** encontrado na tela principal do WebMapp. A tela de acesso ao Módulo de Monitoramento Gerencial está mostrada na Figura 28.

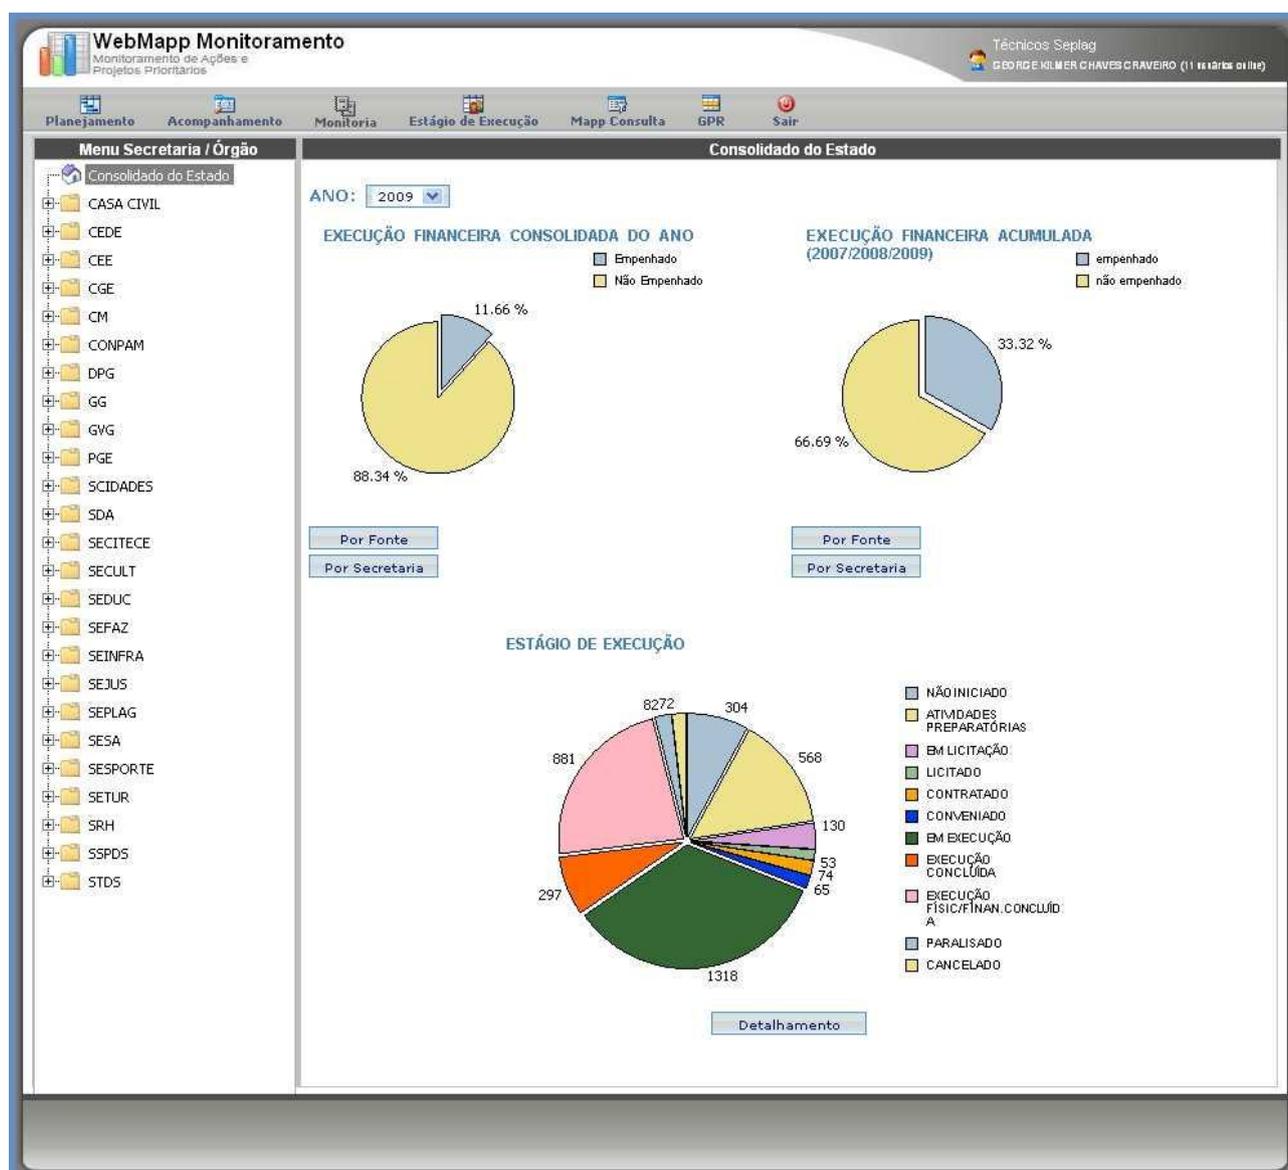


Figura 28 – Tela principal do módulo de monitoria do WebMapp

Este Módulo se abre com informações relativas à execução consolidada do Estado. Tem-se, então, a execução financeira por ano (2009) e a execução acumulada nos anos de 2007, 2008 e 2009, organizadas por fonte e por Secretaria. Para selecionar o ano, basta clicar na caixa de seleção do ano e fazer a opção desejada. Os botões por fonte e por secretaria abrem os quadros de execução financeira consolidada do ano ou execução financeira acumulada.

A Figura 29 mostra a execução de 2009 por fonte.

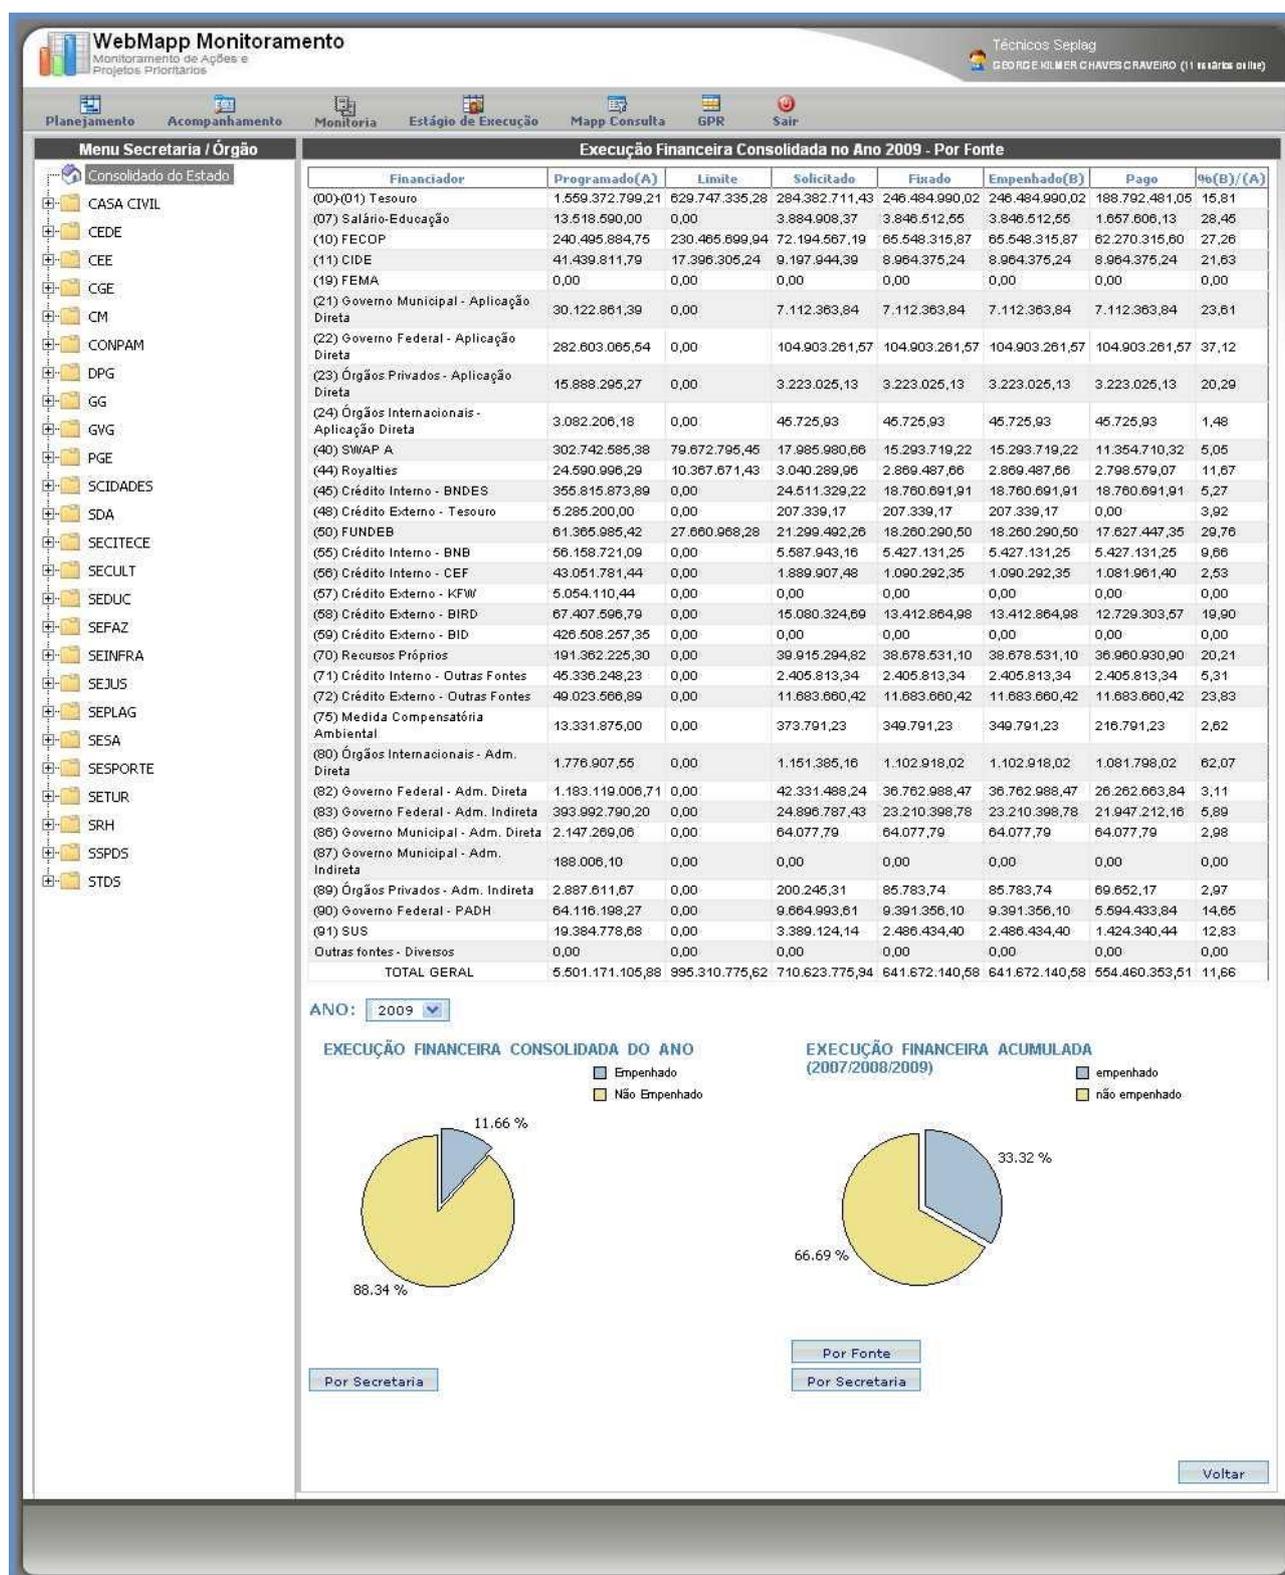


Figura 29 – Tela da execução financeira de 2009 por fonte do modulo de monitoria do WebMapp

A Figura 30 mostra as mesmas informações, mas organizadas por Secretaria.

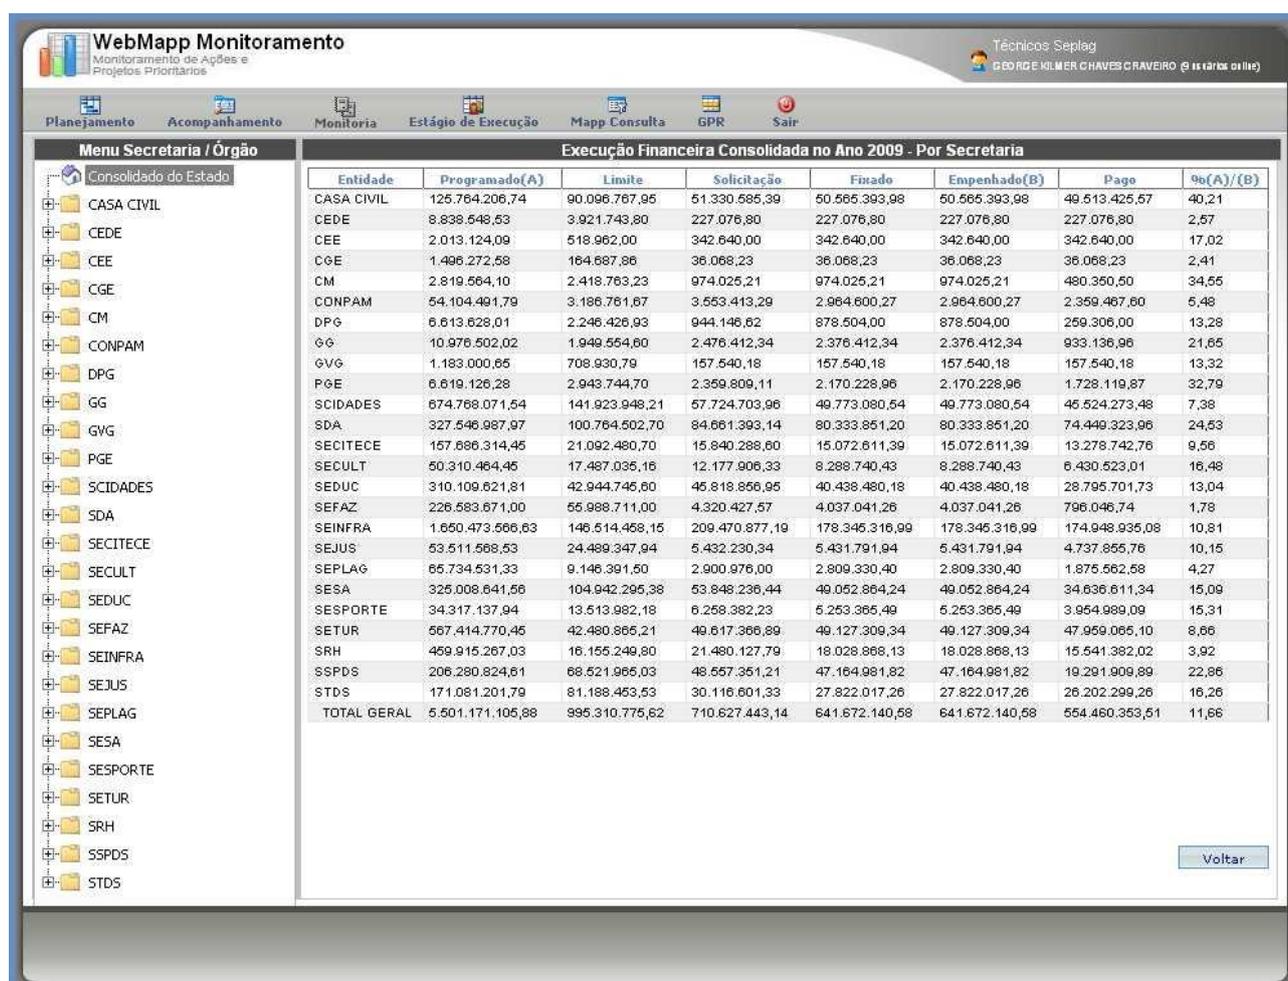


Figura 30 – Tela da execução financeira de 2009 por secretaria do módulo de monitoria do WebMapp

Os mesmos procedimentos adotados acima podem ser adotados para a execução acumulada.

Visualiza-se também um gráfico tipo pizza onde se observa o perfil de distribuição dos estágios de execução dos projetos inseridos no MAPP. Abaixo do gráfico, há um botão de detalhamento. Ao clicar neste botão, o sistema abre um quadro com os estágios de execução e as respectivas quantidades absolutas e relativas.

Pode-se também fazer a mesma pesquisa por Secretaria ou por Órgão. Primeiramente, deve ser selecionada a Secretaria que se deseja obter informações clicando sobre a pasta respectiva à esquerda da tela. Ao se fazer isto, abre-se a tela mostrada na Figura 31.

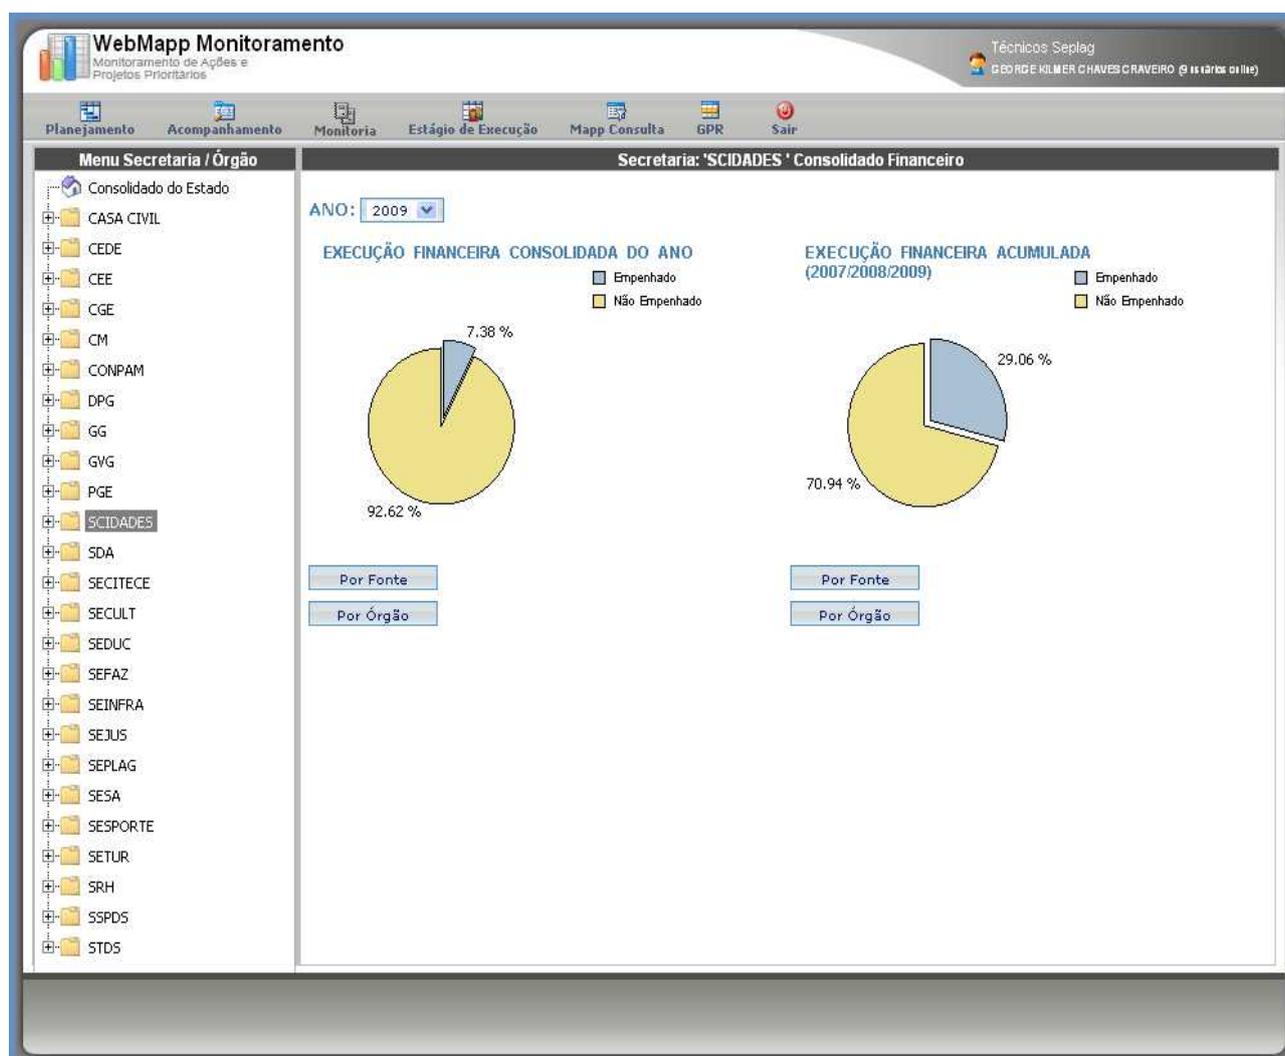


Figura 31 – Tela principal da consulta por secretaria do módulo de monitoria do WebMapp

No exemplo já utilizado (Secretaria das Cidades), deve-se observar que a tela abre os gráficos do tipo pizza de execução financeira consolidada por ano e execução financeira acumulada.

Aqui também se pode gerar tabelas organizadas por fonte ou por órgão, bastando, para tanto, clicar no botão correspondente à opção desejada. As Figuras 32 e 33 mostram os quadros de execuções financeiras organizadas, respectivamente, por fonte e por órgão.

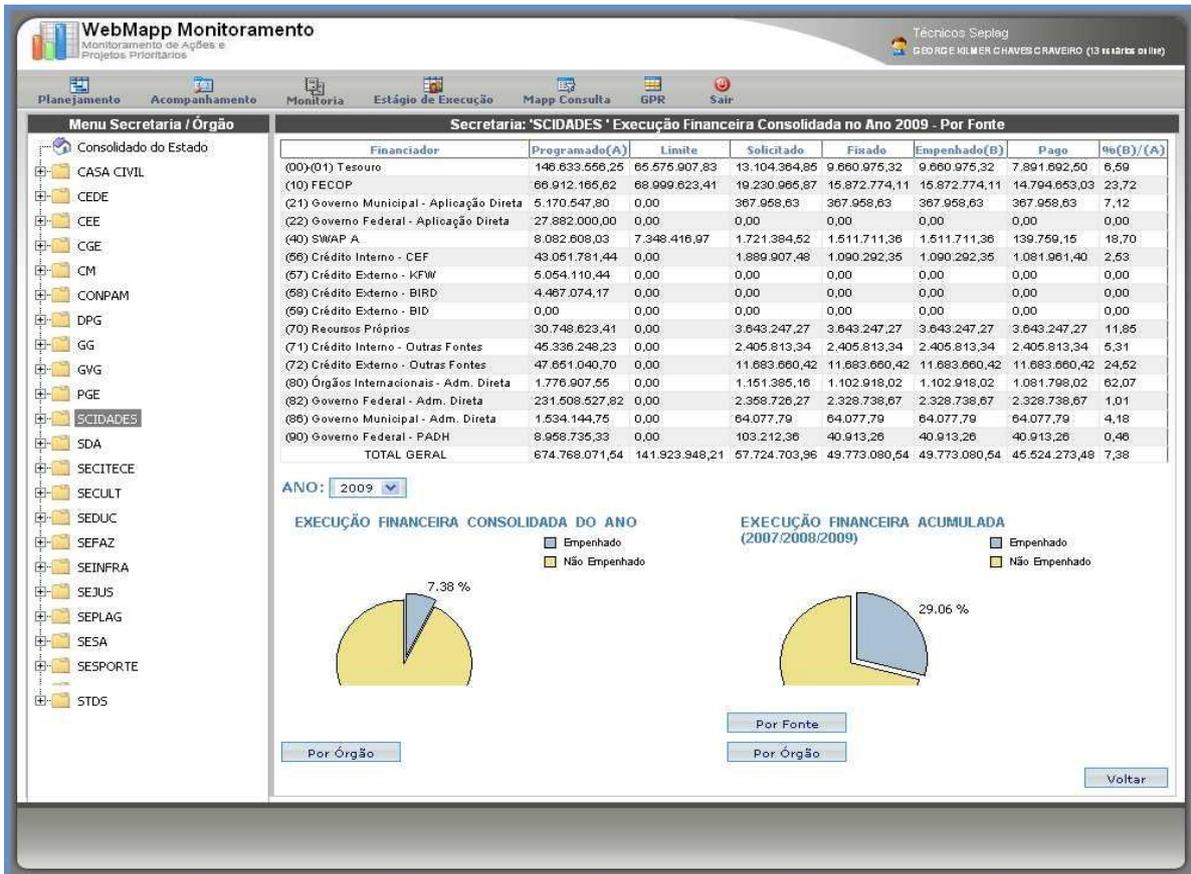


Figura 32 – Tela da execução financeira de 2009 por fonte do módulo de monitoria do WebMapp

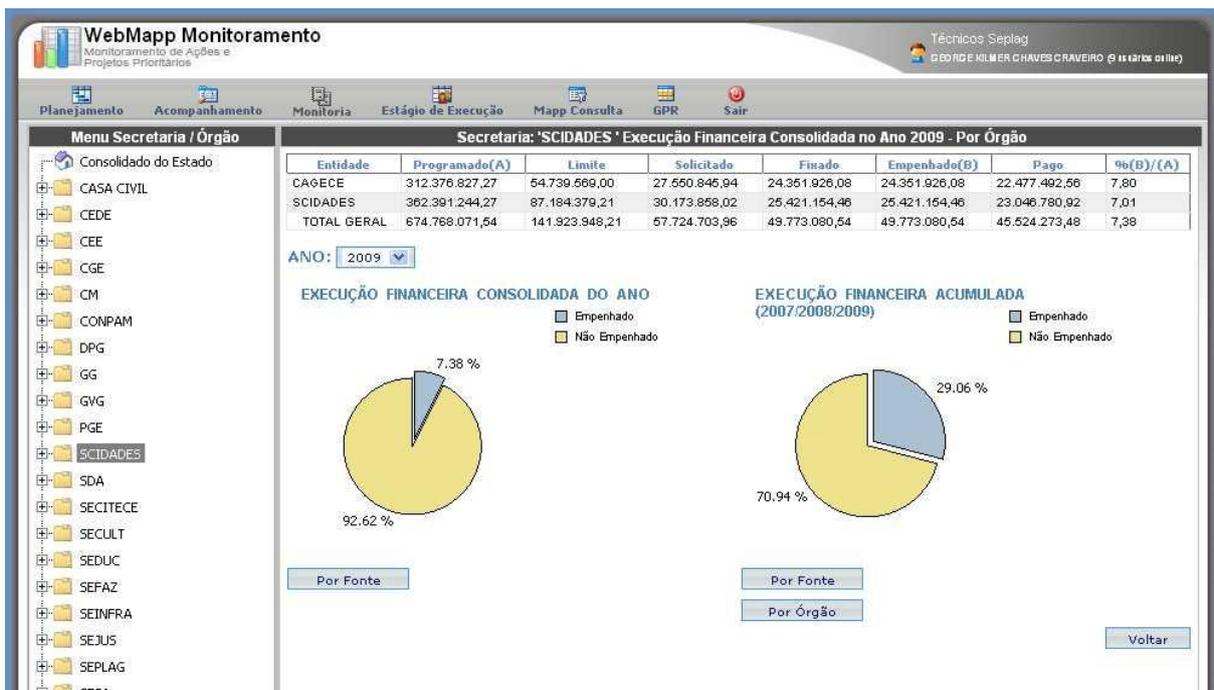


Figura 33 – Tela da execução financeira de 2009 por órgão do módulo de monitoria do WebMapp

Para se prosseguir com a pesquisa, deve-se clicar no (+), pois o sistema abrirá opção para selecionar projetos ou estágio de execução e as pastas correspondentes aos Órgãos. Caso se deseje selecionar as opções anteriores (*Projetos* e *Estágio de Execução*) nos Órgãos, basta clicar sobre o ícone (+) e abrir estas opções para os Órgãos, conforme mostra a Figura 34.



Figura 34 – Detalhe da consulta por projeto e por estágio de execução do módulo de monitoria do WebMapp

Ao ser selecionada a opção projetos, o sistema abre um quadro onde estão listados os projetos com os respectivos estágios de execução, execução financeira do ano e execução financeira acumulada, conforme mostra a Figura 35.

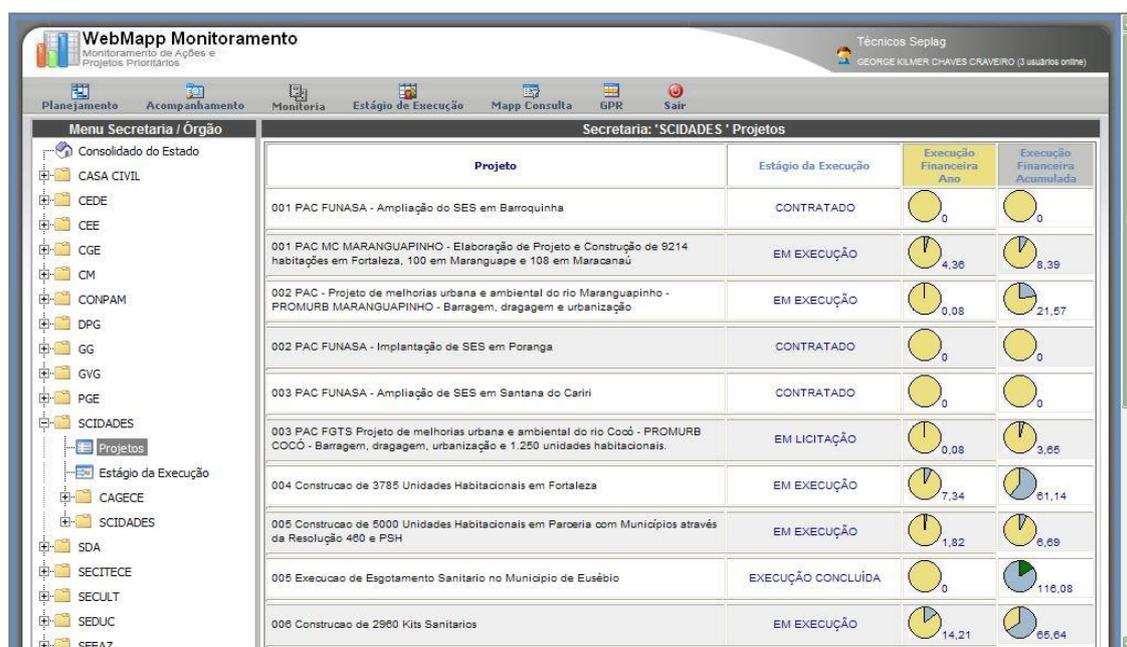


Figura 35 – Listagem de projetos da Secretaria das Cidades no módulo de Monitoramento do WebMapp

A partir desse quadro, pode-se ir um pouco mais além. Quando é clicado o estágio de execução do projeto, o sistema abrirá uma tabela com as informações prestadas no último acompanhamento, conforme ilustra a Figura 36.



Figura 36 – Acompanhamento do projeto no módulo de Monitoramento do WebMapp

Para se fechar esta caixa, basta clicar duas vezes no estágio de execução. Para se obter os valores correspondentes aos gráficos de execução financeira do ano e execução financeira acumulada, devem ser clicados os gráficos correspondentes e o sistema abrirá uma tabela com os valores programados, solicitados, fixados, empenhados e pagos, bem como os limites liberados pelo COGERF, consolidados por ano ou acumulados.

As Figuras 37 e 38 mostram, respectivamente, a execução financeira acumulada (2007, 2008 e 2009) e a execução financeira no ano. Observe-se que o quadro de Execução Financeira Acumulada é cinza e o quadro da Execução Financeira do Ano é amarelo.

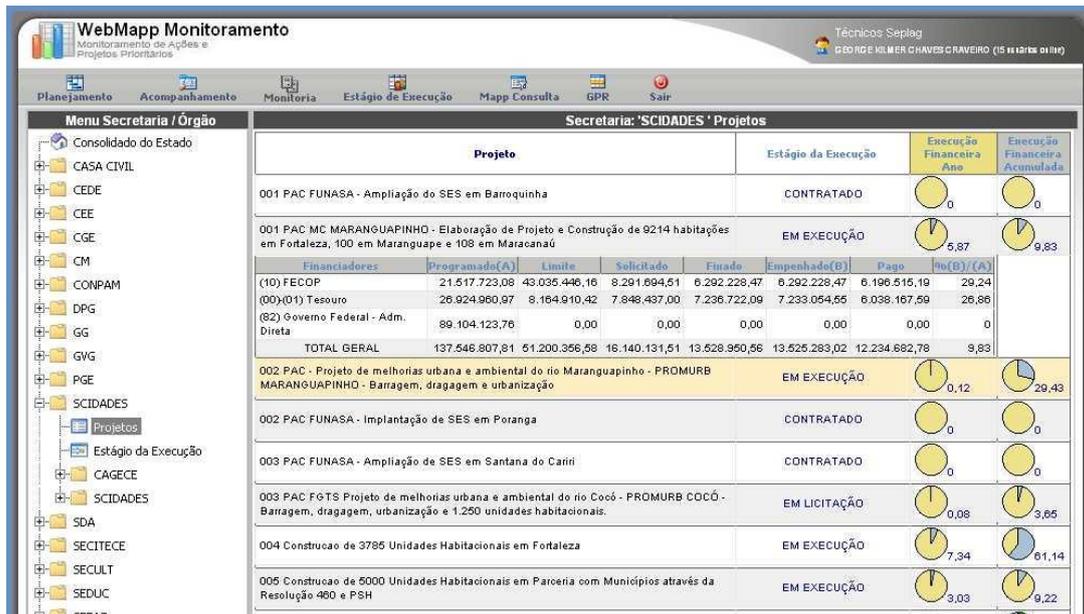


Figura 37 – Execução Financeira Acumulada por fonte no modulo de Monitoramento do Webmapp

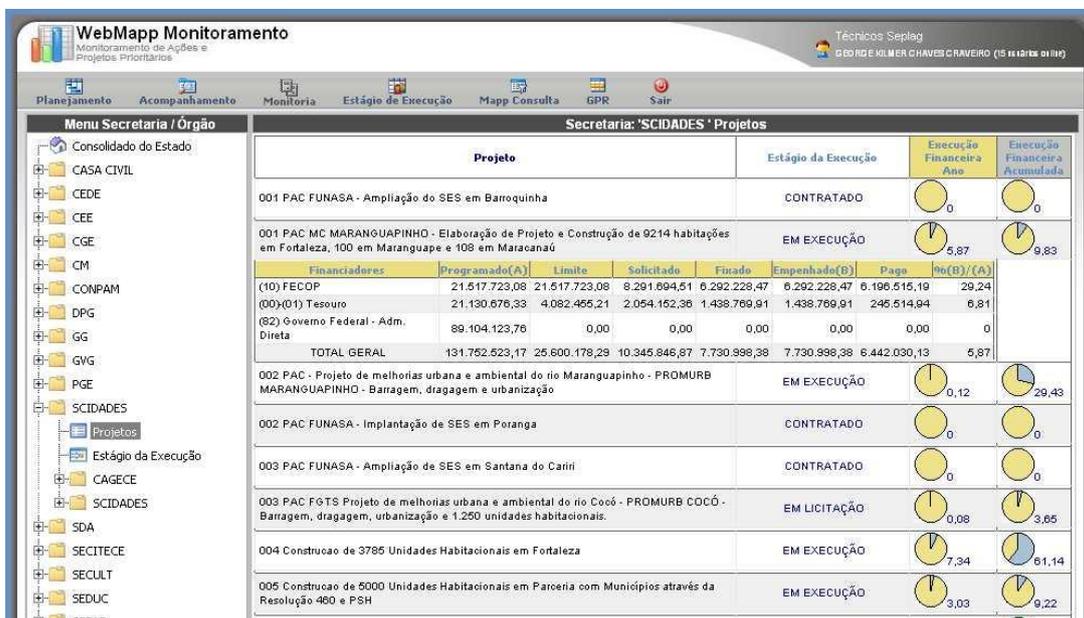


Figura 38 - Execução Financeira do ano por fonte no modulo de Monitoramento do Webmapp

O fechamento das caixas se dá da mesma forma do estágio de execução.

A caixa de seleção Estágio de Execução fornece informações sobre o perfil de distribuição dos estágios de execução dos projetos, como mostrado na Figura 39.

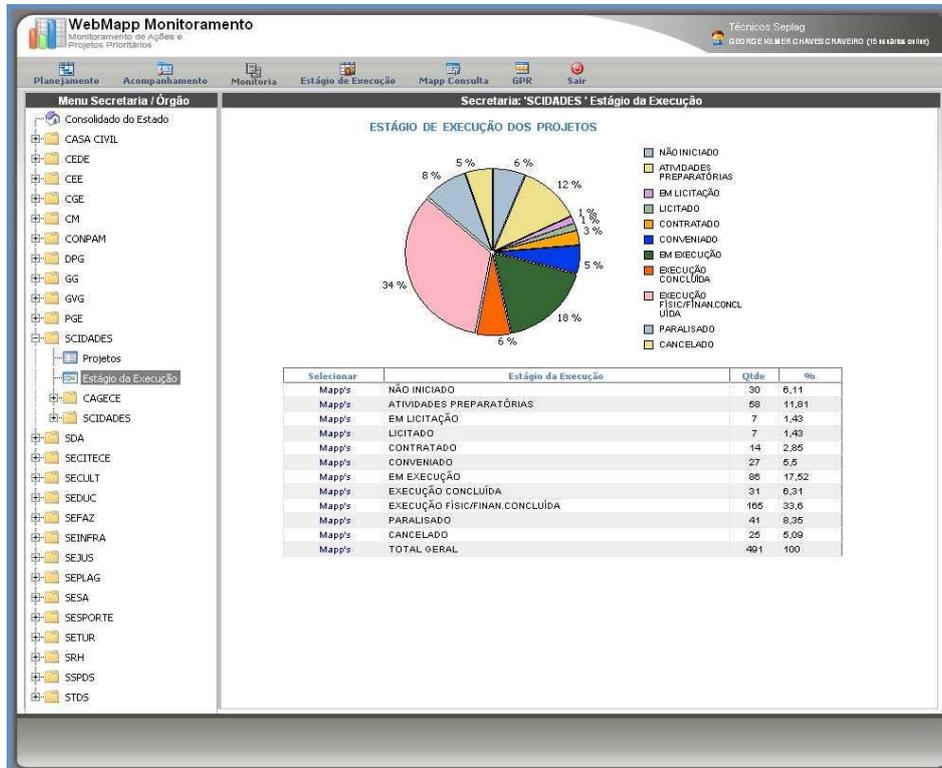


Figura 39 – Estágios de execução dos projetos no módulo de monitoramento do WebMapp

Ao se entrar na tela, visualiza-se um gráfico do tipo pizza com os percentuais dos diversos estágios de execução, tais como: Não iniciado, Paralisado, Licitado, Em Execução e outros.

Logo abaixo do gráfico, vê-se uma tabela onde são listados os estágios de execução com as respectivas quantidades absoluta e percentual.

Caso se queira saber que projetos estão classificados em um determinado estágio de execução, basta clicar duas vezes na coluna Mapp's que se deseja consultar para que o sistema abra um quadro com a listagem dos projetos naquele estágio, conforme mostra a Figura 40.

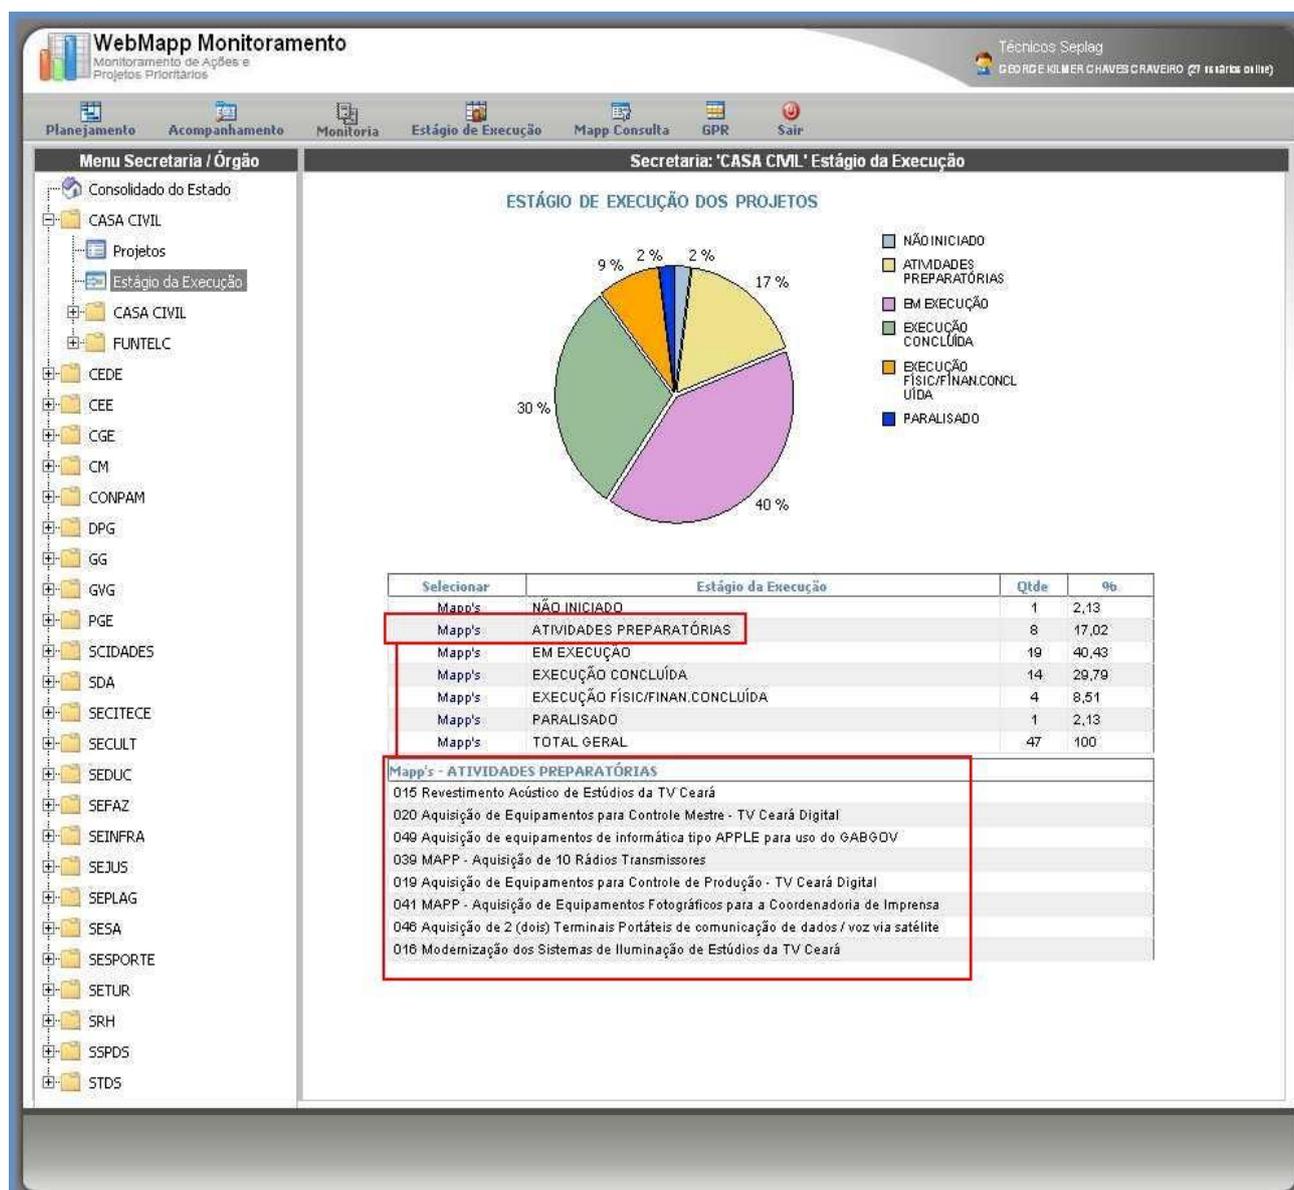


Figura 40 – Listagem de projetos por estágio de execução no módulo de monitoramento do WebMapp

Acompanhando o modelo mostrado na figura 40, quando se seleciona a Casa Civil, observa-se que 2% de seus projetos configuram como não iniciados, 17% em atividades preparatórias, 40% em execução, 30% em execução concluída, 9% em execução físico/financeira concluída e 2% paralisado. Caso se deseje saber quais projetos ainda se encontram em atividades preparatórias, basta clicar em [Mapp's](#) e o sistema abrirá um quadro com todos os projetos em atividades preparatórias, conforme mostra a Figura 40.

3.4 - Módulo de Estágio de Execução

O Módulo de Estágio de Execução é utilizado para inserir informações sobre a execução física dos projetos. Esse Módulo é de suma importância, pois é a partir dele que o Governador obtém informações qualitativas sobre os projetos.

O projeto deve ser acompanhado sempre que o mesmo sofrer alterações relevantes. A seguir estão listados os estágio de execução, conforme a IN 04/2008.

- **Não Iniciado** - Será considerado não iniciado o projeto aprovado que não tenha dado início a nenhuma execução física ou atividade de preparação para execução (preparação de termos de referência, elaboração de editais de licitação, celebração de convênios de receita e outros). Obs.: O gestor deverá informar, no campo de observação, a razão de os projetos ainda não terem sido iniciados e/ou a previsão de providências para viabilizar o início da execução.
- **Em Atividades Preparatórias** - Será considerado neste estágio o projeto que se caracterizar como ainda em preparação, tendo em vista que o órgão executor encontra-se realizando atividades anteriores ao processo de licitação/contratação, tais como: preparação dos termos de referência, elaboração de editais de licitação, elaboração de projetos básicos, preparação de convênio, etc..
- **Em Licitação** - Será considerado desta forma o projeto que se encontra na etapa compreendida entre o cadastramento do processo de licitação na PGE e a sua finalização.
- **Licitado** - O projeto com licitação homologada e ainda não contratado deverá ser classificado como licitado.
- **Contratado/Conveniado** - Será considerado contratado ou conveniado o projeto com contratos ou convênios de execução assinados e cuja execução ainda não tenha sido iniciada. Obs. O gestor deverá informar, no campo de observação, a data da assinatura do contrato ou convênio e a previsão do início da execução.
- **Em Execução** - Será considerado em execução o projeto cujo objeto encontra-se com a execução iniciada. Obs.: O gestor deverá informar, no campo de observação, informações relevantes sobre a execução do projeto.
- **Paralisado** - Será considerado neste estágio o projeto iniciado, cuja execução esteja temporariamente interrompida. Obs.: O gestor deverá informar, no campo de observação, a data da paralisação do projeto, bem como o motivo e as providências que estão sendo tomadas para retomar a execução.

- **Cancelado** - Será considerado neste estágio o projeto iniciado, mas cancelado definitivamente pelo órgão executor. Obs.: O gestor deverá informar, no campo de observação, a data e o motivo do cancelamento.
- **Execução Física Concluída** - Será considerado como pertencente a este estágio o projeto com execução física concluída, tais como obra recebida, equipamento recebido ou evento realizado, mas com pagamentos pendentes. Obs.: O gestor deverá informar, no campo de observação, a data de conclusão das obras ou do contrato e o motivo da existência de pendências financeiras.
- **Execução Física e Financeira Concluída** - É considerado desta maneira o projeto com execução física concluída e com a totalidade dos pagamentos efetuados.

Agora, com o entendimento do significado de cada estágio de execução, pode-se navegar no Módulo de Estágio de Execução.

Primeiramente, importa que se compreenda a utilidade deste Módulo que serve, única e exclusivamente, para se inserir informações sobre o acompanhamento físico dos projetos.

O acesso se dá ao ser selecionado o ícone **Mapp Estágio de Execução** na tela principal do WebMapp, conforme ilustra a figura 41.

Na tela inicial de referido Módulo, há três caixas de seleção: Secretaria, Órgão e Programa.

A busca do projeto que se deseja acompanhar pode ocorrer de dois modos. Pode-se selecionar a Secretaria, o Órgão e o Programa ou, simplesmente, digitar uma palavra chave no campo que fica logo abaixo das caixas.

WebMapp Planejamento
Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários

Técnicos Seplag
GEORGE KILMER CHAVES CRAVEIRO (6 usuários online)

Planejamento Acompanhamento Monitoria Estágio de Execução Mapp Consulta GPR Sair

Estágio de Execução

Secretaria: Todas as Secretarias
Órgão:
Programa:

Ordenar por Código
Ordenar por Código

Buscar em 5153 Projetos

Projeto MAPP	Data Estágio	Estágio
Implantação do Veículo Leve sobre Trilhos - VLT, de Passageiros, entre Parangaba-Mucuripe/Aeroporto-Casteirão		
001 Ações de defesa animal do Estado do Ceará	19/12/2008	CONVENIADO
001 Ampliação do Complexo Portuário do Pecém - Terminal de Múltiplo Uso - TMUT	07/05/2009	EM EXECUÇÃO
001 Ampliação na rede de distribuição de gás	28/05/2009	EM EXECUÇÃO
001 APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO ESTADUAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FECA	17/12/2008	EM EXECUÇÃO
001 Aquisição de automóvel Tipo SUV para a ETICE	05/12/2008	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA
001 AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, PARA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO PRESO DA DEFENSORIA PÚBLICA E A SALA DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE SENADOR POMPEU.	30/07/2008	EXECUÇÃO CONCLUÍDA
001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEDUC/CREDE/SEFOR	11/03/2009	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA
001 Aquisição de Helicóptero Biturbina para Monitoramento e Controle Ambiental	26/02/2009	NÃO INICIADO
001 Aquisição de Mobiliário	19/12/2008	EM EXECUÇÃO
001 Aquisição de Veículos (1 Sedan, 2 Vans de 8 Lugares e 4 Hatchs)	04/05/2009	EXECUÇÃO CONCLUÍDA
001 Aquisição de Veículos (1 Tipo Minivan de 8 lugares, 2 Tipo Hatch, 2 Tipo Sedan, 1 Tipo SRV)	17/12/2008	EXECUÇÃO CONCLUÍDA
001 Aquisição de Veículos (3 Tipo SRV, 1 Tipo Sedan e 2 Tipo Hatch)	01/08/2008	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA
001 Aquisição de Viaturas (01 Caminhonete Tipo SUV p, 01 Tipo sedan p, 01 Tipo sedan,02 Tipo sedan, 01 Tipo sedan, 01 Tipo SRV, 3 Tipo	12/11/2008	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA

Figura 41 – Listagem dos projetos no módulo de Estágio de Execução

WebMapp Planejamento
Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários

Técnicos Seplag
GEORGE KILMER CHAVES CRAVEIRO (6 usuários online)

Planejamento Acompanhamento Monitoria Estágio de Execução Mapp Consulta GPR Sair

Estágio de Execução

Secretaria: 31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR (SECITECE)
Órgão: 31200002 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ (UVA)
Programa: 196 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Ordenar por Código
Ordenar por Código

Buscar em 2 Projetos

Projeto MAPP	Data Estágio	Estágio
004 Publicação dos Anais do Workshop sobre as Bacias Hidrográficas dos Rios Acaraú e Coreaú - UVA	27/07/2008	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA
029 Programa de Apoio à Pós-Graduação - PROAP / Desenvolvimento da Pós-Graduação em convênio com a CAPES	29/05/2009	EM EXECUÇÃO

1

Copyright © SEPLAG 2009. Todos os direitos reservados

SEPLAG

Figura 42 – Listagem dos projetos da UVA no módulo de Estágio de Execução

Uma vez localizado o projeto, deve-se clicar sobre sua descrição, para se passar para a próxima tela, conforme mostra a Figura 43.

The screenshot shows the 'WebMapp Planejamento' interface. At the top, there are navigation tabs: Planejamento, Acompanhamento, Monitoria, Estágio de Execução, Mapp Consulta, GPR, and Sair. The user is logged in as 'Técnicos Seplag' (GEORGE KILMER CHAVES CRAVEIRO). The main content area is titled 'Estágio de Execução' and contains the following information:

- Secretaria: 31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR (SECITECE)
- Órgão: 31200002 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ (UVA)
- Programa: 196 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
- Mapp: 004 Publicação dos Anais do Workshop sobre as Bacias Hidrográficas dos Rios Acaraú e Coreaú - UVA
- Est. Atual: EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.CONCLUÍDA

A warning message is displayed: "Caro usuário, antes de lançar um acompanhamento no estágio "EM LICITAÇÃO", é necessário incluir (o)s SPU(s) referente(s) à(s) licitação(ões) encaminhada(s) a PGE deste projeto." Below this is a 'Voltar p/ Listagem' button.

The 'Estágio de Execução' table is as follows:

Estágio	Data Estágio	Observação
EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.CONCLUÍDA	27/07/2008	Execução concluída.
EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.CONCLUÍDA	25/06/2008	Concluído os serviços gráficos dos 1.000 exemplares dos Anais. Efetuado o pagamento a empresa no valor de R\$ 4.540,00.
EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.CONCLUÍDA	19/06/2008	Concluído os serviços gráficos dos 1.000 exemplares dos Anais. Efetuado o pagamento a empresa no valor de R\$ 4.540,00. Em elaboração a prestação de contas do Convênio para envio ao BNB até 30/06.
EXECUÇÃO CONCLUÍDA	10/06/2008	Foram impressos hum mil (1.000) exemplares dos Anais do Workshop sobre as Bacias Hidrográficas dos Rios Acaraú e Coreaú.
LICITADO	20/04/2008	Cotação eletrônica realizada sendo a empresa vencedora Gráfica Comercial Pery, com o valor final de R\$ 4.540,00. Estando em fase de solicitação de parcela para emissão da nota de empenho.
EM EXECUÇÃO	01/04/2008	Cotação Eletrônica nº 001/2008 marcada para o dia 07/04/2008 para contratação de serviços de impressão e encadernação dos Anais do Workshop sobre as Bacias Hidrográficas dos Rios Acaraú e Coreaú, conforme Processo nº 07458409-0/SPU, IG nº 077874000.

Figura 43 – Histórico dos acompanhamentos do projeto selecionado no módulo de estágio de Execução do WebMapp

Nessa tela, há a descrição do projeto e os estágios de execução pelos quais já passou, bem como as respectivas datas e observações. Na parte inferior da tela, encontra-se um botão denominado **Incluir Estágio de Execução**, utilizado para acessar a tela de inclusão do acompanhamento, conforme mostra a Figura 44.

Nessa tela, existe uma caixa de seleção e dois campos de digitação. Na caixa de seleção, denominada Estágio, deve-se selecionar o estágio de execução e nas caixas posteriores informar a data do estágio e a observação. Ao final, salva-se o acompanhamento no botão **Gravar Estágio de Execução** e **Voltar p/ Listagem**.

Esse módulo dispõe de um relatório, que pode ser acessado na tela principal do módulo através do botão **Relatório Estágio de Execução**.

Na parte inferior da tela, há um botão denominado **Incluir Novo Processo**, utilizado para acessar a tela de inclusão do N° SPU (Sistema de Protocolo Único), conforme mostra a Figura 45.

WebMapp Planejamento
Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários

Técnicos Seplag
GEO PGE HILMER C HAVES CRAVEIRO (12 estados online)

Planejamento Acompanhamento Monitoria Estágio de Execução Mapp Consulta GPR Sair

Estágio de Execução

Secretaria: 31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR (SECITECE) Ordenar por Código
 Órgão: 31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR (SECITECE) Ordenar por Descrição
 Programa: 400 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SECITECE

Mapp: 001 Aquisição de 2 Veículos Tipo Hatch
 Est. Atual: EXECUÇÃO FÍSIC.FINIAL.CONCLUÍDA

! Caro usuário, antes de lançar um acompanhamento no estágio "EM LICITAÇÃO", é necessário incluir (o)s SPU(s) referente(s) à(s) licitação(ões) encaminhada(s) a PGE deste projeto.
 Caro Usuário, O sistema verificou que existe pelo menos um acompanhamento no estágio "EM LICITAÇÃO", é necessário o cadastramento do(s) SPU(s) referente(s) à(s) licitação(ões) encaminhada(s) a PGE deste projeto.

Voltar p/ Listagem

Estágio de Execução

Estágio: Selecione um Estágio financeiro
 Data do Estágio:
 Observação:

Gravar Estágio de Execução Voltar

Protocolo Licitatório (SPU)

Número SPU: 1

Incluir Novo Processo

Copyright © SEPLAG 2009. Todos os direitos reservados SEPLAG

Figura 44 – Tela de Inclusão do Estágio de Execução no módulo de Estágio de Execução do WebMapp

Estágio de Execução

Secretaria: 31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR (SECITECE) Ordenar por Código
 Órgão: 31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR (SECITECE) Ordenar por Descrição
 Programa: 400 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SECITECE

Mapp: 001 Aquisição de 2 Veículos Tipo Hatch
 Est. Atual: EXECUÇÃO FÍSIC.FINIAL.CONCLUÍDA

! Caro usuário, antes de lançar um acompanhamento no estágio "EM LICITAÇÃO", é necessário incluir (o)s SPU(s) referente(s) à(s) licitação(ões) encaminhada(s) a PGE deste projeto.
 Caro Usuário, O sistema verificou que existe pelo menos um acompanhamento no estágio "EM LICITAÇÃO", é necessário o cadastramento do(s) SPU(s) referente(s) à(s) licitação(ões) encaminhada(s) a PGE deste projeto.

Voltar p/ Listagem

Estágio de Execução

Estágio: CONVENIADO
 Data do Estágio:
 Observação:

Gravar Estágio de Execução Voltar

Protocolo Licitatório (SPU)

Nº SPU:

Gravar SPU Cancelar SPU

Figura 45 – Tela de Inclusão do número do SPU do processo licitatório no módulo de Estágio de Execução do WebMapp

WebMapp Planejamento
Monitoramento de Ações e
Projetos Prioritários

Usuário: MARCOS MEDEIROS /On-line: 1

MAPP Planejamento MAPP Acompanhamento MAPP Monitoria Estágio de Execução MAPP Limites Calculadora

Relatório Estágio de Execução

Secretaria: Todas as Secretarias
Órgão:
Programa:
Projeto Mapp:

Último Estágio de Execução Todos os Estágios de Execução

Tipo de Relatório
 Acrobat PDF Microsoft Word (DOC) Microsoft Word (RTF) Microsoft Excel

Voltar p/ Listagem Visualizar

© 2007 SEPLAG. Todos os direitos reservados. SEPLAG

Figura 46 – Tela de solicitação do relatório do Estágio de Execução no WebMapp

Na tela mostrada na figura 46, encontram-se quatro caixas de seleção: Secretaria, Órgão, Programa e Projeto. Estas caixas devem ser utilizadas para selecionar o nível de detalhamento do relatório. A visualização do relatório é conseguida clicando no botão **Visualizar**.

3.5 - Módulo de Consulta

Para acessar o módulo de consulta, deve ser clicado o ícone **MAPP Consulta**.

O Módulo de Consulta é responsável pela produção de relatórios gerenciais acerca da programação e execução físico-financeira dos projetos. O Módulo de Consulta serve apenas para visualização dessas informações, inexistindo, portanto, formas de inserção de dados.

Nesse módulo, pode-se acessar as seguintes consultas:

- 1 – Programação e Execução Financeira Anual por projeto;
- 2 - Programação e Execução Financeira por projeto (opção Fonte);
- 3 - Programação e Execução Financeira Anual por projeto (opção produto e município);
- 4 - Programação e Execução Financeira por Município e Ano;
- 5 - Execução Financeira por Produto;

6 – Execução Física por Produto.

A figura abaixo mostra a tela principal do módulo de consulta



Figura 47 - Tela principal do módulo de consulta do WebMapp

A **consulta 1** fornece um relatório com os seguintes campos: Órgão, Descrição do Projeto Mapp, Estágio de Execução, Valores programados e empenhados e Percentual de execução. A figura 48 mostra o formato dessa consulta.

The screenshot shows the 'WebMapp Consulta' interface with a detailed report. The filters are:

- Consulta:** 01-Programação e Execução Financeira Anual por Projeto
- Secretaria:** 27000000 - SECRETARIA DA CULTURA (SECULT)
- Órgão:** 27000000 - SECRETARIA DA CULTURA (SECULT)
- Programa:** 666 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA - SECULT
- Mapp:** Todos os Mapps
- Tipo Projeto:** Mapp
- Estágio:** Todos os Estágios
- Ano:** 2007, 2008, 2009 (checked), 2010
- Fonte:** 00

 A summary table is highlighted with a red box and labeled 'Acumulado do Programado e do Empenhado':

Total Programado	Total Empenhado	%
5.926.152,57	535.122,77	9,03%

 Below this is a table titled 'Programação e Execução Financeira Anual por Projeto':

Órgão	Descrição Mapp	Estágio	Programado	Empenhado	%
SECULT	173 - Adaptação do Edifício São Luís, para sediar a SECULT	EM EXECUÇÃO	3.026.511,41	220.627,19	7,26%
SECULT	192 - Reforma e Adaptação Física do Edifício São Luís - Universidade do Trabalho Digital	EM EXECUÇÃO	1.500.000,00	0,00	0,00%
SECULT	251 - SISTEMA DE AR CONDICIONADO DESTINADO À CLIMATIZAÇÃO DO THEATRO JOSÉ DE ALENCAR	EM EXECUÇÃO	837.000,00	301.750,00	36,05%
SECULT	318 - REFORMA EMERGENCIAL DO ARQUIVO PÚBLICO	EM EXECUÇÃO	177.935,25	0,00	0,00%
SECULT	54 - Aquisição de Mobiliário e de Equipamentos	EM EXECUÇÃO	165.811,11	12.745,58	7,68%
SECULT	317 - REFORMA EMERGENCIAL DA COBERTA DA BIBLIOTECA PÚBLICA GOVERNADOR MENEZES PIMENTEL	EM EXECUÇÃO	116.904,80	0,00	0,00%
SECULT	38 - Modernização da Frota de Veículos (aquisição de 2 Tipo sedan, 1 Tipo van, 1 Tipo pick-up, 1 Tipo hatch e 2 motocicletas 125 cc)	LICITADO	99.990,00	0,00	0,00%
SECULT	43 - Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Museu de Arte Contemporânea	EXECUÇÃO FÍSIC./FINAN.CONCLUÍDA	0,00	0,00	0,00%

 At the bottom left, there is a copyright notice: '© 2009 SEPLAG. Todos os direitos reservados.'

Figura 48 - Tela da consulta 1 do módulo de Consulta do Webmapp

Ao se clicar em **Ver/Alterar Fontes**, o sistema abrirá uma janela onde será possível selecionar as fontes de recursos utilizadas nessa consulta. A figura 49 mostra a tela para seleção da fonte utilizada na consulta.

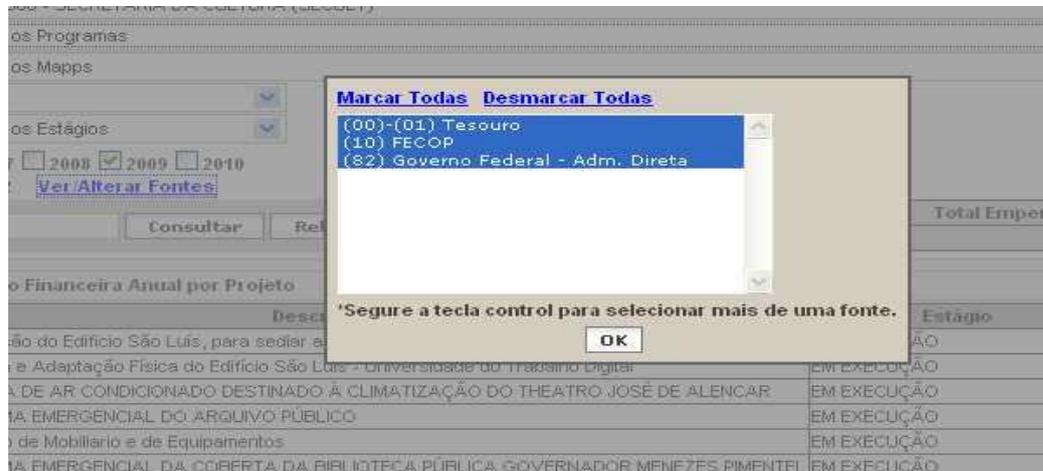


Figura 49 - Tela de seleção da fonte de recursos no módulo de Consulta do WebMapp

Quando é clicada a coluna do estágio de execução, o sistema mostra um quadro com o histórico dos acompanhamentos realizados pela secretária para o projeto selecionado, conforme mostra a figura 50.

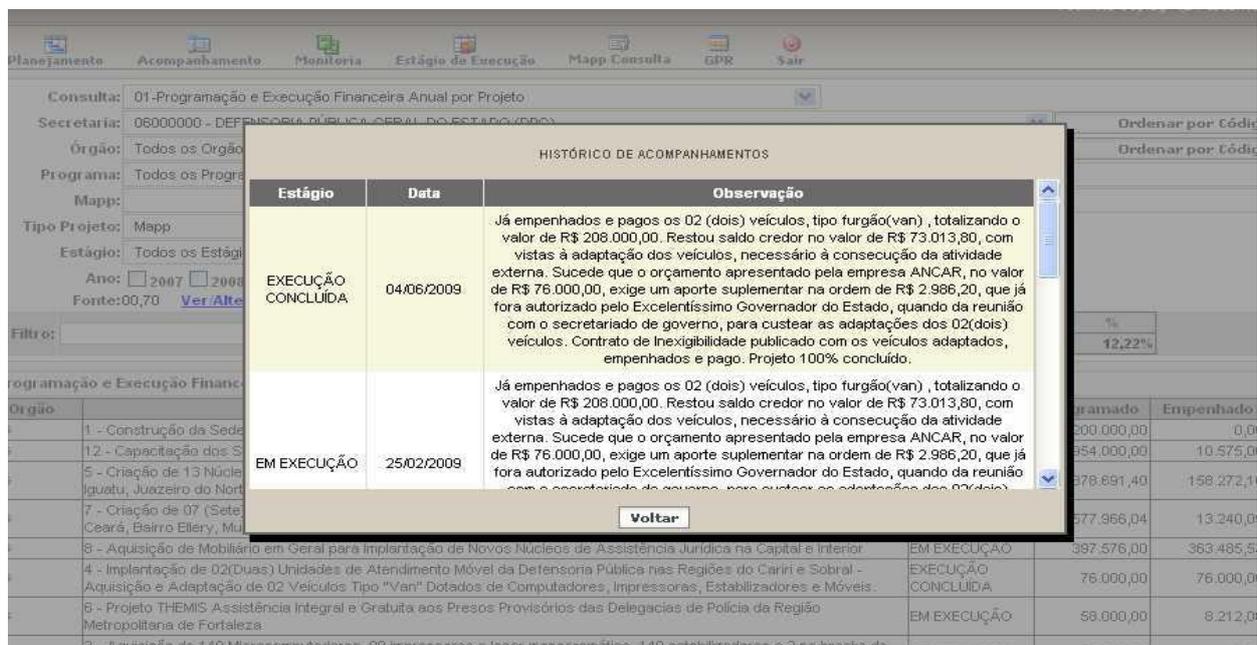


Figura 50 – Histórico dos acompanhamentos do projeto Mapp no módulo de Consultas do WebMapp

Por meio do ícone da programação físico-financeira, o sistema mostrará um quadro da programação e execução físico-financeira dos produtos e subprodutos por município, como demonstrado na figura 51.

PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Mapp: 4 - Implantação de 02(Duas) Unidades de Atendimento Móvel da Defensoria Pública nas Regiões do Cariri e Sobral - Aquisição e Adaptação de 02 Veículos Tipo "Van" Dotados de Computadores, Impressoras, Estabilizadores e Móveis.

Anos: 2007 2008 2009 2010 (Ocultar Municípios) (Ocultar Subprodutos)

Produto/Subproduto	Município	Unidade	Qtd Prevista	Qtd Realizada	%	Valor Programado	Valor Empenhado	%
VEÍCULO ADQUIRIDO E ADAPTADO	SOBRAL	und	1	0	0,00%	38.000,00	38.000,00	100,00%
-VAN	-	und	1	0	0,00%	38.000,00	38.000,00	100,00%
VEÍCULO ADQUIRIDO E ADAPTADO	JUAZEIRO DO NORTE	und	1	0	0,00%	38.000,00	38.000,00	100,00%
-VAN	-	und	1	0	0,00%	38.000,00	38.000,00	100,00%

Voltar

Figura 51 – Quadro da programação e execução físico-financeira do projeto Mapp no módulo de Consulta do Webmapp

Os comentários anteriores, referentes às figuras 50 e 51, servem também para as consultas 2 e 3, Programação e Execução Financeira por projeto (opção fonte) e Programação e Execução Financeira Anual por projeto (opção produto e município), respectivamente.

A **consulta 2** fornece um relatório com os seguintes campos: Órgão, Descrição do Projeto Mapp, Estágio de Execução, Valores programados e empenhados para os anos 2007, 2008, 2009 e 2010, bem como o percentual de execução total do projeto. A figura 52 mostra o formato dessa consulta.

A **consulta 3** apresenta o mesmo formato da consulta 2, diferindo apenas nos filtros de seleção. Ao passo que a consulta 2 oferece o filtro de fontes de recursos, a consulta 3, por seu turno, permite a seleção dos produtos e municípios. As figuras 52 e 53 ilustram, respectivamente, as consultas 2 e 3.

WebMapp Consulta

GEORGE KILMER CHAVES CRAVEIRO
Técnicos Seplag (9 usuários online)

Planejamento Acompanhamento Monitoria Estágio de Execução Mapp Consulta GPR Sair

Consulta: 02-Programação e Execução Financeira por Projeto (Opção Fonte)

Secretaria: 27000000 - SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) Ordenar por Código

Órgão: 27200004 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA (FEC) Ordenar por Código

Programa: 134 - MEMÓRIA CULTURAL

Mapp: Todos os Mapps

Tipo Projeto: Mapp

Fonte: 70 [Ver/Alterar Fontes](#)

Filtro:

	2007	2008	2009	2010	Total
Prog	0,00	199.229,69	80.000,00	0,00	279.229,69
Emp	0,00	199.229,69	60.000,00	0,00	259.229,69
%		100,00%	75,00%		92,84%

Programação e Execução Financeira por Projeto (Opção Fonte)

Orgão	Descrição Mapp	2007	2008	2009	2010	Total	%
FEC:	8 - Edital de Apoio ao Patrimônio Edificado e Preservação de Acervos Museológicos - 2007	P: 0,00 E: 0,00	P: 80.000,00 E: 80.000,00	P: 20.000,00 E: 0,00	P: 0,00 E: 0,00	P: 100.000,00 E: 80.000,00	80,00%
FEC:	26 - APOIO AS AÇÕES CULTURAIS DA ACADEMIA CEARENSE DE LETRAS E CONSERVAÇÃO DO PALACIO DA LUZ.	P: 0,00 E: 0,00	P: 60.000,00 E: 60.000,00	P: 60.000,00 E: 60.000,00	P: 0,00 E: 0,00	P: 120.000,00 E: 120.000,00	100,00%
FEC:	29 - RECUPERAÇÃO DA BIBLIOTECA PESSOA DO PADRE CICERO	P: 0,00 E: 0,00	P: 59.229,69 E: 59.229,69	P: 0,00 E: 0,00	P: 0,00 E: 0,00	P: 59.229,69 E: 59.229,69	100,00%

© 2009 SEPLAG. Todos os direitos reservados.

Figura 52 - Tela da consulta 2 do módulo de Consulta do Webmapp

WebMapp Consulta

GEORGE KILMER CHAVES CRAVEIRO
Técnicos Seplag (10 usuários online)

Planejamento Acompanhamento Monitoria Estágio de Execução Mapp Consulta GPR Sair

Consulta: 03-Programação e Execução Financeira por Projeto (Opção Produto e Município)

Secretaria: 27000000 - SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) Ordenar por Código

Órgão: 27200004 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA (FEC) Ordenar por Código

Programa: Todos os Programas

Mapp: Todos os Mapps

Tipo Projeto: Mapp

Município: Todos os Municípios

Produto: CAPACITAÇÃO REALIZADA

Filtro:

A partir desse quadro é possível escolher o Município e o Produto consulta

	2007	2008	2009	2010	Total
Prog	0,00	160.000,00	57.442,00	0,00	217.442,00
Emp	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
%		100,00%	0,00%		73,58%

Programação e Execução Financeira por Projeto (Opção Produto e Município)

Orgão	Descrição Mapp	2007	2008	2009	2010	Total	%
FEC	32 - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AUDIOVISUAL EM MEIOS ELETRÔNICOS	P: 0,00 E: 0,00	P: 160.000,00 E: 160.000,00	P: 0,00 E: 0,00	P: 0,00 E: 0,00	P: 160.000,00 E: 160.000,00	100,00%
FEC	124 - V CONGRESSO INTERNACIONAL DA SHB - A NOIVA DO ESPÍRITO: NATUREZA DE HEGEL	P: 0,00 E: 0,00	P: 0,00 E: 0,00	P: 57.442,00 E: 0,00	P: 0,00 E: 0,00	P: 57.442,00 E: 0,00	0,00%

© 2009 SEPLAG. Todos os direitos reservados.

Figura 53 - Tela da consulta 3 do módulo de Consulta do Webmapp

A **consulta 4** fornece um relatório com os seguintes campos: Região, Município e Valores programados e empenhados para os anos 2007, 2008, 2009 e 2010, bem como o percentual de execução total do projeto. Essa consulta dispõe dos filtros de secretaria, órgão, programa e descrição do Projeto Mapp, produto e município. A figura 54 mostra o formato dessa consulta.

WebMapp Consulta GEORGE KILMER CHAVES CRAVEIRO
Técnicos Seplag (23 usuários online)

Planejamento Acompanhamento Monitoria Estágio de Execução Mapp Consulta GPR Sair

Consulta: 04-Programação e Execução Financeira por Município e Ano
 Secretária: 27000000 - SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) **Ordenar por Código**
 Órgão: 27000000 - SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) **Ordenar por Código**
 Programa: 110 - PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ARTES E CULTURAS DO CEARÁ
 Mapp: 12 - Gravura - Oficina em Rede (Aquisição de material permanente e de consumo e realização de capacitações)
 Tipo Projeto: Mapp
 Município: Todos os Municípios
 Produto: Todos os Produtos

Filtro:

	2007	2008	2009	2010	Total
Prog	0,00	0,00	350.491,52	0,00	350.491,52
Emp	0,00	0,00	85.810,73	0,00	85.810,73
%			24,48%		24,48%

Programação e Execução Financeira por Município e Ano

Região	Município	2007	2008	2009	2010	Total	
9	ESTADO DO CEARÁ	P:	0,00	P:	0,00	P:	130.689,70
		E:	0,00	E:	0,00	E:	65.344,85
1	FORTALEZA	P:	0,00	P:	0,00	P:	219.801,82
		E:	0,00	E:	0,00	E:	20.465,88

© 2009 SEPLAG. Todos os direitos reservados.

Figura 54 - Tela da consulta 4 do módulo de Consulta do Webmapp

As consultas 5 e 6 fornecem informações referentes às execuções financeiras e físicas, respectivamente.

A **consulta 5** fornece um relatório com os seguintes campos: Órgão, Produto, Valores programados para os anos 2009 e 2010 e Empenhados em 2007, 2008 e 2009, conforme ilustra a figura 55.

WebMapp Consulta GEORGE KILMER CHAVES CRAVEIRO
Técnicos Seplag (23 usuários online)

Planejamento Acompanhamento Monitoria Estágio de Execução Mapp Consulta GPR Sair

Consulta: 05-Execução Financeira por Produto
 Secretária: 27000000 - SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) **Ordenar por Código**
 Órgão: 27000000 - SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) **Ordenar por Código**
 Programa: 110 - PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ARTES E CULTURAS DO CEARÁ
 Mapp: 12 - Gravura - Oficina em Rede (Aquisição de material permanente e de consumo e realização de capacitações)
 Tipo Projeto: Mapp
 Município: Todos os Municípios
 Produto: Todos os Produtos

Filtro:

Total Empenhado 2007	Total Empenhado 2008	Total Programado 2009	Total Empenhado 2009	Total Programado 2010	%
0,00	0,00	350.491,52	85.810,73	0,00	24,48%

Execução Simplificada por Produto

Órgão	Produto	Emp 2007	Emp 2008	Prog 2009	Emp 2009	Prog 2010	%
SECULT	CAPACITAÇÃO REALIZADA	0,00	0,00	130.689,70	65.344,85	0,00	50,00%
SECULT	EDIFICAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA REFORMADA	0,00	0,00	73.898,00	0,00	0,00	0,00%
SECULT	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ADQUIRIDOS	0,00	0,00	116.909,28	0,00	0,00	0,00%
SECULT	EQUIPAMENTO PARA TI ADQUIRIDO	0,00	0,00	28.994,54	20.465,88	0,00	70,58%

© 2009 SEPLAG. Todos os direitos reservados.

Figura 55 - Tela da consulta 5 do módulo de Consulta do Webmapp

Já a **consulta 6** fornece um relatório com os seguintes campos: Órgão, Produto, Unidade, Quantidades previstas para os anos 2009 e 2010 e Realizadas em 2007, 2008 e 2009, conforme ilustra a figura 56.

The screenshot shows the 'WebMapp Consultas' interface. At the top, there are navigation tabs: Planejamento, Acompanhamento, Monitoria, Estágio de Execução, Mapp Consulta, GPR, and Sair. The user is identified as GEORGE KILMER CHAVES CRAVEIRO, Técnico Seplag, with 22 users online.

The search filters are set as follows:

- Consulta: 06-Execução Física por Produto
- Secretaria: 06000000 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO (DPG)
- Órgão: Todos os Órgãos
- Programa: Todos os Programas
- Mapp: (empty)
- Tipo Projeto: Mapp
- Município: Todos os Municípios
- Produto: Todos os Produtos

Buttons for 'Consultar' and 'Relatório' are visible. Below the filters is a table titled 'Execução Física Por Produto'.

Órgão	Produto	Unidade	Otde Realizada 2007	Otde Realizada 2008	Otde Prevista 2009	Otde Realizada 2009	Otde Prevista 2010	Total Previsto	Total Realizado
DPG	EDIFICAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA CONSTRUÍDA	und	0	0	1	0	0	1	0
DPG	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ADQUIRIDOS	und	0	61	2.128	0	224	2.413	61
DPG	EQUIPAMENTO PARA TI ADQUIRIDO	und	36	377	344	0	0	757	413
DPG	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADOS	und	0	0	5.100	0	0	5.100	0
DPG	MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO	und	0	0	200	0	0	200	0
DPG	PESSOA CAPACITADA	und	0	307	400	0	0	707	307
DPG	SERVIÇO REALIZADO	und	0	0	96	0	0	96	0
DPG	VEÍCULO ADQUIRIDO	und	2	6	1	0	0	9	8
DPG	VEÍCULO ADQUIRIDO E ADAPTADO	und	0	2	2	0	0	4	2
FAADEF	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ADQUIRIDOS	und	0	2	0	0	0	2	2
FAADEF	EQUIPAMENTO PARA TI ADQUIRIDO	und	0	4	0	0	0	4	4

© 2009 SEPLAG. Todos os direitos reservados.

Figura 56 - Tela da consulta 6 do módulo de Consulta do Webmapp

3.6 - Módulo de GPR

O atual governo adotou a Gestão Pública por Resultados – GPR como modelo para definir a sua atuação no tocante ao atendimento das demandas da sociedade e ao desenvolvimento econômico e sustentável.

A GPR é um modelo em que o setor público passa a atuar para alcançar resultados, adotando postura empreendedora, voltada para o cidadão como cliente. A atuação governamental é caracterizada pela busca de padrões de eficiência, eficácia e efetividade, buscando reduzir custos para a sociedade e comprometer o Estado com os cidadãos. (IPECE, A Prática da Gestão Pública por Resultados, 2006).

É um método inovador, com as seguintes características principais:

- É um processo que começa pela finalidade, impactos e consequências e, com lógica regressiva de precedência; contrasta com a gestão que começa pelo

princípio, definindo primeiramente meios;

- Condiciona o ciclo de gestão, especialmente planejamento, orçamento e os processos decisórios, relacionando-os aos objetivos e resultados a serem alcançados;
- Baseia-se numa cadeia de resultados que é uma sequência causal para estimular o alcance de um objetivo desejado, com a seguinte lógica: os inputs são necessários para a realização de atividades de forma a produzir produtos (outputs) que, por sua vez, ensejam o efeito de médio prazo (outcomes) que levam a impactos ou resultados de longo prazo;
- As intervenções visam às mudanças sociais e de comportamento.

O instrumento principal dessa metodologia é a Matriz da GPR. A matriz de GPR relaciona os resultados de governo e setoriais e os respectivos indicadores com os programas e produtos da ação governamental. Abaixo, são apresentados os conceitos dos elementos dessa matriz.

Eixos Estratégicos da Política de Governo - São caminhos estratégicos que emergiram do trabalho de campanha do novo Governo para o período 2007-2010, centrado no macro objetivo “O Grande Salto que o Ceará Merece”. São três amplas diretrizes estratégicas que orientam a gestão para resultados e impulsionam o Governo a desenvolver ações e ofertar produtos que possam atender os objetivos de cada eixo: Economia para uma Vida Melhor; Sociedade Justa e Solidária; Gestão Ética, Eficiente e Participativa.

Resultados Estratégicos de Governo - A definição dos resultados estratégicos de governo constitui o primeiro e principal passo da GPR, representando os compromissos maiores que o Governo assume com sua população e a partir dos quais pode ser cobrado e julgado.

Resultados Estratégicos Setoriais - São resultados definidos a partir dos Planos Estratégicos das Secretarias Setoriais, com o objetivo de solucionar problemas relacionados aos setores de atuação, definidos em consonância com os resultados estratégicos de governo. O desenvolvimento do Plano Estratégico Setorial de cada secretaria passa a ter mais foco nos resultados de médio prazo (outcomes), com a definição de programas compatíveis com o objetivo que se deseja alcançar.

Indicador de Resultado Estratégico de Governo - É uma medida em geral quantitativa dotada de significado social substantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito abstrato, de interesse teórico (pesquisa acadêmica) ou programático (formulação de políticas). É um recurso metodológico, empiricamente referido, que informa algo sobre o aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão se processando na mesma. No caso da GPR, os indicadores de resultados de governo servem para mensurar a evolução e/ou desenvoltura de cada eixo

estratégico de governo e sinalizar se as políticas governamentais implementadas estão gerando resultados desejáveis; caso contrário, podem ser adotadas medidas corretivas de tais situações desenvolvidas pelos programas de governo.

Indicadores de Resultados Setoriais - É uma medida em geral quantitativa dotada de significado social substantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito abstrato, de interesse teórico (pesquisa acadêmica) ou programático (formulação de políticas setoriais e de programas governamentais). É um recurso metodológico, empiricamente referido, que informa algo sobre o aspecto da realidade setorial ou sobre mudanças que estão se processando na mesma. No caso da GPR, os indicadores de resultados de setoriais servem para mensurar o desempenho das áreas de atuação e sinalizam se as políticas setoriais implementadas estão gerando resultados desejáveis; caso contrário, podem ser adotadas medidas corretivas de tais situações desenvolvidas pelos programas e produtos que constituem a oferta de bens e serviços ofertados pelo governo à sociedade.

Programa de Governo - É a unidade básica de organização do Plano Plurianual e o módulo de integração do plano com o orçamento. O programa é o instrumento de referência da solução de problemas precisamente identificados, com suas ações, produtos, metas e recursos estabelecidos e quantificados para um determinado período de tempo.

Ação Finalística - É um conjunto de operações cujo produto contribui para os objetivos do programa.

Produto - É o bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público alvo. Os produtos são as realizações concretas do programa que são disponibilizadas à sociedade e se traduzem em algo tangível (capacitação, construções, atendimentos etc.).

Meta Física - É a quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte de tempo. O critério para a distribuição de metas por unidade da Federação é o da localização dos beneficiários.

Pode-se dizer, em síntese, que o modelo é um importante instrumento de planejamento e monitoramento, que busca a melhoria dos resultados estratégicos da administração pública, tendo como elementos norteadores os indicadores de resultados, a partir dos quais o governo pode ser avaliado quanto ao seu desempenho nos âmbitos econômico, social e de gestão, resultantes dos esforços de investimento e gestão realizados pelo governo.

Para acessar o módulo GPR, o usuário deverá clicar sob o ícone GPR. O sistema abrirá a tela principal desse módulo, ilustrada pela figura 57.

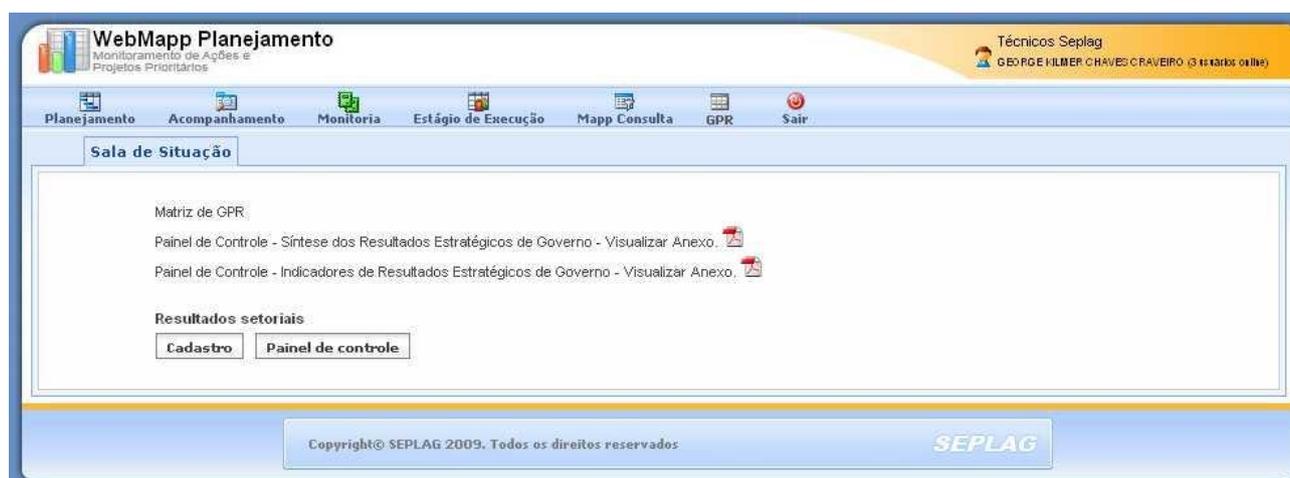


Figura 57 – Tela principal do módulo de GPR do WebMapp

Nessa tela, visualizam-se três links, a saber:

- Matriz GPR
- Painel de controle – Síntese dos Resultados Estratégicos de Governo
- Painel de controle – Indicadores dos Resultados Estratégicos de Governo

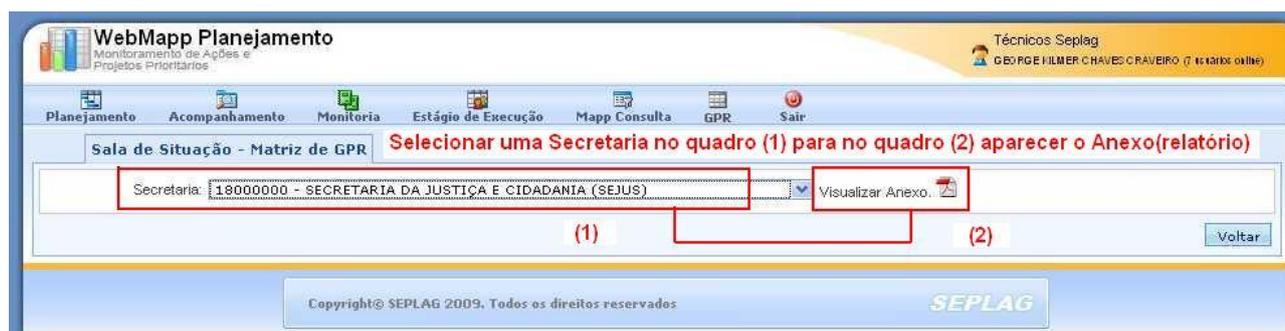


Figura 58 – Tela de acesso a consulta da Matriz de GPR por secretaria

Síntese dos Resultados Estratégicos de Governo Sinalização dos Indicadores

Eixo 1 – Economia para uma Vida Melhor	
Crescimento econômico com sustentabilidade	
Redução das desigualdades regionais	
Sociedade com renda maior e melhor distribuída	
Ceará competitivo nas suas vocações e nas novas oportunidades	
Economia rural fortalecida	
Infra-estrutura estratégica ampliada	
Eixo 2 – Sociedade Justa e Solidária	
Educação básica ampliada e com qualidade	
Educação superior e profissionalizante com ênfase nas potencialidades do Estado	
Sociedade com segurança e justiça	
Saúde descentralizada com qualidade	
Sociedade com garantia de direitos	
Juventude com oportunidades de inserção produtiva e social	
Eixo 3 – Gestão Ética, Eficiente e Participativa	
Participação cidadã na formulação e controle das políticas públicas	
Serviço público qualificado e ágil	
Aumento da capacidade de investimento do Estado	
Eficiência dos gastos públicos	

Figura 60 - Relatório de síntese dos resultados estratégicos de governo



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
RESULTADOS ESTRATÉGICOS DE GOVERNO

Indicadores	2006	2007	2008	Sinalização
Eixo 1: Economia para uma vida melhor				
- PIB (Valor corrente preços de mercado – R\$ milhão)	46.310	50.310	54.940	▲
- PIB <i>per capita</i> (R\$)	5.636,0	6.146,4	6.501	▲
- Taxa de crescimento do PIB com relação ao ano anterior (%)	8,0	4,1	5,6	▲
- Saldo de empregos formais (novos postos)	33.560	39.722	41.441	▲
- Percentual de áreas protegidas em Unidades de Conservação – UC's	21,73	21,73		■
- Percentual da população urbana com destinação final adequada dos resíduos sólidos	54,4	52,0		▼
- Razão de empregos formais RMF/interior (1)	2,0	2,0		■
- Renda domiciliar <i>per capita</i> (em sal. min.)	0,77	0,77		■
- Porcentagem de pobreza (2)	54,3	51,8		▲
- Fluxo do comércio internacional (US\$Milhão) (3)	2.060	2.556	2.836	▲
- Valor das exportações (US\$Milhão)	961,9	1.148,4	1.277,0	▲
- Renda domiciliar <i>per capita</i> na zona rural (em sal. min.)	0,38	0,41		▲
- Percentual do consumo de energia elétrica rural	8,6	8,9	9,1	▲
- Movimentação de cargas terminal Pecém (ton/ano)	1.874.692	2.205.361		▲
- Capacidade de acumulação hídrica dos açudes estaduais (bilhão m ³)	7,18	7,18	7,19	■
Eixo 2: Sociedade Justa e Solidária				
- Índice de Desenvolvimento Educação Básica (IDEB) da Rede Estadual : (4)				
Ensino Fundamental – 1ª fase	2,8	3,5		▲
Ensino Fundamental – 2ª fase	2,8	2,9		▲
Ensino Médio	3,0	3,1		▲

Figura 61 - Relatório de Indicadores dos resultados estratégicos de governo

O botão **Cadastro** possui acesso restrito e acessa as rotinas de cadastramento dos indicadores e os respectivos acompanhamentos anuais. Atualmente, o acesso a essa área é permitido apenas à equipe responsável pela coordenação da gestão pro resultados, na SEPLAG.

O botão **Painel de Controle** acessa as rotinas de consulta das informações acerca da evolução dos indicadores de resultado setoriais. Nesse botão, o sistema disponibiliza a tela mostrada na figura 62. Na parte superior dessa tela, há uma caixa de seleção por secretaria que permite conhecer os indicadores de resultado setoriais. Ao ser selecionada a secretaria, o sistema mostra um quadro com os seguintes campos: Descrição dos indicadores, Unidade, Valores programados e realizados de 2007 e 2008 e a Sinalização de status. A figura 62 mostra os indicadores de resultado da Secretaria de Educação.

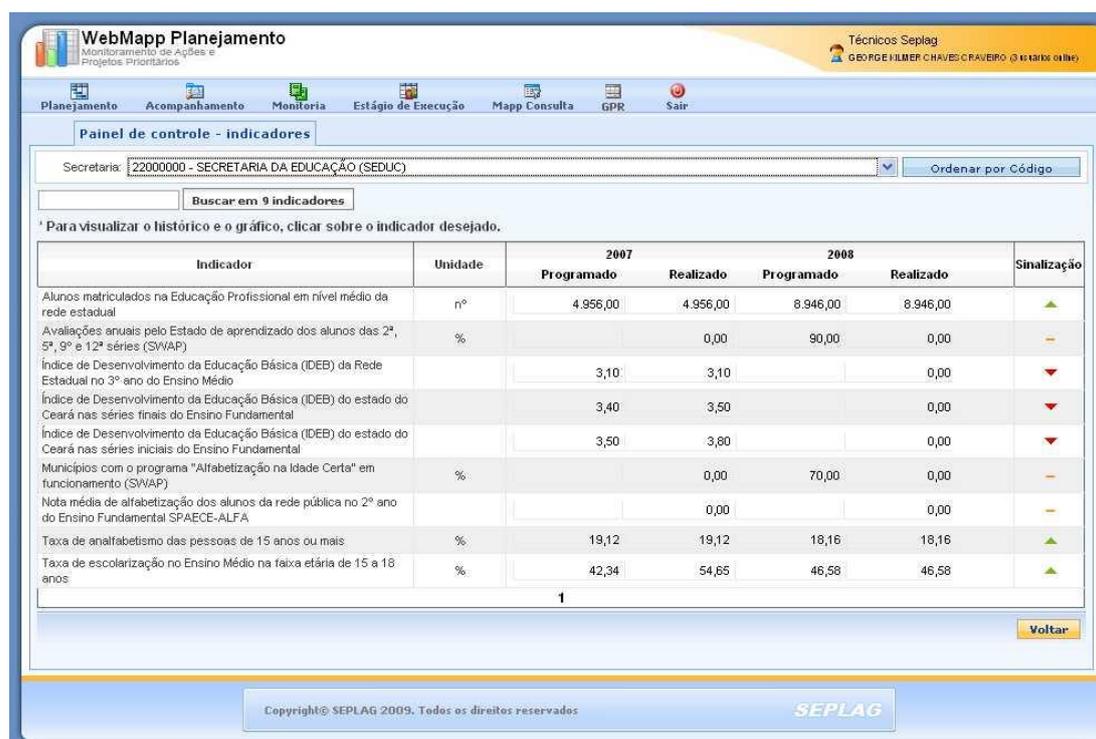


Figura 62 – Tela principal do Painel de Controle dos Indicadores no módulo de GPR do WebMapp

Para se visualizar o gráfico com os valores programados no período de 2001 a 2010 e os realizados no período de 2001 a 2008, com os respectivos comentários, deve-se clicar na descrição do indicador. O sistema disponibilizará a tela mostrada na figura 63.

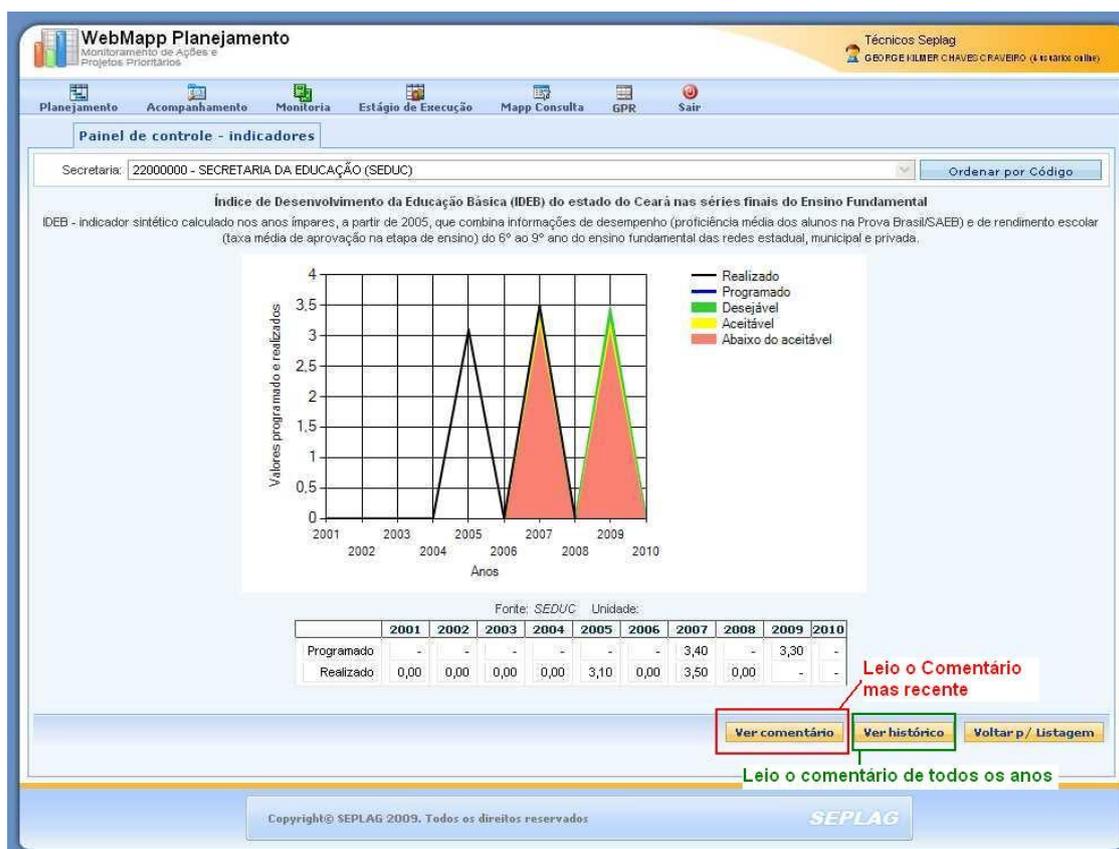


Figura 63 – Gráfico de desempenho anual do indicador de resultado no módulo de GPR do WebMapp

Como dito anteriormente, o gráfico mostrado na figura 63, apresenta informações sobre os valores programados no período de 2001 a 2010 e realizados, 2001 a 2008. Nesse gráfico, vê-se também as faixas de valores definidas como desejável, aceitável e abaixo do aceitável, estabelecidas a partir de tolerâncias acordadas entre o governador e os secretários das pastas.

Ao ser clicado o botão **Ver comentário**, o sistema mostra os comentários referentes aos valores mais recentes, enquanto que ao ser pressionado o botão **Ver histórico**, tem-se acesso aos comentários de todos os anos, listados dos mais recentes aos mais antigos.

Finalmente, o botão **Voltar para a listagem** mostra a tela com a secretaria selecionada e os respectivos indicadores de resultado.
